



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti i Zhvillimit Regjional dhe Integriteteve Evropiane

**RAPORT PËRMBLEDHËS I PROJEKTEVE TË REALIZUARA NGA MAPL NË
BASHKËPUNIM ME KOMUNA GJATË VITIT 2011**

Dhjetor 2011

FJALA HYRËSE E MINISTRI

Lexues të nderuar,

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal mbetet e përkushtuar në ngritjen e kapacitetit të infrastrukturës publike. Njëkohësisht me këtë dua të theksoj se ministria si edhe komunat nxisin investimet në infrastrukturë. Ky raport shërben që ti paraqes lexuesit të dhëna të nevojshme për realizimin e projekteve nga buxheti i vitit 2011.

Jemi të vetëdijshëm se ky është një proces kompleks që kërkon kohë që komunat në Kosovë të vazhdojnë të përmirësojnë kapacitete teknike dhe infrastrukturore me qëllim të përmirësimit të kualitetit të shërbimeve për qytetarët.

Qeveria e Kosovës dhe bashkësi e donatoreve edhe në vitin 2011 kanë dhënë një kontribut të madh në këtë drejtim dhe janë të përkushtuar që të vazhdojnë të na mbështetnin edhe në të ardhmen.

Raportin që ju e kemi në duar tuaj paraqet investimet publike të komunave të cilat janë ndihmuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Ne shpresojmë që këto investime do të rrisin kapacitetet e komunave, nëpër të cilat njerëzit, organizatat dhe e tërë shoqëria mund të marrin pjesë dhe të kënaqen pa pengesa dhe ky kontribut do të rritë kapacitete zhvillimore të Kosovës para se gjithash shërbimet kualitative ndaj qytetarëve.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal i ka përkrah komunat me mjetet buxhetore me qëllim të realizimit të projekteve për infrastrukturë publike më të mirë nga fondi i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe bashkësisë së donatoreve, kështu që ne jemi tani koordinator nacional të qeverisjes Lokale që kemi drejtuar ndihmën nga jashtë.

Duke lexuar këtë raport ju mund të shihni që në bashkëpunim me komunat i kemi rritë shkollat, kemi vendosë gropa të ujësjellësit me kilometra, kanalizime dhe fokusi ynë ka qenë ndërtimi i objekteve komunale dhe sot është bilanci më i mirë se vitin që shkoi.

Në fakt këto janë para të tatimpagueseve të Kosovës, dhe ne jemi përkujdesur që mjetet të paguheshin mirë për qytetarin e thjeshtë, sepse jeta e tij është më e mirë për ne.

Ne shpresojmë gjithashtu se me punën e përbashkët do të ngrisin kapacitetet, për sigurimin e një perspektive, të një mjedisi të shëndoshë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët. Dua të theksoj gjithashtu se ne nuk jemi në fazën ideale të përpunimit dhe ka akoma shumë për tu bërë, gjithashtu mendoj që të gjithë ne, bashkë të gjithë duhet të jemi me të mirë në mbrojtjen e pasurisë tonë, të natyrës sonë dhe shëndetit tonë. Vetëm në këtë mënyrë mund të avancojmë jetën tonë. Porosia ime në fund të fjalës sime do të jetë edhe mendimi i piktorit të madh Pikaso "Kush donë të bëjë diçka, gjën mënyrën, kush nuk donë të bëjë diçka, gjën arsyeimin". Nuk dua të kërkoj arsyeime por të kërkoj mënyra për më mirë të mirë për të gjithë ne.

Stokodan Petrović, Zëvendës Kryeministër dhe Ministër i MAF.



1. Përmbledhja ekzekutive	5
2. Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve	6
Podujevë	7
Rregullimi i lumit Llap 7	
Prishtinë	8
Fasadimi i Komunës së Prishtinës 8	
Fushë Kosovë	9
Ndriçimi publik në komunën e Fushë Kosovës 9	
Fushë Kosovë	10
Botimi i revistës vjetore 10	
Glllogoc	11
Ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Komaran - Zogaj 11	
Shtime	12
Rregullimi i shtratit të Lumit në Shtime 12	
Shtime	13
Furnizimi dhe montimi me inventar për çerdhen e fëmijëve në Shtime 13	
Shtime	14
Renovimi i Administratës Komunale në Shtime 14	
Lipjan	15
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Kraisht - Faza e I 15	
Hani Elezit	16
Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Dimcë 16	
Obiliq	17
Ndërtimi i zyrës së vendit në Dardhishtë 17	
Obiliq	18
Ndërtimi i zyrës së vendit në Sibofc 18	
Prizren	19
Ndërtimi me asfalt i rrugës dhe infrastrukturës komplete "Jusuf Gërvalla-1" 19	
Kamenicë	20
Asfaltimi i rrugëve lokale në Karaçevë 20	
Graçanicë	21
Ndërtimi i objektit ndihmës në varrezat në Gushtericën e Poshtme 21	
Graçanicë	22
Ndërtimi parkut në Gushtericën e Epërme 22	
Graçanicë	23
Rindërtimi i rrugës drejt shkollës në Graçanicë 23	
Graçanicë	24
Rindërtimi i rrugës kryesore Faza III 24	
Graçanicë	25
Tualete për Manastirin e Graçanicës 25	
Graçanicë	26

Rregullimi dhe ndriçimi i trotuareve Dobratinë - Gushtericë	26
Graçanicë	27
Rregullimi I ndriçimit Graçanicë - Llapnasellë	27
Graçanicë	28
Rrjeti i kanalizimit fekale në fshatin Kishnicë	28
Graçanicë	29
Rrjeti sekondar i kanalizimit për vendbanimin Graçanicë, Badovc dhe Shushice	29
Graçanicë	30
Rekonstruimi i fushës për basketboll dhe volejboll	30
Skenderaj	31
Ndërtimi i objektit të administratës së Kuvendit Komunal të Skenderajt	31
Skenderaj	32
Ndërtimi i zyrës së vendit në Turiqec	32
Skenderaj	33
Rrethoja e zyrës së vendit në Turiqec	33
Vushtrri	34
Shtuarja me kubëza betoni të disa rrugëve në qytetin e Vushtrrisë	34
Vushtrri	35
Riasfaltimi i segmentit rrugor nr. 5 në fshatin Prelluzhë	35
Mitrovicë	36
Renovimi i objektit të administratës	36
Mitrovicë	37
Rindërtimi – Meremetimi i 10 shtëpive të djegura në Veri të Mitrovicës	37
Gjilan	37
Rregullimi i shtratit të lumit Baja	38
Gjilan	39
Asfaltimi i rrugës fshati Veleknicë – Deponija rajonale	39
Istog	40
Ndërtimi i aneksit të komunës	40
Malishevë	41
Asfaltimi i rrugës në fshatin Rud	41
Malishevë	42
Kanalizimi Temeqin –Bubel-faza e II	42
Pejë	43
Ndërtimi i një kati të objektit të administratës së KK Pejë	43
Novobërdë	44
Asfaltimi i rrugës në Kuvç	44
Novobërdë	45
Rregullimi i rrugëve lokale në Tirince dhe Carevc	45
Novobërdë	46
Ndërtimi i trotuarit në rrugën magjistrale në Llabjan	46
Novobërdë	47

Ndërtimi i aneksit te komunës	47	
Shtërpçë		48
Rregullimi i rrugës Berevc lagja Sharkoqe	48	
Shtërpçë		49
Rregullimi i rrugëve ne Verbeshtice	49	
Shtërpçë		50
Rregullimi i terenit sportiv ne Mergjince	50	
Shtërpçë		51
Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Brod	51	
Suharekë		52
Revitalizimi i objektit për Muze të edukimit	52	
Suharekë		53
Renovimi i kulmit të palestrës sportive “ 13 Qershori”	53	
Deçan.....		54
Zgjerimi i rrugës së gjimnazit	54	
Gjakovë		55
Rregullimi i trotuareve në rr.”Migjeni	55	
Gjakovë		56
Rregullimi i trotuareve në rr.”Anton Çeta”	56	
Gjakovë		57
Rregullimi i trotuareve në rr.”Skënderbeu-N.Terezë”	57	
Gjakovë		58
Ndërtimi i shkollës fillore "Isa Boletini" Osek Hylë në Gjakovë	58	
Junik		59
Ndërtimi I rrugëve Lokale në Junik	59	
Rahovec.....		60
Ndërtimi i SHF “Mustafë Ibishi” paralelja e ndarë Guri Kuq	60	
Rahovec.....		61
Instalimi i nxehjes qendrore ne SHMFU "Isa Boletini" ne Rahovec	61	
Ferizaj.....		62
Asfaltimi i Rrugës Talinovic deri në Rahovicë - Faza I	62	
Ferizaj.....		63
Renovimi I Objektit të ish TMK-së dhe Revitalizimi i tij në objekt të Kulturës, Ferizaj	63	
Partesh		64
Ndërtimi i qendrës rajonale të kulturës	64	
Partesh		65
Vazhdimi i ndërtimit te QMF-se Partesh	65	
Partesh		66
Rregullimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në fshatin Budrikë-Gjilanë/Partesh	66	
Klinë		67
Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Gllarevë	67	
Klinë		68

Asfaltimi I rrugës ne Fshatin Gremnik	68
Banorët e fshatit Gremnikë dhe Komuna e Klinës	68
Mitrovicë.....	69
Renovimi i objektit të Administratës Komunale të Mitrovicës	69

1. Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Administrimit të pushtetit Lokal në bazë të mandatit të saj ligjor përkrah dhe mbikëqyrë aktivitetet e Komunave drejt promovimit të qeverisjes së mirë, respektimit të parimeve kushtetuese dhe ligjit.

Misioni i Ministrisë është avancimi cilësor i qeverisjes së pushtetit lokal, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar shërbime të përgjegjshme dhe efektive në shërbim të qytetarëve.

Bazuar në ligjin nr. 04/1-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me ndarjen buxhetore të vitit 2011, në kuadër të kategorisë së investimeve kapitale ka ndarë mjete për financimin dhe bashkëfinancimin e projekteve të komunave të cilat projekte kanë qenë në listën e prioriteteve të Kuvendeve Komunale për vitin 2011.

MAPL që nga fillimi i punës së saj e deri me sot me mundësit e saj buxhetore ka përkrahur komunat me mjete kapitale për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike me qëllim të përmirësimit të kushteve të infrastrukturës për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Në vitin 2011 MAPL gjithsej ka realizuar 76 projekte në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, këto projekte janë të paraqitura në raportin e detajizuar ku në pjesën e parë të raportit janë paraqitur detajet e secilit projekt veç e veç ndërsa në pjesën e dytë të këtij raporti projektet janë të paraqitura në mënyrë tabelore.

2. Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve

Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal monitorimin dhe ecurinë e projekteve nëpër komunat e Republikës së Kosovës e ka realizuar duke i angazhuar zyrtarët e Departamentit të Zhvillimit Regjional dhe Integriteteve Evropiane në një grup punuese i cili grup ka në përgjegjësi monitorimin e projekteve.

Grupi që ka koordinuar dhe monitoruar projektet është mbikëqyrur nga drejtori i DZHRIE-s z. Besim Kamberaj. Grupi punues ka qenë në këtë përbërje: Fetije Begolli, Besa Shala, Hanife Alimusaj, Tush Berisha, Emine Hoti, Sabajete Hoxha dhe Fatmire Thaçi.

Përfitues të projekteve në këtë vit kanë qenë këto komuna: Gjilan, Istog, Mitrovicë, Rahovec, Prishtinë, Skenderaj, Partesh, Suharekë, Graçanice, Junik, Malishevë, Klinë, Podujevë, Prizren, Deçan, Gjakovë, Vushtrri, Ferizaj, Glllogoc, Fushë Kosovë, Shtërpçë, Novobërdë, Lipjan, Shtime, Pejë, Kamenicë, Hani Elezit, Obiliq, Ranillug, Klokot, dhe Zveqan.

3. Raporti detaj për secilin prej 76 projekteve

Komuna	Podujevë
Titulli i projektit	<i>Rregullimi i lumit Llap</i>
Përshkrimi i Projektit	Në këtë projekt është bërë zgjerimi i shtratit të lumit në gjatësi prej 700 metrave, shembja dhe eliminimi i strukturave të ndryshme ekzistuese, mbushja e pjerrësirave për rregullimin e vijës së shtratit të lumit në gjatësinë e tij, betoni i pllakave të bregut dhe veshja me gur.
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti qytetaret e komunës së Podujevës do të kenë një ambient më të pastër, do të bëhet evitimi i vërshimeve, do të jetë një hapësirë e bukur ku qytetarët do ta shfrytëzojnë për pushim dhe rekreacion.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	127,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	08.06.2011
Vlera e Kontraktuar	230,323.80€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	N.N.T "Bini"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	126,999.83€



Komuna	Prishtinë	
Titulli i projektit	Fasadimi i Komunës së Prishtinës	
Përshkrimi i Projektit	Në këtë projekt është bërë fasadimi i tërësishëm i objektit të komunës së Prishtinës, vazhdimi i strehëve dhe punimi i shkalleve emergjente.	
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti janë krijuar kushte më të mira të punës nga fakti se zvogëlohen shpenzimet e ngrohjes dhe e aklimatizimit, si dhe objekti ka një pamje me atraktive.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	200,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	02.08.2011	
Vlera e Kontraktuar	143,588.75€	
Vlera e Aneks Kontratës	152,075.00€	
Emri i Kontraktuesit		
Pagesat		
Vlerat e pagesës	100,000.00€ nga kontrata bazë 50,000.00€ nga pjesa e aneks kontratës.	



Komuna	Fushë Kosovë	
Titulli i projektit	Ndriçimi publik në komunën e Fushë Kosovës	
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt është bërë duke konsideruar ndërtimin komplet të shtyllave dhe instalimeve. Ato janë sisteme ekologjike të ndriçimit të rrugës, sisteme autonome të cilat nuk kanë nevojë për linja elektrike tokësore. Mirëmbajtja është e lirë për shkak të jetëgjatësisë së llambave. Harxhimi i ulët i llambave LED bëjnë të mundur që bateritë e sistemit të ngarkohen me energji nga energjia solare pa shfrytëzuar rrjetit publik.	
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti, kemi ndriçim publik dhe siguri më të madhe për qytetarët tanë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		200,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		08.08.2011
Vlera e Kontraktuar		239,606.64€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.T.SH, “Electra“
Pagesat		
Vlerat e pagesës		200,000.00€





Komuna	Fushë Kosovë	
Titulli i projektit	Botimi i revistës vjetore	
Përshkrimi i Projektit	Projekti “Botimi i revistës vjetore” pasqyron punën njëvjeçare të Kuvendit Komunal të Fushe Kosovës e në veçanti përkushtimin dhe punën gjatë vitit 2011 të gjitha drejtorive veç e veç sipas obligimeve dhe përgjegjësiive ligjore. Botimi i kësaj revistë do të ketë 1500 ekzemplarëve të cilët do të shpërndahen nëpër vende publike me qëllim të informimit të gjithë qytetareve.	
Outputet / Përfitimet	Me botimin e kësaj broshure do të rritet transparencja e punëve brenda komunës në raport me qytetarin, e veçanërisht me qytetarët e komunës së Fushë Kosovës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	05.012.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	5,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	08.12.2011	
Vlera e Kontraktuar	5,000.00€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	OPNM-Prishtinë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	5,000.00€	


Komuna	Glllogoc
Titulli i projektit	<i>Ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Komaran - Zogaj</i>
Përshkrimi i Projektit	Lagja e Zogajve është një segment që lidhë banorët e Komaranit me fshatrat për rreth të cilët kanë qasje në këtë rrugë. Gjatësia e kësaj rruge është rreth 1550m, dhe me gjerësi të mjaftueshme. Asfaltimi i kësaj rruge ndikon në zhvillimin ekonomik, mirëqenie sociale, si dhe zvogëlon lëvizjen e qytetarëve fshat - qytet që është bërë dukuri kohët e fundit në këtë për shkak të mungesës së infrastrukturës së domosdoshme.
Outputet / Përfitimet	Përmirësimi i infrastrukturës rrugore si dhe lehtësimi i qarkullimit të banorëve dhe automjeteve. Ndalimi i migrimit fshat -qytet. Zhvillimi ekonomik si dhe lidhja me fshatrat e komunave tjera
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	195,668.80€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	02.06.2011
Vlera e Kontraktuar	140,807.50€
Vlera e Aneks Kontratës	79.995.50€
Emri i Kontraktuesit	“Trasing Group”
Pagesat	
Vlerat e pagesës	140,807.50 € nga kontrata bazë 53.784.00€nga aneks kontrata



Komuna	Shtime
Titulli i projektit	<i>Rregullimi i shtratit të Lumit në Shtime</i>
Përshkrimi i Projektit	Lumi Shtime kalon në mes të qytetit të Shtimes që ka rrjedhën nga fshati Carralevë, Mollopolc, Shtime, Vojnocë, pjesa administrative me territorin e komunës së Lipjanit dhe ka derdhje në lumin Sitnica, ku përfshin një distancë prej 23km. Projekti përfshin pjesën e qendrës së qytetit të Shtimes me një distancë prej 600m dhe gjerësi 12m.
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë 7000 banorët e qytetit të Shtimes, një siguri më e madhe nga vërshimet, eliminimi i fyteve të ngushta rregullimi i hapësirave përreth me parqe të reja, pastërti më të madhe për rreth, infrastrukturë më të mirë, vend atraktiv edhe për vizitorët e jashtëm.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	16.06.2011
Vlera e Kontraktuar	234,635.93€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NNP" ARBËRI-NS"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	100,000.00€

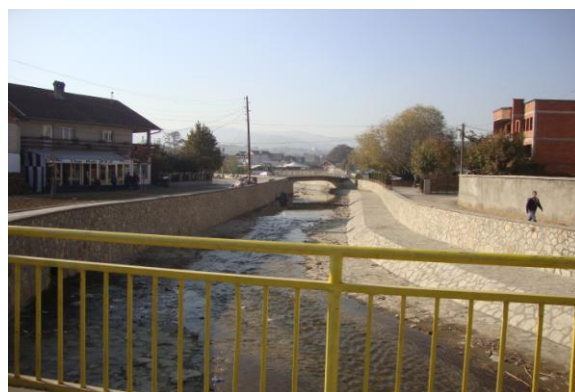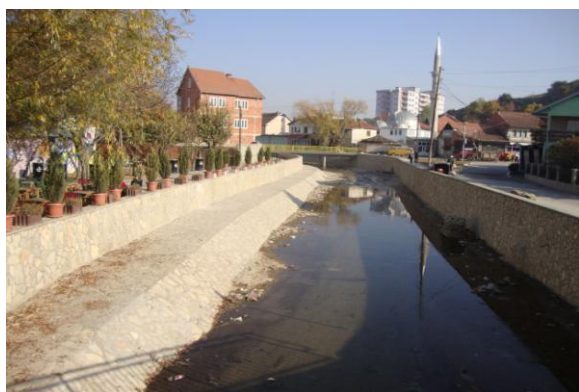

Komuna	Shtime
Titulli i projektit	<i>Furnizimi dhe montimi me inventar për çerdhen e fëmijëve në Shtime</i>
Përshkrimi i Projektit	Në këtë projekt është bërë inventarizimi dhe mobilimi i zyrës së personelit, mobilimin e kuzhinës për përgatitjen e ushqimit si dhe vendin për ngrënie, dhomës së ditës, 2-dhomave të gjumit me shtretër, klasën e mësimit me tavolina dhe ulëse si dhe aparatet e klimave nëpër këto dhoma.
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë 7000 banorë të pjesës urbane të qytetit, zgjerimi i kapacitetit të çerdhes deri 80 fëmijë, avancimi i femrës në shoqëri.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.07.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.09.2011
Vlera e Kontraktuar	18,134.51 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	N.P.SH "Shpati"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	18,134.51 €

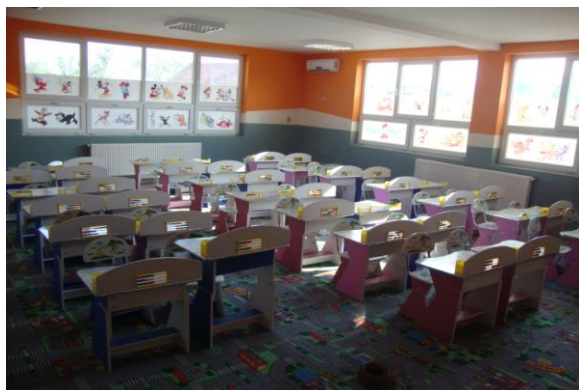

Komuna	Shtime
Titulli i projektit	<i>Renovimi i Administratës Komunale në Shtime</i>
Përshkrimi i Projektit	Është bërë inventarizimin dhe mobilimin i zyrës së gjendjes civile dhe rregullimi i tualeteve ku tashmë ofrojnë kushte higjienike më të mira.
Outputet / Përfitimet	Në këtë projekt kanë përfituar afërsisht 95 zyrtarë të Komunës si dhe banorë të pjesës urbane të qytetit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.07.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.09.2011
Vlera e Kontraktuar	24,972.00 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	N.T.P'' Euro Coop''
Pagesat	
Vlerat e pagesës	24,972.00 €



Komuna	Lipjan	
Titulli i projektit	Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Kraisht - Faza e I	
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i shkollës fillore i cili është duke u ndërtuar ka një sipërfaqe të madhe dhe një numër të paraleleve të mëdha për zhvillimin e procesit mësimor sipas normave dhe standardeve pedagogjike dhe arsimore. Në këtë objekt janë planifikuar të ndërtohen nëntë klasë mësimore, ky objekt është planifikuar sipas standardeve, me plotësimin e të gjitha nevojave për zhvillim të procesit mësimor me cilësi të lart.	
Outputet / Përfitimet	Krijimi i kushteve më të mira për zhvillimin e procesit mësimor.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	150,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	04.08.2011	
Vlera e Kontraktuar	498,383.49€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.N.P “Te Muhameti”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	150,000.00€	



Komuna	Hani Elezit	
Titulli i projektit	<i>Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Dimcë</i>	
Përshkrimi i Projektit	Rruga e Dimcës fillon prej Rrugës Magjistrale Hani i Elezit – Shkup, 200m në jug të kryqëzimit të rrugës magjistrale me rrugën kryesore të qytetit të Hanit të Elezit. Rruga e Dimcës duke përfshirë krahun e saj ka gjatësi 1500 m, dhe gjerësia e rrugës së asfaltuar, është 5m, me bankina, me gjerësi 0.50m, në të dy anët.	
Outputet / Përfitimet	Përfitues të kësaj rruge janë banorët, sepse është lidhja e vetme e këtij fshati me Hanin e Elezit dhe me pjesën tjetër të vendit. Dimca ka gjithsej 250 banor, ndërsa në këtë fshat nuk ekziston shkolla dhe të gjithë nxënësit e këtij fshati mësojnë në shkollat e qytetit me këtë konsiderojmë se përfitues direkt janë nxënësit e këtij fshati.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		23.06.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		100,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		10.10.2011
Vlera e Kontraktuar		195,604.90€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		Eskavatori Company
Pagesat		
Vlerat e pagesës		100,000.00€



Komuna	Obiliq
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i zyrës se vendit në Dardhishtë</i>
Përshkrimi i Projektit	Zyra e vendit si objekt hyn në kuadrin e objekteve administrative dhe shërben për ofrimin e shërbimeve administrative të popullatës e cila për momentin duhet të udhëtoj 20km. Me ndërtimin e zyrës lokale të vendit popullatës së fshatit Dardhishtë i ofrohet shërbim më i mirë, më i shpejtë dhe më efikas e njëkohësisht bëhet lehtësimi i qendrës për shërbime në Obiliq.
Outputet / Përfitimet	Me ndërtimin dhe funksionalizimin e objektit të zyrës së vendit banorët e këtij lokaliteti do të kursenin kohën që u duhej më parë deri në Obiliq për tu pajisur me dokumente personale siç janë: certifikatë lindje, martesë, vdekje etj, por krahas kohës së kursyer për udhëtim qytetarët do të zvogëlonin edhe mjetet materiale që u duhen për udhëtim.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	08.08. 2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	20.10.2011
Vlera e Kontraktuar	32,931.34 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	ERO PROJECT
Pagesat	
Vlerat e pagesës	32,931.34 €



Komuna	Obiliq
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i zyrës së vendit në Sibofc</i>
Përshkrimi i Projektit	Zyra e vendit si objekt hyn në kuadrin e objekteve administrative dhe shërben për ofrimin e shërbimeve administrative të popullatës e cila për momentin duhet të udhëtoj 20km. Me ndërtimin e zyrës lokale të vendit popullatës së fshatit Sibofc i ofrohet shërbim më i mirë, më i shpejtë dhe më efikas e njëkohësisht bëhet lehtësimi i qendrës për shërbime në Obiliq.
Outputet / Përfitimet	Me ndërtimin dhe funksionalizimin e objektit të zyrës së vendit banorët e këtij lokaliteti do të kursenin kohën që u duhej më parë deri në Obiliq për tu pajisur me dokumente personale siç janë: certifikatë lindje, martesë, vdekje etj, por krahas kohës së kursyer për udhëtim qytetarët do të zvogëlonin edhe mjetet materiale që u duhen për udhëtim.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	08.08.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	20.10.2011
Vlera e Kontraktuar	32,931.34 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	ERO PROJECT
Pagesat	
Vlerat e pagesës	32,931.34 €



Komuna	Prizren	
Titulli i projektit	Ndërtimi me asfalt i rrugës dhe infrastrukturës complete "Jusuf Gërvalla-1"	
Përshkrimi i Projektit	Rruga "Jusuf Gërvalla" është një rrugë që gjendet në pjesën e re të qytetit, përkatësisht në lagjen "Ortokoll " të Prizrenit. Rruga ka një rëndësi të veçantë sepse lidh disa rrugë dhe rrugica të kësaj pjese të qytetit. Në këtë rrugë janë asfaltuar rreth 450metra asfalt, kanalizim dhe ujësjellës. Përgjatë kësaj rrugë jetojnë rreth 100 familje të qytetit të Prizrenit.	
Outputet / Përfitimet	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës me infrastrukturë complete ka krijuar lehtësira të mëdha si në qarkullimin e automjeteve dhe të këmbësoreve, ndriçimit publik, ku në këtë pjesë e ka pasur efektin e vet, ndërtimi i sistemit të ri të ujësjellësit ka rritur kualitetin e përdorimit të ujit të pijes etj.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		194,660.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		14.12.2011
Vlera e Kontraktuar		188,484.93€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.P.N „Çlirimi"
Pagesat		
Vlerat e pagesës		188,484.93€



Komuna	Kamenicë	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve lokale në Karaçevë	
Përshkrimi i Projektit	Fshati Karaçevë është vend malor dhe lagjet janë të shpërndara me njëra tjetrën andaj asfaltimi i rrugëve ka lehtësuar qarkullimin e banorëve sidomos nxënësve. Janë asfaltuar gjithsej 11 lagje gjatësia e asfaltimit është rreth 3.5 km me gjerësi 3.5 m.	
Outputet / Përfitimet	Pasi që fshati Karaçevë është zonë kufitare atëherë me asfaltimin e kësaj rruge do të pengohet shpërngulja e popullatës nga ku fshat, pasi që sipas tyre me asfaltimin e këtyre rrugëve po përmirësohen kushtet jetësore për banorët e këtij fshati.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		23.06.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		150,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		09.09.2011
Vlera e Kontraktuar		135,163.08€
Vlera e Aneks Kontratës		13,469.08€
Emri i Kontraktuesit		“Bejta Komerc”
Pagesat		
Vlerat e pagesës		148,632.16€



Komuna	Graçanicë	
Titulli i projektit	Ndërtimi i objektit ndihmës në varrezat në Gushtericën e Poshtme	
Përshkrimi i Projektit	Hapësira e projektuar për ndërtimin e këtij objekti përmban hapësirën për kryerjen e zakoneve fetare, njëjën sanitare dhe tarracën. Objekti përfshin sipërfaqen prej 68,3m2 dhe të gjitha fazat e realizimit të punëve gjer në fazën e përdorimit.	
Outputet / Përfitimet	Qytetarët kanë përfituar objektin në të cilin do të mund ti kryejnë zakonet fetare rreth varrimit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	15,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	01.06.2011	
Vlera e Kontraktuar	15,521.39€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“ERO PROJEKT” Prishtinë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	15,000.00€	





Komuna	Graçanicë	
Titulli i projektit	Ndërtimi parkut ne Gushtericën e Epërme	
Përshkrimi i Projektit	Parku përfshin një sipërfaqe prej 720m2 në të cilën janë kryer punët e parapara me projekt si: gjelbërimi i sipërfaqes (mbjellja e fidanëve dhe drunjve të ulët), trotuaret për këmbësor, ulëset, urra për kalimin e lumit dhe rrethoja e parkut.	
Outputet / Përfitimet	Me rregullimin e këtij parku kanë përfituar qytetarët e sidomos pleqtë dhe fëmijët i cili ju mundëson pushim, rekreacion dhe lojëra për fëmijë, njëkohësisht krijohet një pamje e bukur vizuale dhe mjedis të pastër.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		35,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		01.06.2011
Vlera e Kontraktuar		18,207.33€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.N.P."Kujtimi" - Prishtinë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		18,207.33€



Komuna	Graçanicë	
Titulli i projektit	<i>Rindërtimi i rrugës drejt shkollës ne Graçanicë</i>	
Përshkrimi i Projektit	Rindërtimi i rrugës drejt shkollës ka përfshirë zgjerimin e saj dhe gjithashtu ndërtimin e trotuarit i cili ka mundësuar qarkullimin më të lirë të automjeteve si dhe lëvizjen më të lirë dhe më të sigurt të këmbësorëve e sidomos të nxënësve.	
Outputet / Përfitimet	Përmirësimi i kushteve jetësore të popullatës së këtij lokaliteti.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		75,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		12.05.2011
Vlera e Kontraktuar		103,890.00€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		“Conex Group” – Prishtinë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		75,000.00€



Komuna	Graçanicë	
Titulli i projektit	Rindërtimi i rrugës kryesore Faza III	
Përshkrimi i Projektit	Në kuadër të fazës III projekti ka përfshirë ndërtimin e zonës për këmbësor gjatë rrugës kryesore me gjerësi b=6,0m. Është bërë largimi i tërësishëm i stazës së vjetër të trotuarit dhe janë krijuar kushtet për formimin e një zone të këmbësorëve.	
Outputet / Përfitimet	Lëvizja e lirë e banorëve dhe automjeteve të këtij lokaliteti njëkohësisht rritja e sigurisë së tyre.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		100,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		16.05.2011
Vlera e Kontraktuar		114,745.00€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.N.T. ABC - Podujevë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		100,000.00€

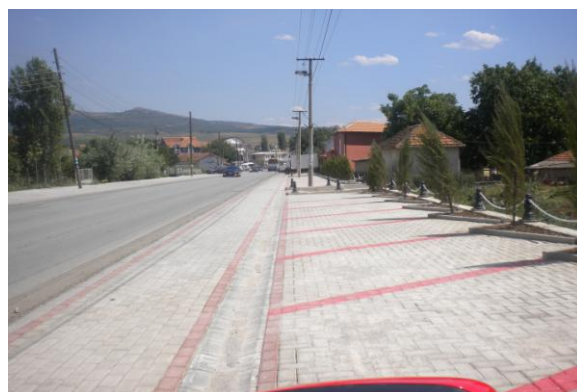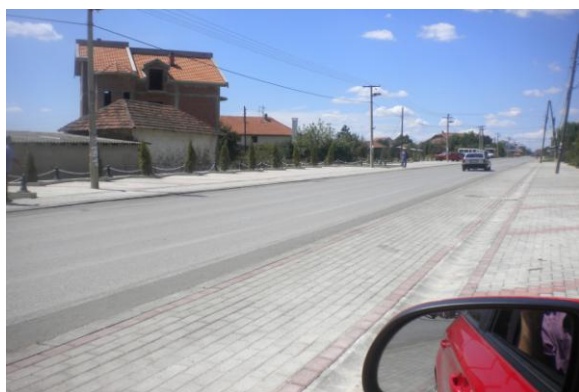

Komuna	Graçanicë
Titulli i projektit	<i>Tualete për Manastirin e Graçanicës</i>
Përshkrimi i Projektit	Për ndërtimin e këtij objekti është respektuar përshtatja në ambient të jashtëm. Ky objekt është ndarë në tri hapësira, në pjesën qendrore e cila është paraparë për përdorim nga personat me aftësi të kufizuar dhe hapësira në anën e majtë dhe të djathtë një për femra dhe një për meshkuj. Të gjitha janë pajisë me sanitari, instalimin e ujit dhe ventilimin.
Outputet / Përfitimet	Janë plotësuar nevojat për vizitorët e shumtë të cilët e frekuentojnë këtë Manastir.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	23.09.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	7,951.10€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.11.2011
Vlera e Kontraktuar	23,951.10€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	N.N. Andi - Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	7,951.10€



Komuna	Graçanicë
Titulli i projektit	<i>Rregullimi dhe ndriçimi i trotuareve Dobratinë - Gushtericë</i>
Përshkrimi i Projektit	Trotuari nga Dobratini deri në Gushtericë është i gjatë 1,753m dhe me një gjerësi praj 1,5m. Përgjatë trotuarit është vendos instalimi për ndriçim i cili i lidh ndriçuesit elektrike dhe tokëzimi. Këta ndriçues janë me lartësi 3,5m.
Outputet / Përfitimet	Siguria e banorëve e sidomos e nxënësve të cilët e frekuentojnë çdo ditë këtë rrugë për në shkollë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.11.2010
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	10,494.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.04.2010
Vlera e Kontraktuar	98,795.60€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	N.N. E&B - Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	10,494.00€



Komuna	Graçanicë
Titulli i projektit	<i>Rregullimi I ndriçimit Graçanicë - Llapnasellë</i>
Përshkrimi i Projektit	Projekti ka përfshirë ndërtimin e ndriçimit gjatë rrugës Graçanicë - Llapnasellë në gjatësi prej 4000 metra dhe vendosjen e 80 shtyllave me ndriçim metal-halogjen 250 w në maje. Largësia në mes të fushave të shtyllave është 50m. I tërë instalimi elektrik përbëhet nga kabllot elektrike, me prerje sipas standardeve për këto lloje punësh me tokëzim adekuat.
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti përfitojnë qytetarët e kësaj ane me lirinë e lëvizjes edhe në orët e mbrëmjes.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.11.2010
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	19,609.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	11.05.2010
Vlera e Kontraktuar	79,001.36€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	SHPK "Conex Group" Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	19,609.00€



Komuna	Graçanicë	
Titulli i projektit	Rrjeti i kanalizimit fekale në fshatin Kishnicë	
Përshkrimi i Projektit	Projekti - Kanalizimi fekale në Kishnicë është ndërtuar nga gypat PESN DN 250mm të cilët lidhen me kanalizimin ekzistues. Gypat përshkojnë afër rrugës regjionale Prishtinë – Gjilan.	
Outputet / Përfitimet	Derdhja e ujërave fekale në kanalizim i cili parandalon përhapjen e sëmundjeve të ndryshme e gjithashtu mbrojtja e ambientit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	25,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	13.09.2011	
Vlera e Kontraktuar	26,935.00€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	E&B - Prishtinë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	25,000.00€	



Komuna	Graçanicë	
Titulli i projektit	Rrjeti sekondar i kanalizimit për vendbanimin Graçanicë, Badovc dhe Shushice	
Përshkrimi i Projektit	Është ndërtuar rrjeti sekondar i kanalizimit fekale nga gypat nga PESN DN 250mm me derdhje në kanalizimin kryesor ekzistues, dhe sipas standardeve. Gypat përshkojnë rreth rrugëve lokale.	
Outputet / Përfitimet	Derdhja e ujërave fekale në kanalizim i cili parandalon përhapjen e sëmundjeve të ndryshme e gjithashtu mbrojtja e ambientit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	13.09.2011	
Vlera e Kontraktuar	48,586.60€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	CAD Partners - Prishtinë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	48,586.60€	



Komuna	Graçanicë	
Titulli i projektit	Rekonstruimi i fushës për basketboll dhe volejboll	
Përshkrimi i Projektit	Fusha për basketboll dhe volejboll ka dimension prej (42x22)m. Është bërë nivelizimi me asfalt të ri me shtresë prej d= 5cm. Pas kësaj është vendos edhe një shtresë me trashësi prej 4mm sipas standardeve për fusha sportive, ngjyrosja me kompresor me ngjyra akrile dhe vendosja e koshave. Është vendos rrethoja nga rrjeti i metalit dhe vendosja e ndriçimit. Gjithashtu është bërë drenazh e cila nuk lejon grumbullimin e ujit nga të reshurat atmosferike.	
Outputet / Përfitimet	Rinia e kësaj ane e sidomos nxënësit do të merren më shumë me aktivitete sportive.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		7,820.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		04.11.2010
Vlera e Kontraktuar		7,820.00€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		ABC - Podujevë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		7,820.00€



Komuna	Skenderaj
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i objektit të administratës së Kuvendit Komunal të Skenderajt</i>
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i objektit të administratës së KK Skenderaj ka filluar në vitin 2009 në të cilin projekt janë kryer punimet e fazës së parë, dytë dhe të tretë andaj ka qenë e nevojshme edhe fillimi i fazës së katërt. Projekti është i tipit B+P+4 i cili përfshin të gjitha fazat e realizimit të punëve gjerë në fazën e përdorimit.
Outputet / Përfitimet	Rritja e efikasitetit të punës në kryerjen e shërbimeve administrative ndaj qytetareve të komunës si dhe krijimi i kushteve të personelit për shërbim sa më të avancuar.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	200,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	17.09.2009
Vlera e Kontraktuar	1,840,157.24€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NN „Valoni” Skenderaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	140,000.00€



Komuna	Skenderaj
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i zyrës së vendit në Turiqec</i>
Përshkrimi i Projektit	Bashkësia lokale në Turiqec ka pesë fshatra me 9,726 banor dhe zyra e vendit ka kushte shumë të vështira dhe të pa përshtatshme për kryerjen e shërbimeve, andaj për ti përmbushur kushtet për sigurimin e dokumentacionit të gjendjes civile është e domosdoshme ndërtimi i zyrës së vendit në Turiqec. Projekti përfshinë gërmimin, hapjen dhe punimi i themeleve punimi i grilave të dyerve dhe dritareve nga profilet e metalit për sigurimin e arkivës,etj
Outputet / Përfitimet	Ofrimi i shërbimeve sa më afër qytetareve, kushte më të mira për punëtor si dhe kushte të mira për arkivim të dokumentacioneve zyrtare.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	08.08.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	29.784.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	19.09.2011
Vlera e Kontraktuar	29.784.00€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NN "Valoni" Skenderaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	29,783.15€



Komuna	Skenderaj	
Titulli i projektit	Rrethoja e zyrës së vendit në Turigec	
Përshkrimi i Projektit	Gërmimi, hapja dhe punimi i themeleve, punimi i rrethojës nga profilet e metalit dhe ngjyrosja, punimi i dyerve metalike në hyrje të parkingut, punimi i hyrjes në oborr me kubëza betoni etj.	
Outputet / Përfitimet	Është krijuar hapësirë shumë e nevojshme për qytetarët që shkojnë për të kërkuar shërbime komunale.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		25.10.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		10,500.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		30.11.2011
Vlera e Kontraktuar		13,560.00€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		NTSH''Doni Comerc''Skenderaj
Pagesat		
Vlerat e pagesës		10,500.00€



Komuna	Vushtrri
Titulli i projektit	<i>Shtruarja me kubëza betoni te disa rrugëve në qytetin e Vushtrrisë</i>
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt përfshin ndërtimin, rregullimin dhe shtruarjen e disa rrugëve lokale në qytetin e Vushtrrisë punimi i të cilave bëhet me kubëza betoni.
Outputet / Përfitimet	Ndërtimi i këtyre rrugëve do të përmirësoj infrastrukturën rrugore të këtyre lagjeve të qytetit dhe do të përmirësoj kushtet për qarkullim më të lehtë të qytetarëve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.07.2011
Vlera e Kontraktuar	197,933.10€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NNP „Wenda”- Vushtrri
Pagesat	
Vlerat e pagesës	99,950.00€



Komuna	Vushtrri
Titulli i projektit	<i>Riasfaltimi i segmentit rrugor nr. 5 në fshatin Prelluzhë</i>
Përshkrimi i Projektit	Gjendja aktuale e kësaj rruge ka qenë jo e mirë, kanë qenë gropa të mëdha që kanë pamundësuar qarkullimin e lirë të automjeteve dhe banorëve të kësaj pjese. Është bërë mbyllja e gropave me material të mihur, ngjeshja me material me cilindër adekuat, materiali i mbetur të transportohet deri në deponinë e caktuar nga organi mbikëqyrës në largësi deri në 2 km.
Outputet / Përfitimet	Rezultat i këtij projektit është përmirësimi i infrastrukturës rrugore, përmirësimi i kushteve jetësore dhe levizja e lirë e qytetarëve në këtë lokalitet.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	18.05.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	17,589.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	13.07.2011
Vlera e Kontraktuar	17,961.52€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NPSH „Bageri” Ferizaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	17,589.00€



Komuna	Mitrovicë	
Titulli i projektit	Renovimi i objektit të administratës	
Përshkrimi i Projektit	Ndërrimi apo zhvendosja e dritareve të vjetra si dhe vendosja e dritareve të reja në vendin e tyre si dhe punët tjera fizike të cilat shkojnë me këtë rast siç janë rrëzimi i mureve dhe vendosja e dyerve dhe dritareve të reja sepse me këtë do të kemi pamje më të bukur si dhe nxehje më të mirë të ndërtesës e me këtë edhe shpenzime më të vogla për mbajtjen e tyre.	
Outputet / Përfitimet	Me këtë do të kemi pamje më të bukur si dhe nxehje më të mirë të ndërtesës e me këtë edhe shpenzime më të vogla për mbajtjen e tyre.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		100,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		01.08.2011
Vlera e Kontraktuar		93,898.09€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.N.T. „Fitimi”
Pagesat		
Vlerat e pagesës		93,898.09€



Komuna	Mitrovicë
Titulli i projektit	Rindërtimi – Meremetimi i 10 shtëpive të djegura në Veri të Mitrovicës
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi dhe meremetimi i shtëpive të djegura gjatë luftës në Kosovë me çka do ti zbut disa rastet sociale në Komunë.
Outputet / Përfitimet	Përfitues do të jenë banorët e këtyre shtëpive të cilët do të hiqen nga banesat kolektive dhe do të kthehen në shtëpitë e tyre.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	03.10.2011
Vlera e Kontraktuar	250,000.00€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NNP „Kujtimi”
Pagesat	
Vlerat e pagesës	99,870.41€



Titulli i projektit	Rregullimi i shtratit te lumit Baja	
Përshkrimi i Projektit	Lumi Baja, historikisht paraqet hapësirën rreth të cilës është zhvilluar qytetit i Gjilanit. Ky projekt përfshinë: rregullimin e derdhjeve të ujërave të zeza dhe ujërave atmosferik, sigurimi nga vërshimet, rregullimi i hapësirës së breglumis.	
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë banorët e Gjilanit dhe të zbuteshin problemet me të cilat ballafaqohet komuna, njëherit do të krijonte kushte më të mira për të gjitha komunitetet .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	75,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	08.09.2011	
Vlera e Kontraktuar	216,740.45€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	NNP „Art Projekt” Viti	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	17,869.20€	



Komuna	Gjilan	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës fshati Veleknicë – Deponija rajonale	
Përshkrimi i Projektit	Kjo rrugë do të asfaltohet në gjerësinë sa të bëjë të mundur kalimin në të njëjtën kohe të dy automjeteve dhe të kalimtarëve të rastit. Kjo rrugë është rruga më e rëndësishme dhe me prioritare për Komunën.	
Outputet / Përfitimet	Efikasiteti më i shpejtë i qarkullimit të qytetarëve, arritja më shpejtë në qendrën spitalore, intervenimi më i shpejtë në raste urgjente si dhe arritja me kohë e nxënësve në shkollë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	75,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	29.06.2011	
Vlera e Kontraktuar	77,563.00€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	„Tali” SHPK - Gjilan	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	75,000.00€	



Komuna	Istog
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i aneksit të komunës</i>
Përshkrimi i Projektit	Për krijimin e kushteve më të volitshme për punë është e domosdoshme që të ndërtohet edhe një kat sepse objekti ekzistues nuk ka hapësirë të mjaftueshme për punë. Projekti do të realizojë; ndërtimin e katit të objektit komunal, ndërtimin e kulmit si dhe ndërtimin e zyrave për personel të administratës.
Outputet / Përfitimet	Përmirësimi i shërbimeve publike për komunitetin në cilësi dhe kohë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	200,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	18.08.2011
Vlera e Kontraktuar	256,234.13 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NPT "Termomontimi" Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	200,000.00 €



Komuna	Malishevë	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në fshatin Rud	
Përshkrimi i Projektit	Fshati Rud ka mbi 100 shtëpi me mbi 1000 banorë. Gjatësia e rrugës në këtë fshat është 1.240 km, ku e tërë rruga e cila shpie deri te shkolla e fshatit është e paasfaltuar. Projekti përfshinë rrafshimin e terenit, shtresimin, ngjeshjen dhe asfaltimin me sinjalizim horizontal dhe vertikal.	
Outputet / Përfitimet	Qarkullimi me i lehtë i banorëve të këtij lokaliteti, lehtësim dhe ulje të shpenzimeve dhe mirëqenie të përgjithshme për 1000 banorët e këtij fshati.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		25.10.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		22.11.2011
Vlera e Kontraktuar		86,662.50 €
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		SH.P.K."Jehona" Malishevë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		40,000.00 €



Komuna	Malishevë	
Titulli i projektit	Kanalizimi Temeqin -Bubel-faza e II	
Përshkrimi i Projektit	Për realizimin e këtij projekti parashihet ndërtimi i kolektorit për grumbullimin e ujërave të zeza me kapacitet të mjaftueshëm, hapja e kanalizimi, vendosja e tubave, mbyllja e kanalizimit dhe punët tjera të parapara me projekt dhe standarde të caktuara.	
Outputet / Përfitimet	Menaxhim i ujërave të zeza, ambient i pastër, zvogëlimi i rrezikshmërisë së sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme si dhe përmirësimi i kushteve jetësore të komunitetit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	180,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	13.05.2011	
Vlera e Kontraktuar	276,372.64 €	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.N.T.SH:"Drini Compani" Prizren	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	176,372.64 €	



Komuna	Pejë
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i një kati të objektit të administratës së KK Pejë</i>
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i objektit përfshinë disa faza si: punët e demolimit dhe pastrimit të pjesës së ndërtesës e cila nuk është e qëndrueshme, punët ndërtimore duke përfshirë armimin, betonimin, murimin, fasadimin dhe punët finale të parapara me projekt detal dhe sipas standardeve të ndërtimit.
Outputet / Përfitimet	Përmirësimi i shërbimeve publike civile për komunitetin në cilësi dhe kohë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	191,017.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	02.08.2011
Vlera e Kontraktuar	329,941.42 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NNT"North" Pejë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	191,017.00 €



Komuna	Novobërdë	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në Kuvc	
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt përfshinë: iniciimi i terenit, punët përgatitore, rregullimi i çështjeve pronësore dhe përgatitja e projektit zbatues. Gjatësia e rrugës është 0.9 km dhe shtrihet në fshatin Kuvc afër qytetit të Gjilanit dhe lidhë këtë fshat me fshatin Stanishor.	
Outputet / Përfitimet	Qarkullimi me i lehtë i banorëve dhe përmirësimi i kushteve të banorëve të këtij lokaliteti.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		30,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		22.08.2011
Vlera e Kontraktuar		26,860.00 €
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		SH A “Bejta commerce”Gjilan
Pagesat		
Vlerat e pagesës		26,860.00 €



Komuna	Novobërdë	
Titulli i projektit	Rregullimi i rrugëve lokale në Tirince dhe Carevc	
Përshkrimi i Projektit	Projekti përfshinë realizimin e këtyre punëve; trasimin, gërmimin, rrafshimin dhe shtresimi me zhavorr e rërë si dhe ngjeshja e kanaleve të nevojshme për ujera atmosferik. Rregullimi i rrugëve lokale ka një gjatësi prej 4km dhe gjerësi 4m ne te cilat rruge frekuentojnë 500-600 banorë.	
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë 400 banor shfrytëzues të këtyre rrugëve si edhe 300 banor të lokaliteteve përreth të cilët i shfrytëzojnë këto rrugë në mënyrë indirekte.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		19.08.2011 (1) , 10.11.2011 (2)
Vlera e Kontraktuar		58,842.70 €(1) , 20,042.70 € (2)
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		NTP: “BAZA TRANS” Gjilan, SHPK”Zuka company” Gjilan
Pagesat		
Vlerat e pagesës		38,844.70 €



Komuna	Novobërdë	
Titulli i projektit	Ndërtimi i trotuarit ne rrugën magjistrale ne Llabjan	
Përshkrimi i Projektit	Bazuar në projektin detal për realizimin e këtij projekti duhet të bëhet ndërtimi i trotuareve në mënyrë që nxënësve tu mundësohet qarkullim më i lirë dhe që tu ikin daljeve në rrugën kryesore e cila dalje është rrezikshme dhe mund të ketë pasoja. Projekti përfshinë punët e dheut (rrafshimi dhe ngjeshja) shtresimi me rërë , tubëzimi në gjerësi të caktuar dhe ngjeshja e kubëzave.	
Outputet / Përfitimet	Qarkullimi me i lehtë i banorëve e në veçanti përmirësimi i kushteve të udhëtimit të nxënësve të këtij lokaliteti.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		25,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		22.08.2011
Vlera e Kontraktuar		23,854.24 €
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N N SH “CO-ING” Prishtinë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		23,854.20 €



Komuna	Novobërdë	
Titulli i projektit	Ndërtimi i aneksit te komunës	
Përshkrimi i Projektit	Projekti i ndërtimit të aneksit të komunës përfshinë: punët përgatitore dhe ndërtimi i objektit sipas standardeve ndërtimore të parapara me projekt.	
Outputet / Përfitimet	Zgjerimi i hapësirës dhe kushteve të punës si dhe përmirësimi i shërbimeve publike për banoret e komunës se Novobërdës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		60,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		26.09.2011
Vlera e Kontraktuar		58,800.00 €
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		NNP; “Perspektiva” Kamenicë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		52,920.00 €



Komuna	Shtërpçë
Titulli i projektit	<i>Rregullimi i rrugës Berevc lagja Sharkoqe</i>
Përshkrimi i Projektit	Rruga për lagjen Sharkoqe të fshatit Berevc, është rruga e cila është dëmtuar dhe shkakton shumë probleme rreth qarkullimit të banorëve të kësaj ane. Rruga ka një gjatësi prej 500m. Projekti përfshinë: rrafshimin, nivelizimin, shtresimin, ngjeshjen dhe kubëzimin.
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë rreth 400 banorë ku do të përmirësohen kushtet për qarkullim me të mirë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.06.2011
Vlera e Kontraktuar	41,546.87€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	NNTSH" Sallahu" Kaçanik
Pagesat	
Vlerat e pagesës	41,422.23€



Komuna	Shtërpçë	
Titulli i projektit	Rregullimi i rrugëve ne Verbeshtice	
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt përfshinë rregullimin e të gjitha rrugëve lokale në vendbanimin Verbeshtice, rregullimin e stazes për këmbësor si dhe ndriçimin në disa pika të rëndësishme.	
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë të gjithë banorët e këtij lokaliteti të cilëve do tu përmirësohen kushtet për qarkullim më të mirë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		68,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		27.06.2011
Vlera e Kontraktuar		39,225.33 €
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		NNTSH “Sallahu” Kaçanik
Pagesat		
Vlerat e pagesës		39,127.00 €



Komuna	Shtërpçë	
Titulli i projektit	Rregullimi i terenit sportiv ne Mergjince	
Përshkrimi i Projektit	Rregullimi i këtij tereni sportiv përfshinë ndërtimin dhe asfaltimin e fushës së sportit, tribinat dhe sigurimi i tyre me rrjet përreth, rregullimi i urës dhe mbrojtja e burimit të ujit.	
Outputet / Përfitimet	Mundësia për aktivitete sportive, kulturore dhe rekreative të komunitetit lokal e më gjerë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	29.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	42,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	27.06.2011	
Vlera e Kontraktuar	33,045.50 €	
Vlera e Aneks Kontratës	3,304.55 €	
Emri i Kontraktuesit	SHPK “Luboteni” Shtërpçë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	36,300.49 €	



Komuna	Shtërpçë
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Brod</i>
Përshkrimi i Projektit	Rrjeti i ujësjellësit ka një gjatësi prej 5 km. Burimi i ujit është në afërsi të fshatit Izhanc ku do të ndërtohet kaptazha dhe në afërsi të lagjes Caraj do të ndërtohet rezervuari me kapacitet prej 100m ³ prej ku do të ndërtohet rrjeti për lagjet Caraj, Bozaj dhe Hajdinaj.
Outputet / Përfitimet	Furnizim i mjaftueshëm me ujë të pijshëm, përmirësimi i kushteve jetësore dhe ndikimi në zhvillimin ekonomik .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	88,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.06.2011
Vlera e Kontraktuar	84,510.26 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	SHPK."Linda" Ferizaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	84,086.98 €




Komuna	Suharekë
Titulli i projektit	<i>Revitalizimi i objektit për Muze të edukimit</i>
Përshkrimi i Projektit	Me renovimin e këtij objekti muze do të krijohen kushtet më të mira për vizitorët e ndryshëm të komunës së Suharekës e më gjerë, ky objekt do të jetë muze për grumbullimin dhe sistemimin e objekteve dhe gjërave historike dhe arkeologjike për komunën dhe vizitorët ku do të njihen me vlerat historike dhe arkeologjike.
Outputet / Përfitimet	Qytetarët dhe banorët e Komunës së Suharekës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	200,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.09.2011
Vlera e Kontraktuar	474,888.30€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	" OE Control Product" SH.P.K, Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	200,000.00€



Komuna	Suharekë
Titulli i projektit	<i>Renovimi i kulmit të palestrës sportive "13 Qershori"</i>
Përshkrimi i Projektit	Është bërë renovimi i kulmit të palestrës sportive me hidroizolim, gjeotekstil, llamperi e plastifikuar dhe termoizolim si dhe vendosja e llamarinës së plastifikuar.
Outputet / Përfitimet	Qytetarët dhe banorët e Komunës së Suharekës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.08.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	40,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	28.10.2011
Vlera e Kontraktuar	78,870.00 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	"Hidroizolim Shala" Suharekë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	40,000.00€



Komuna	Deçan	
Titulli i projektit	Zgjerimi i rrugës së gjimnazit	
Përshkrimi i Projektit	Asfaltimi i rrugës është bërë në gjerësi sa të kalojnë dy automjete në të njëjtën kohë në drejtime të ndryshme zgjerimi me trotuare dhe me shiritin e gjelbërimit ku do të ketë edhe infrastrukturën përcjellëse kanalizimin atmosferik dhe zebrat për kalimin e këmbësorëve i cili do të mundësoj qarkullimin e lirë dhe më të mirë të qytetarëve	
Outputet / Përfitimet	Kanë përfituar të gjithë banorët e Komunës së Deçanit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	200,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	09.06.2011	
Vlera e Kontraktuar	183,577.64€	
Vlera e Aneks Kontratës	16,407.10€	
Emri i Kontraktuesit	" Lika Drade" sh.p.k Deçan	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	199,984.53 €	

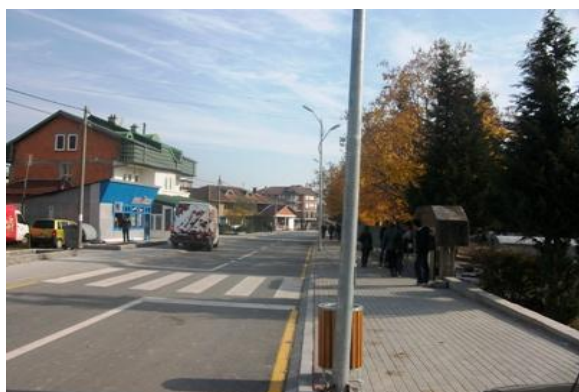

Komuna	Gjakovë	
Titulli i projektit	Rregullimi i trotuareve në rr."Migjeni	
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i trotuareve ku janë punuar punimet tokësore, shtruarja e bazës – tamponit si dhe shtruarja me kubëza betoni ku është bërë ngritja e standardit dhe e sigurisë së këmbësorëve dhe personat me aftësi të kufizuar.	
Outputet / Përfitimet	Banorët dhe qytetarët e lagjeve të Gjakovës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		63,685.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		27.09.2010 (kontratë vjetore)
Vlera e Kontraktuar		63,685.00€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		“Bala “ sh.p.k Gjakovë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		63,685.00€



Komuna	Gjakovë	
Titulli i projektit	Rregullimi i trotuareve në rr."Anton Çeta"	
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i trotuareve ku janë punuar punimet tokësore, shtruarja e bazës – tamponit si dhe shtruarja me kubëza betoni ku është bërë ngritja e standardit dhe e sigurtisë së këmbësorëve dhe personat me aftësi të kufizuar.	
Outputet / Përfitimet	Banorët dhe qytetarët e lagjeve të Gjakovës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		59,305.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		27.09.2010 (kontratë vjetore)
Vlera e Kontraktuar		59,305.00€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		Bala “ sh.p.k Gjakovë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		59,305.00€



Komuna	Gjakovë
Titulli i projektit	<i>Rregullimi i trotuareve në rr."Skënderbeu-N.Terezë"</i>
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i trotuareve ku janë punuar punimet tokësore, shtruarja e bazës – tamponit si dhe shtruarja me kubëza betoni ku është bërë ngritja e standardit dhe e sigurisë së këmbësorëve dhe personat me aftësi të kufizuar
Outputet / Përfitimet	Banorët dhe qytetarët e lagjeve të Gjakovës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	76,629.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.09.2010 (kontratë vjetore)
Vlera e Kontraktuar	76,629.00€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	"Bala " sh.p.k Gjakovë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	76,629.00€



Komuna	Gjakovë
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i shkollës fillore "Isa Boletini" Osek Hylë në Gjakovë</i>
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i shkollës – faza e parë. Shkolla ekzistuese nuk i ka plotësuar kushtet për zhvillimin e procesit arsimor, është ndërtuar objekti me 5 klasa mësimi, hapësirë për parashkollor si dhe hapësirat përcjellëse sipas standardeve. Në këtë shkollë do t'i vijojnë mësimet 197 nxënës dhe kuadri tjetër arsimor. Ky projekt është vazhdim nga viti i kaluar 2010.
Outputet / Përfitimet	Banorët dhe nxënësit e fshatit Osek Hylë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.03.2010
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	26,500.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	28.09.2010
Vlera e Kontraktuar	176,333.17 €
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	"Magg-Holding"Sh.p.k Prishtinë & N.N.SH."Korben" Gjakovë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	22,623.38 €



Komuna	Junik	
Titulli i projektit	Ndërtimi I rrugëve Lokale në Junik	
Përshkrimi i Projektit	Janë punuar trasimi, zgjerimi, kanalet e ujërave atmosferik, lëshesat pllakose dhe gypore sipas nevojave ekzistuese, punimi i bankinave si dhe asfaltimi i disa rrugëve në Junik.	
Outputet / Përfitimet	Kanë përfituar banorët e Komunës së Junikut duke ju ofruar kushte më të mira të infrastrukturës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	15.07.2011	
Vlera e Kontraktuar	84,189.94 €	
Vlera e Aneks Kontratës	8,357.30 €	
Emri i Kontraktuesit	"Joss Krasniqi- Bazë " sh.p.k Junik	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	92,547.24 €	



Komuna	Rahovec
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i SHF “Mustafë Ibishi” paralelja e ndarë Guri Kuq</i>
Përshkrimi i Projektit	Në këtë projekt është punuar objekti shkollor: themelet, pllakat, shtyllat, trajet, kulmi, suvatimi, dyshemetë, ngjyrosja, dyert dhe dritaret , instalimi elektrik, instalimi i ujit dhe kanalizimit dhe i nxehjes qendrore. Ky objekt do të ketë dhoma mësimi, bibliotekë, kthinë për shumë qëllime si dhe administratën e nevojshme.
Outputet / Përfitimet	Nxënësit, mësimdhënësit e kësaj shkolle ku do të kenë kushte më të mira në ruajtjen e shëndetit dhe pastërtia do të jetë në nivel.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	150,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	25.07.2011
Vlera e Kontraktuar	179,381.91€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	"Rexha " sh.p.k Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	150,000.00€



Komuna	Rahovec	
Titulli i projektit	Instalimi i nxehjes qendrore ne SHMFU "Isa Boletini" ne Rahovec	
Përshkrimi i Projektit	Në këtë projekt është punuar nxehja qendrore në tërë objektin ku në secilën klasë janë vendos radiatorët, është vendos kaldaja si dhe rrjeti për nxehje e cila i plotëson kushtet mësimore sipas standardeve ku do të ketë kushte më të mira edukativo –arsimore.	
Outputet / Përfitimet	Nxënësit , mësimdhënësit e kësaj shkolle ku do të kenë kushte më të mira në ruajtjen e shendetit dhe pastërtia do të jetë në nivel.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	70,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	30.09.2011	
Vlera e Kontraktuar	78,933.50€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.P.N "Euro-Ing " Rahovec	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	70,000.00€	



Komuna	Ferizaj	
Titulli i projektit	Asfaltimi i Rrugës Talinovec deri në Rahovicë - Faza I	
Përshkrimi i Projektit	Janë punuar trasimi, zgjerimi, kanalet e ujërave atmosferik, lëshesat pllakose, punimi i bankinave si dhe asfaltimi i rrugës me gjatësi 2575 m’ dhe gjerësi 7 m’	
Outputet / Përfitimet	Qytetarët e komunës së Ferizajt, ku do të përmirësohet jeta e artit dhe kulturës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		200,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		05.07.2011
Vlera e Kontraktuar		198,795.35€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.P.SH. " Bageri" Ferizaj
Pagesat		
Vlerat e pagesës		198,636.31€



Komuna	Ferizaj	
Titulli i projektit	Renovimi I Objektit të ish TMK-së dhe Revitalizimi i tij në objekt të Kulturës, Ferizaj	
Përshkrimi i Projektit	Është bërë rinovimi i objektit të ish TMK-së dhe është kthyer në objekt kulture dhe arti, ku janë bërë punimi i sallës së koncerteve , salla e galerisë së arteve. Janë rinovuar dyert dhe dritaret, suvatimi, dyshemeja teknike, tualete, sanitarja etj,- ku me këtë do të përmirësohet jeta kulturore dhe e artit. Ky projekt ka vazhduar nga viti 2010	
Outputet / Përfitimet	Qytetarët e komunës së Ferizajt, ku do të përmirësohet jeta e artit dhe kulturës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		23.03.2010
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		43,016.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës		10.09.2010
Vlera e Kontraktuar		143,384.89€
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.N.P."Bedi Ndërton" -Podujevë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		43,015.47€



Komuna	Partesh
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i qendrës rajonale të kulturës</i>
Përshkrimi i Projektit	Është bërë ndërtimi i fazës së parë të objektit kulture dhe arti, ku janë bërë punimi i themeleve, pllakave , shtyllave , trajeve dhe muratimi i mureve të jashtme dhe të mbrëmshme , objekti është me etazhitet P +2. Ky projekt nuk ka përfunduar dhe do të vazhdoj në vitin pasues.
Outputet / Përfitimet	Qytetarët e komunës së Parteshit, ku do të përmirësohet jeta e artit dhe kulturës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	300,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	20.06.2011
Vlera e Kontraktuar	899,877.89€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	"Conex group" Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	300,000.00€



Komuna	Partesh
Titulli i projektit	<i>Vazhdimi i ndërtimit të QMF-se Partesh</i>
Përshkrimi i Projektit	Është bërë ndërtimi edhe i një kati shtesë në objektin QMF në Pasjan, muratimi, shtyllat, trajet, kulmi, suvatimi, ngjyrosja dhe kompletimi me instalime dhe elemente : ujë, rrymë, nxehje qendrore dhe elemente sanitare.
Outputet / Përfitimet	Qytetarët e komunës së Parteshit ku do të përmirësohet shërbimet shëndetësore të banorëve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	229,282.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	25.08.2011
Vlera e Kontraktuar	227,894.07€
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	" Tekno-Ing Consulting" shpk Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	227,894.07€



Komuna	Partesh	
Titulli i projektit	Rregullimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në fshatin Budrikë-Gjilanë/Partesh	
Përshkrimi i Projektit	Punimi i kanalizimit atmosferik dhe fekale në fshatin Budrikë, ku është bërë punimi i rrjetit me gypa PVC dhe puseta nga betoni, gropa septike, kanalizimi atmosferik. Ky projekt është vazhdim nga vit 2010.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e fshatit Budrikë – K. Partesh	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	25.03.2010	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	119,558.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit të kontratës	30.08.2010	
Vlera e Kontraktuar	155,897.22 €	
Vlera e Aneks Kontratës	10,430.24 €	
Emri i Kontraktuesit	N.N.P." AREA" Sh.p.k-Kamenicë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	119,558.00€	



Komuna	Klinë	
Titulli i projektit	Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Gllarevë	
Përshkrimi i Projektit	Është bërë shpërndarja e gypave nga PVC-ja për ujësjellës në gjatësi prej 9.100 m’ që i përfshin tri fshatra, punimi i rezervuarit me të gjitha pjesët fazonike, pusetat, punimi i pusetave me të gjitha pjesët fazonike. Ky projekt është vazhdim nga viti 2010.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e tri fshatrave Gllarevë, Përçev, Rigjevë dhe Komuna e Klinës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.03.2010	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	142,870.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit të kontratës	15.09.2010	
Vlera e Kontraktuar	220,722.48€	
Vlera e Aneks Kontratës	7,292.03 €	
Emri i Kontraktuesit	Berisha Company sha., Ferizaj	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	137,589.49 €	




Komuna	Klinë	
Titulli i projektit	Asfaltimi I rrugës ne Fshatin Gremnik	
Përshkrimi i Projektit	Janë punuar trasimi, zgjerimi, kanalet e ujërave atmosferik, lëshesat pllakose , punimi i bankinave si dhe asfaltimi i rrugës me gjatësi 2,350m’ dhe gjerësi 5 m’ dhe në këtë rrugë do të shfrytëzojnë 1591 banor të etniteteve të ndryshme.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e fshatit Gremnikë dhe Komuna e Klinës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.04.2011	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	180,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	04.07.2011 (11.07.2011)	
Vlera e Kontraktuar	205,560.94€	
Vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	OE" Asfalti" Pejë & "AIM" sh.p.k. Klinë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	180,000.00€	



Komuna	Mitrovicë	
Titulli i projektit	Renovimi i objektit të Administratës Komunale të Mitrovicës	
Përshkrimi i Projektit	Renovimi i objektit të administratës komunale në Mitrovicë faza e parë ku janë rinovuar: dritaret, dyert e mbrëmshme dhe të jashtme (një pjesë) fasada strukturale, tualetet, zyre, suvatimi, elektrik, suvatimi, ngjyrosja, dyshemeja etj, ku do të përmirësohen kushtet për punë. Ky projekt është vazhdim nga vit 2010.	
Outputet / Përfitimet	Punëtorët e administratës dhe qytetarët e Komunës së Mitrovicë të cilëve ju ofrohen shërbime më të mira	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	04.03.2010	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	11,532.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit të kontratës	10.08.2010	
Vlera e Kontraktuar	115,310.96€	
Vlera e Aneks Kontratës	10,335.60 €	
Emri i Kontraktuesit	MAK Building sh.p.k., Vushtrri	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	11,531.10€	



MAPL	
Titulli i projektit	Softueri dhe përkrahja për integrimin e zyrave të Kuvendeve Komunale për shërbim të qytetarëve me portalin ministror
Përshkrimi i Projektit	Është bërë furnizimi me pajisje për teleprezencë , furnizimi me pajisje Harduerike për Komunën Graçanicës dhe mirëmbajtja dhe dizajnimi i softuerik në 4 gjuhë : në shqipe, serbe, turke dhe angleze dhe databaza permanente për 39 lokacione,përkrahja 3 ditë në muaj (prezencë fizike e stafit profesional)për 20 muaj rresht ,instalimi, konfigurimi, adaptimi , implementimi dhe përkrahja në MAPL(databaza qendrore, arkivi dhe integrimi në Web faqet e Komunave për 120 ditë.
Outputet / Përfitimet	Kuvendet Komunale të 38 komunave të Republikës së Kosovës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL për vitin 2011	295,817.40€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	23.09.2009 (kontratë afatgjate)
Vlera e Kontraktuar	327,001.00
Vlera e Aneks Kontratës	
Emri i Kontraktuesit	OE" Botek"Prishtinë & DataProgNet" Ferizaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	295,817.40€

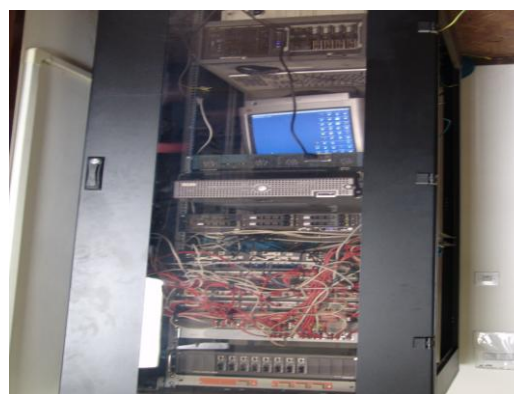

Lista e Projekteve të financuara në komuna per vitin 2011

Nr.	KOMUNA	EMRI I PROJEKTIT	Financimi nga MAPL	Fondi I financimit	Zotimi I mjeteve	Data e zotimit	Vlera e Kontrates	Data e Kontrates	Pagesat
1	Gjilan	Rregullimi i shtratit të Lumit Baja	75,000.00	IPA	75,000.00	01.06.2011	216,740.45	08.09.2011	17,869.20
2		Asfaltimi i rrugës fshati Veleknicë-Deponia Rajonale	75,000.00	IPA	75,000.00	01.06.2011	77,563.00	29.06.2011	75,000.00
3	Istog	Ndertimi I katit ne objektin komunal-Istog	200,000.00	IPA	200,000.00	01.06.2011	256,234.13	18.08.2011	200,000.00
4	Mitrovicë	Rindërtimi-Meremetimi i 10 shtëpive të djegura në Veri të Mitrovicës	100,000.00	IPA	100,000.00	31.05.2011	250,000.00	03.10.2011	99,870.41
5		Renovimi I objektit të Administratës Komunale të Mitrovicës	100,000.00	IPA	100,000.00	31.05.2011	93,898.09	01.08.2011	93,898.09
6	Rahovec	Ndërtimi i SHF "Mustafë Ibishi" paralelja e ndarë Guri Kuq	150,000.00	IPA	150,000.00	01.06.2011	179,381.91	25.07.2011	150,000.00
7		Instalimi I Nxemjes qendrore ne SHMFU "Isa Boletini" ne Rahovec	70,000.00	IPA	70,000.00	01.06.2011	78,933.50	30.09.2011	70,000.00
8	Prishtinë	Fasadimi I objektit të Komunës së Prishtinës	200,000.00	IPA	200,000.00	01.06.2011	193,588.75	02.08.2011	150,000.00
9	Skenderaj	Ndërtimi i objektit të administratës së Kuvendit Komunal të Skenderajt(faza e IV)	200,000.00	IPA	200,000.00	31.05.2011	1,840,157.24	17.09.2009	200,000.00
10		Ndertimi i zyres se vendit ne Turiqec	29,784.00	ZV	29,784.00	11.08.2011	29,783.15	19.09.2011	29,783.15
11		Rrethoja e zyrës së vendit në Turiqec	10,500.00	ZV	10,500.00		10,500.00		10,500.00
12	Partesh	Ndertimi I qendrës rajonale të kulturës	300,000.00	IPA	300,000.00	31.05.2011	899,877.89	20.06.2011	300,000.00

13		Vazhdimi I ndertimit te QMF-se Partesh	229,282.00	GS	229,282.00	31.05.2011	227,894.07	25.08.2011	227,894.07
14		Rregullimi I kanalizimit fekal dhe atmosferik ne fshatin Budrike - Gjilan / Partesh	119,558.29	FK	119,558.29	09.08.2011	155,897.22	30.08.2010	119,557.89
15	Suhareke	Revitalizimi I objektit për Muze të edukimit	200,000.00	IPA	200,000.00	01.06.2011	474,888.30	07.09.2011	200,000.00
16		Renovimi i kulmit të Palestrës Sportive "13 Qershori"	40,000.00	IPA	40,000.00	23.09.2011	78,870.00	28.10.2011	40,000.00
17	Gracanice	Rregullimi I ndriqimit Graçanice - Llapnaselle	19,609.04	IPA	19,609.04	31.05.2011	79,001.36	11.05.2010	19,609.00
18		Rregullimi I ndriqimit Dobratinë - Gushtericë	10,494.00	IPA	10,494.00	01.06.2011	98,795.60	27.04.2011	10,494.00
19		Rekonstruimi I fushes per basketboll dhe volejball	7,820.00	IPA	7,820.00	01.06.2011	7,820.00		7,820.00
20		Rindërtimi i rrugës kryesore Faza III	100,000.00	GS	100,000.00	01.06.2011	114,745.00	16.05.2011	100,000.00
21		Ndërtimi parkut ne Gushtericen e eperme	35,000.00	GS	35,000.00	01.06.2011	27,908.08	01.06.2011	27,908.08
22		Rindërtimi i rrugës drejt shkollës ne Graçanice	75,000.00	GS	75,000.00	31.05.2011	103,890.00	12.05.2011	75,000.00
23		Ndërtimi i objektit ndihmës ne varrezat ne Gushtericën e Poshtme	15,000.00	GS	15,000.00	01.06.2011	15,521.39	01.06.2011	15,000.00
24		Rrjeti i kanalizimit fekale ne fshatin Kishnice	25,000.00	GS	25,000.00	01.06.2011	26,935.00	13.09.2011	25,000.00
25		Rrjeti sekondar i kanalizimit per vendbanimin Gracanice Badovc dhe Shushice	50,000.00	IPA	50,000.00	01.06.2011	48,586.60	13.09.2011	48,586.60
26		Tualete per Manastirin e Gracanices	9,465.12	FK	9,465.12	09.08.2011	23,651.10	22.11.2010	7,951.10
27	Junik	Ndërtimi I rrugëve Lokale në junik	100,000.00	IPA	100,000.00	31.05.2011	92,547.24	15.07.2011	92,547.24

28		Konferenca e donatoreve	1,700.00	ST	1,700.00		1,700.00		1,700.00
29		Kanalizimi Temeqin-Bubël, (faza e II)	180,000.00	GS	180,000.00	01.06.2011	276,372.64	13.05.2011	176,372.64
30	Malisheva	Ndërtimi i rrugës në fshatin Rud	40,000.00	IPA	40,000.00		86,662.50		40,000.00
31		Asfaltimi I rruges ne Fshatin Gremnik	180,000.00	GS	180,000.00	01.06.2011	205,560.94	04.07.2011 gremnik 1 dhe 11.07.2011 gremnik 2	180,000.00
32	Klina	Ndërtimi i ujësjellësit ne fshatin Gllarevë	142,870.00	GS	142,870.00	21.06.2011	220,722.48	15.09.2010	137,589.49
33	Podujeve	Rregullimi shtratit të lumit Llap	127,000.00	GS	127,000.00	01.06.2011	230,323.80	08.06.2011	126,999.83
34	Prizren	Ndërtimi me asfalt i rrugës dhe infrastrukturës complete”Jusuf Gërvalla-1	194,660.00	GS	194,660.00	01.06.2011	188,484.93	18.07.2011	188,483.43
35	Deçan	Zgjerimi i rrugës së gjimnazit në Deçan	200,000.00	GS	200,000.00	01.06.2011	199,984.74	09.06.2011	199,984.53
36		Rregullimi i trotuareve në rr.”Migjeni	63,685.00	GS	63,685.00	01.06.2011	63,685.00	27.09.2010 kontrat vjetore	63,685.00
37	Gjakove	Rregullimi i trotuareve në rr.”Anton Ceta”	59,305.00	GS	59,305.00	01.06.2011 Rizotimi (21.09.2011)	59,305.00	27.09.2010 kontrat vjetore	59,305.00
38		Rregullimi i trotuareve në rr.”Skënderbeu-N.Terezë”	76,629.00	GS	76,629.00	01.06.2011	76,629.00	27.09.2010 kontrat vjetore	76,629.00
39	Vushtrri	Shtruarjen me kubëza betoni të disa rrugëve në qytetin e Vushtrrisë	100,000.00	GS	100,000.00	21.06.2011	197,933.10	27.07.2011	99,950.00

40		Riasfaltimi i segmentit rrugor nr. 5 në fshatin Prelluzhë	17,589.60	GS	17,589.60	21.06.2011	17,961.52	13.07.2011	17,589.00
41	Ferizaj	Asfaltimi i Rruges Talinovec deri ne Rahovice Faza I	200,000.00	GS	200,000.00	01.06.2011	198,795.35	05.07.2011	198,636.31
42	Gllgovc	Ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Komaran-Zogaj	195,669.00	GS	195,669.00	01.06.2011	194,591.50	02.06.2011	194,591.50
43	Fushe Kosove	Ndriçimi publik në komunën e Fushë Kosovës	200,000.00	GS	200,000.00	01.06.2011	239,606.64	08.08.2011	199,659.36
		Botimi I revistës vjetore	5,000.00	ST	5,000.00	06.12.2011			5,000.00
44	Shterpca	Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Brod	88,000.00	GS	88,000.00	01.06.2011	84,510.26	27.06.2011	81,897.66
45		Rregullimi I terenit sportiv Mrgjinca- Shterpce	42,000.00	IPA	42,000.00	01.06.2011	36,350.05	27.06.2011	36,300.49
46		Rregullimi I rrugëve ne fshatin Verbeshtice	68,000.00	GS	68,000.00	01.06.2011	39,225.33	27.06.2011	39,127.28
47		Rregullimi rruges Berevc lagja Sharkoqe	50,000.00	GS	50,000.00	01.06.2011	41,546.87	27.06.2011	41,422.23
48	Novoberda	Rregullimi i rrugëve lokale në Tirincë dhe Carevc	40,000.00	GS	40,000.00	01.06.2011	58,842.70	19.08.2011	38,842.70
49		Ndërtimi i trotuarit në rrugen magjstrale Llabjan	25,000.00	GS	25,000.00	01.06.2011	23,854.24	22.08.2011	23,854.20
50		Ndërtimi I aneksit të objektit e komunës	60,000.00	ZV	60,000.00	01.06.2011	58,800.00	26.09.2011	52,920.00
51		Asfaltimi i rrugës Kuvc	30,000.00	GS	30,000.00	01.06.2011	26,860.00	22.08.2011	26,860.00
52	Lipjan	Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Kraishtë -Faza I	150,000.00	GS	150,000.00	01.06.2011	498,383.49	22.07.2011	150,000.00
53	Shtime	Rregullimi I shtratit të lumit në Shtime	100,000.00	GS	100,000.00	31.05.2011	234,635.93	16.06.2011	100,000.00

54		Renovimi I objektit të Administratës Komunale në Shtime					24,972.00	06.09.2011	24,972.00
55		Furnizimi dhe montimi me inventar per qerdhen e femijeve ne Shtime	50,000.00	ST	50,000.00	14.04.2011	18,134.51	06.09.2011	18,134.51
56	Pejë	Ndërtimi i një kati të objektit të administratës së KK Pejë	191,017.00	IPA	191,017.00	01.06.2011	329,941.42	02.08.2011	191,017.00
57	Kamenicë	Asfaltimi I rrugëve lokale në Karaçevë	150,000.00	ST	150,000.00	27.06.2011	148,632.27	09.09.2011	148,632.16
58	Hani I Elezit	Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatit Dimcë	100,000.00	ST	100,000.00	21.07.2011	195,604.90	10.10.2011	100,000.00
59	Obiliq	Ndërtimi I zyres se vendit ne Sibovc	35,000.00	ZV	35,000.00	11.08.2011	32,931.94	20.10.2011	32,931.93
60		Ndërtimi I zyres se vendit ne Dardhishtë	35,000.00	ZV	35,000.00	11.08.2011	32,931.94	20.10.2011	32,931.93
61	MAPL	Softueri dhe përkrahja për integrimin e zyrave të Kuvendeve Komunale për shërbim të qytetarëve me portalin ministror	295,817.40		295,817.40	19.04.2011	327,001.00	23.09.2009	295,817.40
		Total	6,040,454.45	-	6,043,279.05	-	10,375,087.06	-	5,816,125.41

Projektet e paguara si obligime nga viti i kaluar						
Nr.	KOMUNA	EMRI I PROJEKTIT	Financimi nga MAPL	Fondi I financimit	Zotimi I mjeteve	Pagesat
1	Graçanice	Rregullimi I trotuareve para murit te Manastirit	2,759.01	FK	2,759.01	2,759.01
2		Rrethoja rreth kishes ne Gushtericen e Eperme	1,059.94	FK	1,059.94	1,059.94
3		Rrethoja e kompleksit sportiv	3,225.60	FK	3,225.60	3,225.60
4	Graçanice	Tereni sportiv ne qender te Kishnices	7,567.12	FK	7,567.12	7,567.12
5		Rrethoja e kishes ne fshatin Lepine	7,638.61	FK	7,638.61	7,638.61
6	Graçanice	Rregullimi I rruges kryesore ne Graçanice- faza e dyte	72,288.78	FK	72,288.78	72,288.78
7		Rregullimi I rruges kryesore ne Graçanice	167,526.00	FK	167,526.00	167,526.00
8	Ranilluge	Hartimi I projektit per rregullimin e lumit Morava	9,800.00	FK	9,800.00	9,800.00
9	Ranilluge	Furnizimi me pajisje sportive per klubin e futbollit ne Ropotove	4,992.00	ST	4,992.00	4,992.00
10		Reniovimi I salles se KK Prishtine	14,086.00	IPA	14,085.72	14,085.72
11		Hartimi I 5 projekteve detale per pjesen veriore te Mitrovices	9,825.00	ST	9,825.00	9,825.00
12	Klllokoti	Transmetimi I mbledhjeve te kuvendit komunal ne Klllokot	9,750.00	ST	9,750.00	5,576.00
13		Ndertimi I rrjetit elektrik ne fshatin Boletin ne Zveqan	214,686.00	IPA	214,686.00	214,686.00

14		Ndërtimi i sh.f.Isa Boletini në Osek Hyle - KK Gjakovë	26,500.00	IPA	26,500.00	22,623.38
15	Mitrovice	Renovimi i objektit të administratës komunale të Mitrovicës -KK Mitrovicës	11,532.00	IPA	11,532.00	11,531.10
16		Renovimi i objektit të ish TMK-së dhe revitalizimin e tij në objekt të kulturës-Ferizaj	43,016.00	IPA	43,016.00	43,015.47
		Gjithsej	606,252.06		606,251.78	598199.73
77		TOTALI I TE GJITHA PROJEKTEVE	6,646,706.51	-	6,649,530.83	6,414,325.14
