



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti për Bashkëpunim dhe Zhvillimit Regjional

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2012**

Shkurt 2013

Permbajtja

1. Përmbledhja ekzekutive	7
2. Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve	8
FUSHË-KOSOVË	9
"Ndriçimi solar në Fushë Kosovë"	9
PRISHTINË	10
" Nivelizimi i terenit dhe rrethimi i hapësirës për Tregun e Kombinuar"	10
SHTIME	11
" Zgjerimi dhe pastrimi i shtratit të lumit Shtime faza e dytë"	11
SHTIME	12
"Rregullimi i shtratit të lumit në Shtime, faza e I-(vazhdim)"	12
VITI	13
"Furnizimi me inventar"	13
LIPJAN	14
"Rikonstruimi dhe zgjerimi i rrugës Lipjan-Sillovi"	14
RANILLUG	15
" Asfaltimi i rrugëve kah ndërtesa e re" – Ranillug	15
KAMENICË	16
" Trotuari dhe riasfaltimi I rrugës në mes dy rrethrotullimeve" në Kamenicë	16
JUNIK	17
"Rehabilitimi i rrugëve lokale në Junik"	17
KLLOKOT	18
"Ndërtimi i Stacionit policor "	18
OBILIQ	19
"Vazhdim i ndërtimit të rrjetit të kanalizimit" Obiliq	19
KAÇANIK	20
" Asfaltimi I rrugës në fshatin Dubravë - Biçec"	20
PRISHTINË	21
"Rregullimi i varrezave ortodokse"	21
DEÇAN	22
" Ndërtimi I rrugës Mehmet Uka "	22
MITROVICË	23
"Ndërtimi I rrugës Xhemë Lami"	23
MITROVICË	24
"Parkingu I tregut të gjelbër"	24
MITROVICË	25
"Rregullimi i objektit kolmunal"	25
SKENDERAJ	26
" Vazhdimi I ndërtimit te objektit te KK Skenderaj"	26
SKENDERAJ	27
VUSHTRRI	28

SUHAREKË	29
"Ndërtimi I stadiumit të qytetit - faza e I-rë"	29
FERIZAJ.....	30
"Hortikultura- Gjelbërimi i hapësirave të reja në qytet"	30
FERIZAJ.....	31
Asfaltimi i rrugës në fshatin Zaskok deri në Pleshinë	31
HANI I ELEZIT	32
" Asfaltimi i rrugës lagja e re-Pustenik"	32
HANI I ELEZIT	33
Shtrimi me kubeza betoni të rrugës në fshatin Krivenik	33
KOLLOKT	34
"Furnizimi me inventar për komunën e Kllokotit"	34
GJAKOVË.....	35
"Ndërtimi i parkut në qendër të qytetit"	35
PARTESH	36
"Ndërtimi I qendrës rajonale të kulturës në komunën e.....	36
Parteshit""	36
RAHOVEC	37
" Ndërtimi I objektit të AMF dhe rrethimi i oborrit të AMF-së ne fshatin Xerxë "	37
KAMENICË	38
"Rikonstruimi i parkut në Muçivercë"	38
PODUJEVË.....	39
" Rregullimi I shtratit të lumit Llap"	39
RAHOVEC	40
Ndriçimi publik në Hoqë të Madhe	40
PRIZREN.....	41
"Ndërtimi i pikave grumbulluese dhe furnizimi me kontejner"	41
RAHOVEC	42
"Rregullimi i sheshit në Hoqë të Madhe"	42
DRAGASH.....	43
"Ndërtimi i kanalizimit në fshatin KUK"	43
GJILAN.....	44
"Rregullimi i shtratit te lumit Baja "	44
GJILAN.....	45
"Rregullimi i infrastrukturës ne fshatin Shillove "	45
GJILAN.....	46
" Rregullimi i rrjetit te ujësjellesit ne fshatin Kmetoc"	46
ISTOG	47
"Renovim i ndertesës se kuvendit"	47
MALISHEVE.....	48
"Rrjeti i kanalizimit ne fshatin Senik dhe Drenoc"	48
NOVOBERDE	49

"Furnizimi me inventar për objektin e administratës"	49
NOVOBERDE	50
"Regullimi i objektit të administratës "	50
PEJË	51
" Ndërtimi i kanalizimit fekale rrethi Vitimirice- Qyshk"	51
GRACANICA	52
"Rikonstruimi dhe ndertimi i rrugë Laplje Selo-Qaglavica-Faza I"	52
GRACANICA	53
"Rikonstruimi dhe ndërtimi i rrugës Laplje Selo-Qaglavica-Faza II"	53
GRACANICA	54
"Furnizimi me inventar për komunën e Graçanicës"	54
RANILLUG	55
"Furnizimi me inventarë për komunën Ranillug"	55
SHTËRPCE	56
"Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe trotuarit në Shtërpce"	56
SHTËRPCE	57
"Ndërtimi i kanalizimit dhe asfaltimi i rrugës në Brezovicë	57
GRAÇANICA	58
"Qendra e zanateve dhe tregtisë në komunën e Graçanicës"	58
GRAÇANICA- LIPJANI	59
"Ndërtimi i rrugës Dobratin- Sllovijë"	59
JUNIK- GJAKOVË	60
Regullimi i parkut në brigjet përgjatë shtratit të lumit Erenik"	60
VITI - KLLOKOT	61
" Ndërtimi i trotuarit Klokot - Radivojc"	61
SHTËRPCE- FERIZAJ	62
"Instalimi elektronik i parkingut në qendrën sportive në Shtërpce"	62
PRIZRENI - DRAGASHI MAMUSHA.....	63
"Krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjes së ambientit nëpërmes ndërtimit të vend pikniqeve në komunat: Prizren, Dragash dhe Mamushë"	63
RAHOVECI- SUHAREKË MALISHEVË.....	64
"Krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjes së ambientit nëpërmes ndërtimit të vend pikniqeve në komunat : Rahovec, Suharekë dhe Malishevë"	64
ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE	
Furnizim me gjenerator	65
ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE	
Furnizim me detektor	66
ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE	
Blerja e veturave për ZAMV	67
MAPL.....	68
Pajisje për IT - MAPL.....	68
MAPL.....	69

Softueri dhe përkrahja për integrimin e zyrave të Kuvendeve Komunale për shërbim të qytetarëve me portalin ministror	69
Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2012.....	70

Të nderuar lexues,

Komunat e Republikës së Kosovës në vazhdimësi kanë nevojë për investime të reja në infrastrukturën publike. Procesi i reformës së pushtetit lokal siguron këtë në planin afatgjatë. Ky proces duhet të mbështetet në ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe teknike me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira për qytetarët.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal bazuar në mandatin e saj për avancimin e qeverisjes lokale, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar shërbime efektive në raport me qytetarët, si çdo vit buxhetor edhe në vitin 2012 ka përkrahur të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe komunat e reja me mjete buxhetore për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike.

Në këtë drejtim Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Komuniteti i Donatorëve kanë përkrahur dhe janë plotësisht të përkushtuar që këtë ndihmë ta vazhdoj edhe gjatë viteve të ardhshme.

Raporti i përgatitur, paraqet investimet publike komunale që ka bërë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal gjatë vitit 2012 për komuna, ku mund të vëreni se duke punuar bashkë me komunat ne kemi realizuar projekte të cilat kanë ngritur infrastrukturën dhe janë krijuar lehtësira më të mëdha për ofrimin e shërbimeve më të mira dhe me cilësore për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Këto investime kanë përfshirë të gjitha sektorët si: rrugë, ujësjellës, kanalizim, objekte komunale, arsim, shëndetësi, kulturë rini dhe sport, rregullimi i lumenjve, shërbime publike etj.

Shpresojmë se bashkëpunimi ynë do të vazhdojë edhe në ardhmen që bashkërisht, do të ngrisin kapacitetet, për të krijuar një ambient të sigurt për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Sinqerisht,

Slobodan Petrović, Zëvendës Kryeministër dhe Ministër i MAPL-së



Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) me misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim Avancimin e Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

MAPL si çdo vit buxhetor edhe këtë vit ka përkrah komunat me mjete kapitale për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike me qëllim të përmirësimit të kushteve të infrastrukturës për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Ky raport është i detajizuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MAPL-së në shumë projekte të komunave, ka raste ku MAPL është financues i projektit në tërësi. MAPL në vitin 2012 gjithsej ka realizuar 67 projekte në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës.

Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve

Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e projekteve nëpër komunat e Republikës së Kosovës e ka realizuar duke i ndarë zyrtarët e Departamentit për Bashkëpunim dhe Zhvillimit Regjional në dy grupe punuese ku secili grup ka pasur në përgjegjësi monitorimin e projekteve. Dy grupet që kanë koordinuar dhe monitoruar projektet janë mbikëqyr nga drejtori i DBZHR-s z. Besim Kamberaj.

Grupi i pare i përbërë nga: Fetije Begolli, Besa Shala, Hanife Alimusaj dhe Tush Berisha, ka monitoruar projektet në këto komuna : Gjilan, Partesh, Istog, Malisheve, Dragash, Peje, Viti, Suharek, Novoberd, Klokot, Hani i Elezit, Gjakove, Junik, Obiliq ,Kaqanik, Kamenic dhe Ranillug.

Grupi i dyte i përbërë nga: Mehdi Ratkoceri, Emine Hoti, Sabajete Hoxha, Fatmire Bashota dhe Radica Millosheviq, ka monitoruar projektet në këto komuna: Shtime, Graçanicë, Deqan, Skenderaj, Mitrovic, Shterpc, Rahovec, Lipjan, Podujevë, Prizren, Fushë Kosovë, Vushtrri dhe Prishtinë.

Komuna	FUSHË-KOSOVË	
Titulli i projektit	“Ndriçimi solar në Fushë Kosovë”	
Përshkrimi projektit	Projekti përfshin ndriçimin solar të Komunës së Fushë Kosovës me fshatra si: Bresje, Sllatin, Bardh i madh, Bardhë i vogël, Mes Bardhë (Pomozotin) Lismir, Grabovc, Harilaq, Henc, Dobrev e Ulët, Dobrev e Naltë, Vrogoli.	
Outputet / Përfitimet	Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët e Komunës së Fushë-Kosovës .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	11.06.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	75,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	9,253.36 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	04.09.2012 - 84,253.36 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.N.P Ndriçimi"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	75,000.00 €	



Komuna	PRISHTINË	
Titulli i projektit	" Nivelizimi i terenit dhe rrethimi i hapësirës për Tregun e Kombinuar"	
Përshkrimi projektit	Ky projekt do të realizohet në dy faza: Në fazën e parë është punuar në: rrethimin e hapësirës së tregut me rrethojë metalike si dhe vendosjen e laurës me komandë digjitale; ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit; ndërtimin e kanalizimit atmosferik dhe fekal; shtrirja e rrjetit ndriçues eficient, tabelave reklamuese.	
Outputet / Përfitimet	Në këtë projekt përfitojnë Qytetarët e Komunës së Prishtinës Podujevës dhe të Obiliqit që është përmirësimi i konkurrencës së bizneseve me krijimin e kushteve të përshtatshme për shitjen e produkteve vendore.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.03.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		90,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		60,695.50 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		19.07.2012 - 150,695.50 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		"N. N. P Zhvillimi"
Pagesat		
Vlerat e pagesës		90,000.00 €



Komuna	SHTIME	
Titulli i projektit	" Zgjerimi dhe pastrimi i shtratit të lumit Shtime faza e dytë"	
Përshkrimi projektit	Ky projekt përfshin pjesën e qendrës se qytetit të Shtimes me një distancë prej 600m dhe gjerësi 12m.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë 7000 banorët e qytetit të Shtimes, një siguri më e madhe nga vërshimet,eliminimi i fyteve të ngushta rregullimi i hapësirave përreth me parqe të reja,pastërti më të madhe për rreth,infrastrukturë më të mirë,vend atraktiv edhe për vizitorët e jashtëm.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		24.04.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		28,900.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		26.06.2012 - 88,900.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		"NP Euro Besi&Pro-tek"
Pagesat		
Vlerat e pagesës		60,000.00 €



Komuna	SHTIME	
Titulli i projektit	“Rregullimi i shtratit të lumit në Shtime, faza e I- (vazhdim)”	
Përshkrimi projektit	Lumi Shtime kalon në mes të qytetit të Shtimes, projekti përfshin pjesën e qendrës së qytetit të Shtimes me një distancë prej 600m dhe gjerësi 12m.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banoret e qytetit të Shtimes, një siguri më e madhe nga vërshimet,eliminimi i fyteve të ngushta rregullimi i hapësirave përreth me parqe të reja, pastërti më të madhe për rreth, infrastrukturë më të mirë,vend atraktiv edhe për vizitorët e jashtëm.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		05.05.2011
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		49,800.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		184,835.93 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		16.06.2011 - 234,635.93 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		"NNP" Arbëri -NS"
Pagesat		
Vlerat e pagesës		49,800.00 €



Komuna	VITI	
Titulli i projektit	“Furnizimi me inventar”	
Përshkrimi projektit	Në këtë projekt është bërë furnizimi me: Tavolina pune, karrige lëvizëse,kaset lëvizëse,ormana metalik,perde veneciane, fotele.	
Outputet / Përfitimet	Krijimi i kushteve më të mira për zyrtaret komunal, si dhe një ndjenjë e mirë për qytatarët që shkojnë në komunë për të kryer shërbime të ndryshme.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		19.09.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		30,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		1.900,00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		06.12.2012 - 31,900.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.T.P Eurometal
Pagesat		
Vlerat e pagesës		30,000.00 €



Komuna	LIPJAN	
Titulli i projektit	“Rikonstruimi dhe zgjerimi i rrugës Lipjan-Sillovi”	
Përshkrimi projektit	Bazuar në kushtet ekzistuese dhe mundësitë për implementim në këtë projekt është intervenuar në nivel të rikonstruimit dhe zgjerimit : profili i rrugës është ndërtuar në gjerës B= 5.50 m’ si dhe bankinat min 1m’.	
Outputet / Përfitimet	Ngritja e nivelit të standardit të jetesës së qytetarëve Kushte të favorshme për Zhvillim ekonomik Përmirësim i kushteve mjedisore Inkurajim për zhvillim të qëndrueshëm të jetës në fshat Rritja e interesimit për zhvillim të aktiviteteve në bujqësi.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	06.11.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	80,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	254,959.10 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	17.10.2012 - 334,959.10 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	Bejta Komerc	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	80,000.00 €	



Komuna	RANILLUG	
Titulli i projektit	“ Asfaltimi i rrugëve kah ndërtesa e re” – Ranillug	
Përshkrimi projektit	Punime:,është bërë pastrimi I terenit, piketimi I terenit, hapja e kanaleve të hapura atmosferike, largimi i humusit , gërmimi i dheut, planifikimi , rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës ,mbushja, stabilizimi dhe ngjeshja e trasesë,asfaltimi i një pjese të rrugës , projekti nuk ka përfunduar –vazhdon në vitin 2013	
Outputet / Përfitimet	Banorët e komunës së Ranillugut	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	150,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	2.08.2012 -140,653.85 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	15.11.2013	
Emri i Kontraktuesit	N.T.P. "BAAS COM"Gjilan	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	92,405.22 €	



Komuna	KAMENICË	
Titulli i projektit	"Trotuari dhe riasfaltimi I rrugës në mes dy rrethrotullimeve" në Kamenicë	
Përshkrimi projektit	Punimet;është bërë pastrimi I terenit, piketimi I terenit, pastrimi dhe sanimi i kanaleve të hapura atmosferike , gryerja e asfaltit ekzistues, gjërmimi i dheut ,planifikimi , rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës ,mbushja, stabilizimi dhe ngjeshja e trasesë, i rregullimi I trasesë për vendosjen e kubëzave të betonit,punimi i ujëmbledhsave , punimi i skajoreve vendosja e gypave dhe asfaltimi i rrugës.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e komunës së Kamenicës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	5,660.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	13.08.2012 -105,660.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Magjistrajla" sh.p.k Gjilan	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	97,833.97 €	



Komuna	JUNIK	
Titulli i projektit	""Rehabilitimi i rrugëve lokale në Junik"	
Përshkrimi projektit	Punimet;është punuar në pastrimin e terenit, matja dhe incizimi gjeodezik i terenit, gjurmimi, mbushja dhe ngjeshja e planifikimit të trupit të rrugës, hapjen dhe betonimin e kanaleve atmosferike të hapura dhe të mbyllura, punimi i lëshesave, punimi i trasesë së rrugës dhe asfaltimi i tri rrugëve.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e tri lagjeve të Junikut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	17.07.2012 - 86.151.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.T.SH.N" ARFA" Deçan	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	86,151.00 €	

Fotot:



Komuna	KLLOKOT	
Titulli i projektit	""Ndërtimi i Stacionit policor "	
Përshkrimi projektit	Punimet: është bërë pastrimi I terenit, piketimi I terenit,hapja e themeleve, armimi dhe betonimi I tyre, dërrasimi , armimi dhe betonimi I sokullës , armimi dhe betonimi I trajeve mbi sokull dhe pllakës mbi themele është punuar dërrasimi, armimi dhe betonimi i shtyllave, trajeve dhe pllakës mbi përdhese , është bërë muratimi i mureve të përdheses ,ky projekt bartet për vitin 2013	
Outputet / Përfitimet	Banorët e komunës së Kllokotit ku do të përmirësohet gjendja e sigurisë	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	08.10.2012 - 86,707.32 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.N.T'' '' Polluzha-m'' Drenas	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	58,327.50 €	



Komuna	OBILIQ	
Titulli i projektit	““Vazhdim i ndërtimit të rrjetit të kanalizimit” Obiliq	
Përshkrimi projektit	Punimet:: Identifikimi I trasesë punuese sipas projektit , pastrimi I terenit , hapja dhe mbyllja e kanalit , hapja e trasesë për vendosjen e pusetave , planifikimi I kanalit , shtrirja e rërës nën dhe mbi gypa, vendosja e gypave PE"SN4"Ø 200,punimi dhe vendosja e pusetave dhe konuseve, vendosja e kapakëve të betonit. Këto punime janë kryer njësoj në të gjitha krahët dhe punimet shtesë	
Outputet / Përfitimet	Banorët e komunës së Obiliqit ku do të përmirësohet gjendja sociale dhe e ambientit në këto lokacione	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		24.04.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		95,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		MAPL
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		02.10.2012 - 47,620.24 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		16.11.2012 - 2,400.00 €
Emri i Kontraktuesit		."A&I Group" shpk & " vllëzrit Krasniqi" Gllógoc
Pagesat		
Vlerat e pagesës		50,020.24 €



Komuna	KAÇANIK	
Titulli i projektit	“Asfaltimi I rrugës në fshatin Dubravë - Biçec"	
Përshkrimi projektit	Punimet:është punuar me pastrimin e terenit, matja dhe inçizimi gjeodezik i terenit, gjurmimi, mbushja dhe ngjeshja e planifikimit të trupit të rrugës, punimi i mureve mbrojtëse, hapja e kanaleve të hapura, betonimi i kokave hyrëse dhe dalje të lëshesave, betonimi i urave dhe asfaltimi i rrugës.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e fshatrave Dubravë dhe Biçec të komunës së Kaçanikut ku do të përmirësohen kushtet e infrastrukturës rrugore	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	80,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	4,482.78 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	27.08.2012 - 84,482.78 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	NNT "Eurotrans" Kaçanik	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	80,000.00 €	



Komuna	PRISHTINË	
Titulli i projektit	“Rregullimi i varrezave ortodokse”	
Përshkrimi projektit	Punimet: Fasadimi i objektit , renovimi i kulmit të objektit dhe mbulimi me tjegulla, punimi me kubëza betoni i vendpushimit, vendosja e ulëseve, shpërndarja kabullit dhe vendosja e shtyllave për ndriçim, pastrimi dhe shpërndarja e zhavorrit të bardhë në rrugica dhe për rreth varrezave si dhe mbjellja e pemëve të tipit selvi, rregullimi i rrethojës dhe vendosja e derës hyrëse nga metali.	
Outputet / Përfitimet	Komuniteti serb i komunës së Prishtinës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		70,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		MAPL
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		13.08.2012 - 24,636.95 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		N.N.P “ Area” Kamenicë
Pagesat		
Vlerat e pagesës		24,530.95 €



Komuna	DEÇAN	
Titulli i projektit	" Ndërtimi I rrugës Mehmet Uka "	
Përshkrimi i projektit	Punimi i trasesë, gërmimi i dheut, mbushja me material guror, shtrirja e zhavorrit dhe ngjeshja e tij, punimi rrugës me kubëza betoni, punimi kanalizimit atmosferik dhe fekal. Me këtë projekt është bërë eliminimi i ujërave të zeza ilegale pasi që në këtë rrugë është realizuar kanalizimi i ujërave të zeza. Kjo rrugë ka qasje në hyrje dhe në dalje në rrugën magjistrale Deçan-Gjakovë.	
Outputet / Përfitimet	Më ndërtimin e kësaj rruge kanë përfituar qytetaret sepse janë krijuar mundësi për zhvillimin e bizneseve dhe vizita në objekte te trashëgimisë kulturore.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		Qershor 2012
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		70,000.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		223,517.45€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		21.05.2012 293,517.45€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		"Lika Trade" Shpk. - Deçan
Pagesat		
Vlerat e pagesës		70,000.00 €



Komuna	MITROVICË	
Titulli i projektit	“Ndërtimi I rrugës Xhemë Lami”	
Përshkrimi i projektit	Ky projekt përfshin gjurmimin, hapjen e kanalit, vendosjen e gypave për kanalizim atmosferik dhe mbylljen e tij, mbushjen me zhavorr dhe ngjeshjen e tij, shtrirjen e rërës nën kubëza, rregullimin dhe shtruarjen e rrugës me kubëza betoni në qytetin e Mitrovicës.	
Outputet / Përfitimet	Me ndërtimin e kësaj rruge përfitojnë banorët e kësaj ane sepse me realizimin e këtij projekti është përmirësuar infrastruktura rrugore.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	Gusht 2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	24,303.50 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	02.04.2012 - 227.31 €(ç/ për njësi)	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.T.P. „Tropik”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	24,121.90 €	



Komuna	MITROVICË	
Titulli i projektit	"Parkingu I tregut të gjelbër"	
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë krijuar kushte për punësim dhe është rregulluar ambienti pasi që është bërë edhe mbjellja e drunjëve dekorativ si dhe gjelbërimi i ulët që është shumë i nevojshëm për qytetaret.	
Outputet / Përfitimet	Është krijuar një hapësirë e sigurt për qytetarët për të zhvilluar tregëti, mundësi për organizimin e panairove për prodhime bujqësore etj. Nga ky projekt ka përfituar edhe komuniteti rom pasi që kjo hapësirë është në afërsi të mëhallës Rome.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35,400.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	11,266.66 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	28.06.2012	46,666.66€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.N. „Euro ndërtimi" Mitrovicë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	35,400.00 €	



Komuna	MITROVICË	
Titulli i projektit	“Rregullimi i objektit kolmunal”	
Përshkrimi i Projektit	Me këtë projekt janë krijuar kushtet për klimatizim për objektin e kuvendit komunal si dhe krijimi i kushteve më të mira për punë për punëtorët e këtij institucioni. Me kryerjen e këtyre punëve kemi një objekt të kuvendit komunal më të mirë dhe më funksional si dhe janë zvogëluar shpenzimet për ngrohjen e objektit.	
Outputet / Përfitimet	Krijimi i kushteve për punë për punëtorët e këtij institucioni si dhe krijimi i kushteve për të gjithë banorët te cilët kanë nevojë për kryerjen e punëve të ndryshme në ndërtesën e kuvendit komunal.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	64,600.00€	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	26.06.201	50,723.49€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	Shpk "Euro projekt" Skenderaj	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	50,723.49 €	



Komuna	SKENDERAJ	
Titulli i projektit	" Vazhdimi I ndërtimit te objektit te KK Skenderaj"	
Përshkrimi i projektit	Projekti është i tipit B+P+4 i cili përfshin të gjitha fazat e realizimit të punëve deri te faza e përdorimit.	
Outputet / Përfitimet	Me këtë projekt do të përfitojnë qytetaret në përgjithësi me shërbime kualitative të cilat do të jenë sa më afër tyre, si dhe punëtorët do te kenë kushte më të mira për pune.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		Qershor 2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		235,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		22.09.2009 1,840,157.24€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit		NN „Valoni” Skenderaj
Pagesat		
Vlerat e pagesës		235,000.00 €



Komuna	SKENDERAJ	
Titulli i projektit	"Avancimi i qendrës për grumbullimin e bimëve mjekësore"	
Përshkrimi i projektit	Zgjerimi i një qendre për grumbullimin e bimëve mjekësore, sigurimi i një vendi të ri për këtë pikë grumbulluese, ndërtimi i objektit të ri si dhe futja e pajisjeve të reja në qendër për përpunimin dhe iniciimin e kulturave të reja për kultivim.	
Outputet / Përfitimet	Me këtë projekt perfitojnë banorët e komunës së Skenderajit sepse do të krijohen rreth 40 vende të reja pune gjatë sezonës së verës dhe ka mundësi permanente të zgjerimit të punësimit pasi që është veprimtari në ngritje.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.03.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	64,450.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	14,066.50 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	14.06.2012	78,516.50€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës	06.11.2012	
Emri i Kontraktuesit	„Euro projekt” Shpk - Skenderaj	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	64,450.00 €	



Komuna	VUSHTRRI	
Titulli i projektit	“Asfaltimi i rrugës Pasom-Rashan”	
Përshkrimi i Projektit	Është projekt regional që ndërlidh dy komunat (Asfaltimin e rrugës Pasom(Vushtrri) - Reshan(Mitrovicë). Rruga ka gjatësi L=2.100 m, gjerësi b=5.30 m dhe nuk prek pronat private.	
Outputet/ Përfitimet	Me këtë përfitojnë banorët e Vushtrrisë dhe Mitrovicës sepse është projekt regional që ndërlidh dy komunat duke krijuar mundësi për turizëm dhe nxit bujqësinë në fshatrat e Shalës së Bajgores.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.03.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	95,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	70,727.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	01.08.2012	165,727.00€
Data e nënshkrimit dhe vlera e Aneks Kontratës		
Emri i Kontraktuesit	„Jehona” Shpk – Malishevë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	95,000.00 €	



Komuna	SUHAREKË	
Titulli i projektit	"Ndërtimi I stadiumit të qytetit - faza e I-rë"	
Përshkrimi projektit	Stadiumi është ndërtuar në fshatin Mushtisht. Stadiumi do të ketë kapacitete të mjaftueshme për shumë shikues. Në këtë fazë të projektit janë përfshirë punët pregaditore, të dheut, drenazhimit, punët e ujitjes së fushës, bari, tribunat, zhveshtoret dhe rrethojat.	
Outputet / Përfitimet	Përfiton një numër i konsiderueshëm I klubeve sportive si dhe qytetaret e Suharekës dhe Mushtishtit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.10.2012	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	120.000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	27.07.2012 - 83,433.50 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	26.11.2012 - 34,962.50 €	
Emri i Kontraktuesit	NBT ING – Suharekë; Kosova Eruptiv	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	98,310.65 €	



Komuna	FERIZAJ	
Titulli i projektit	"Hortikultura- Gjellbërimi i hapësirave të reja në qytet"	
Përshkrimi projektit	Ky projekt përfshin: rregullimin dhe plotësimin e disa hapësirave në qytet me kubëza betoni si dhe gjellbërimin e hapësirave me mbjellje të fidaneve.	
Outputet/ Përfitimet	Ngritja e standartit dhe mirëqenjes së banoreve të kësaj rruge ,qarkullim i lirshëm dhe i sigurt për këmbesoret dhe ambient i gjellbëruar.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35,400.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	39,423.69 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	19.09.2012 - 76,304.34 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	N.SH.P. Ideali-Ferizaj	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	35,400.00 €	



Komuna	FERIZAJ	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në fshatin Zaskok deri në Pleshinë	
Përshkrimi projektit	Projekti ka përfshirë asfaltimin e kësaj rruge në gjerësi prej 5m dhe në trashësi 7 cm. Gjatësia e rrugës është 1930m. Është bërë kryerja e rrugës, nivelizimi pastaj shtruarja me tampon 0.63 në trashësi prej 20cm., shtruarja me tampon	
Outputet/ Përfitimet	Ngritja e standardit të jetesës së qytetarëve ,përmirësimi në infrastrukturë, mbrojtja e mjedisit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	11.06.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	80,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	20,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	01.10.2012 -199.837,60 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	KNPSH “Papenburg & Adriani company”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	80,000.00 €	



Komuna	HANI I ELEZIT	
Titulli i projektit	“Asfaltimi i rrugës lagja e re-Pustenik”	
Përshkrimi projektit	Kjo rrugë është ndërkomunale që ndërlidhë fshatrat Pustenik-Kotline-Laç. Projekti është realizuar në pjesën lindore. Është bërë përgaditja e terrenit gjurmimi , mbushja dhe ngjeshja e trases. Ky projekt është dyvjeçar.	
Outputet/ Përfitimet	Përfitojn banoret e kësaj ane një infrastrukturë e cila do të shërbejë në të ardhmen edhe për zhvillim të turizmit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	120,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	170,000.00 €(Komuna dhe Min Infrac)	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	17.08.2012 - 492,994.62 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	NNT“Eurotrans”-Kaçanik	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	120,000.00 €	



Komuna	HANI I ELEZIT	
Titulli i projektit	Shtrimi me kubeza betoni të rrugës në fshatin Krivenik	
Përshkrimi projektit	Rruga është e gjatë 540m' ka gjerësi 3 metra +2x0.50m bankinat, me kubëza betoni me trashësi 8cm, dhe skajore 18x24 cm, gjithashtu pjesë e projektit është edhe një mur mbrojtës afër 7m gjatësi.	
Outputet/ Përfitimet	Perfitojnë banorët e kësaj ane një infrastrukturë e cila do të shërbej në të ardhmen për qarkullim të lirë të qytetarëve	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		05.10.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		21,925.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		22.11.2012 - 28,675.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		/
Emri i Kontraktuesit		NNP. "Prespektiva"
Pagesat		
Vlerat e pagesës		21,925.00 €



Komuna	KOLLOKT	
Titulli i projektit	“Furnizimi me inventar për komunën e Klllokotit”	
Përshkrimi projektit	Objekti i ri komunal është furnizuar me inventar për zyra, (tavolina,karrige,dollapë, sirtar) të cilat janë të nevojshme për punë në këtë administratë komunale.	
Outputet/ Përfitimet	Perfitues janë punetorët e administratës komunale.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	20.09.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	/	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	5.12. 2012 - 29,330.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	NTP” Metali” Pozharan,Viti	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	29,330.00 €	



Komuna	GJAKOVË	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i parkut në qendër të qytetit”	
Përshkrimi projektit	Ky projekt përfshin: rinatyrizimin, rigjelbrimin e hapësirave të gjelbërta të parkut, renovimi i ulëseve ekzistuese, rregullimi i fontanave, rregullimi dhe plotësimi me pllakëzim të shesheve në park, pllakëzimi i shtigjeve ekzistuese, ndriçimi publik i parkut dhe lodrat për fëmijë.	
Outputet/ Përfitimet	Me ndërtimin e parkut, qyteti i Gjakovës do të ketë një pamje shumë më të bukur, qytetarët do të kenë një qendër të qytetit ku mund të kalojnë kohën e lirë, pastërtia e qytetit do të jetë më e lartë, do të ketë më pak pluhur dhe mirëmbajtja e parkut do të jetë më e lehtë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	27.06.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	80,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	72,844.60 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	24.10.2012 - 61,536.40 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	24.12.2012 – 25,741.70 €	
Emri i Kontraktuesit	NMIQ “Montkomerce” Gjakovë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	16,000.00 €	



Komuna	PARTESH	
Titulli i projektit	"Ndërtimi I qendrës rajonale të kulturës në komunën e	
Përshkrimi projektit	Është bërë vazhdimi i punimeve nga viti i kaluar ku janë përfshirë punimet finale si : vendosja e dyerve dhe dritareve, suvatimi , dyshemetë , instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, elektrika dhe nxehja.	
Outputet/ Përfitimet	Krijimi i kushteve normale që të rinjtë të kenë mundësi të shprehin talentin e tyre për aktivitetet kulturore dhe për zhvillimin e aktiviteteve të lira. Përveç kësaj do të përfitonin edhe qytetarë të tjerë të cilët do të kenë rastin të përcjellin spektakle të ndryshme nga aktivitetet kulturore të të rinjëve.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.04.2011
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		300,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		150,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		20.06.2011 - 899,877.89 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		/
Emri i Kontraktuesit		ShPK "Conex Group"
Pagesat		
Vlerat e pagesës		300,000.00€



Komuna	RAHOVEC	
Titulli i projektit	" Ndërtimi I objektit të AMF dhe rrethimi i oborrit të AMF-së ne fshatin Xerxë "	
Përshkrimi projektit	Konstrukcioni i objektit është sistem skeletor me themele shiritor, shtylla trarë dhe pllaka BA d=15cm. Muret e jashtme janë prej blloqeve të argjilit riter me trashësi d=25cm, termoizolim URSA d=8cm. Muret e brendshme janë prej konstrukcioni knauf me nga dy shtresa dhe termoizolim në mes.	
Outputet / Përfitimet	Mjekësia familjare është formë themelore e ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse shëndetësore në nivelin parësor të kujdesit shëndetësor dhe pas përfundimit të këtij projekti banorët do të kenë shërbime shëndetësore më të mira .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24/04/2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	06.11.2012	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	45,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Rahovecit	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	30/07/2012 84,228.65 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	39,228.65	
Emri i Kontraktuesit	" N.N.P Ndërtimi"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	45,000.00 €	



Komuna	KAMENICË	
Titulli i projektit	“Rikonstruimi i parkut në Muçivercë”	
Përshkrimi projektit	Parku përfshin një sipërfaqe prej 6400 m2 në të cilën duhet të kryhen punët e parapara në projekt si : gjelbërimi i sipërfaqes (mbjellja e fidanëve dhe drunjve të ultë, drunj gjethërënës dhe bimë të ndryshme zbukuruese) shteg të trotuareve, ulëse dhe rrethoja të parkut.	
Outputet / Përfitimet	Plotësimi i nevojave rekreative të banorëve të lokalitetit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	09.07.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	07.11.2012	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	19,700.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	7,014.80 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Kamenicës	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	17.10.2012 26,714.80 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“ Arch-Ndërtimi” Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	19,700.00 €	



Komuna	PODUJEVË	
Titulli i projektit	" Rregullimi I shtratit të lumit Llap"	
Përshkrimi projektit	Zgjerimi i shtratit të lumit, shembja dhe eliminimi i strukturave të ndryshme ekzistuese, mbushja e pjerrësirave për rregullimin e vijës së shtratit të lumit në gjatuesin e tij, betonimin e pllakave të bregut, veshja me gur.	
Outputet/ Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti qytetarët e komunës do të kenë një ambient më të pastërt dhe do të bëhet evitimi i vërshimeve. Gjithashtu do të jetë një hapsirë e bukur ku qytetarët do të mund ta shfrytzojnë për pushim dhe rekreacion.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	27.06.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	06.11.2012	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	70,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	77,372.20 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Podujevës	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	09.08.2012 147,372.20 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.N.T “ Bini ”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	70,000.00 €	



Komuna	RAHOVEC	
Titulli i projektit	Ndriçimi publik në Hoqë të Madhe	
Përshkrimi projektit	Ky projekt është bërë duke konsideruar ndërtimin komplet të shtyllave dhe instalimeve. Ato janë sisteme ekologjike të ndriçimit të rrugës.	
Outputet/ Përfitimet	Pas përfundimit të këtij projekti do të kemi ndriçim publik dhe siguri më të madhe për qytetarët.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.05.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.08.2012	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	3,500.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	02.10.2012	3,494.70 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	NPN "TEKNIKA PROJKT COMPANY " Suharekë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	3,494.70 €	



Komuna	PRIZREN	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i pikave grumbulluese dhe furnizimi me kontejner”	
Përshkrimi projektit	Është bërë furnizimi me kontejner ku do te plotësohen numri i nevojshëm nëpër të gjitha pikat si dhe do të ndërtohen pikat grumbulluese sipas standardeve evropiane.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitojë qytetarët e Prizrenit ku do tu krijohet ambient me i pastër dhe i shëndetshëm.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	27.06.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	06.11.2012	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	70,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	63,362.50 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Prizrenit	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	29.10.2012	133,362.50 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“Metal-Viti”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	70,000.00 €	




Komuna	RAHOVEC	
Titulli i projektit	“Rregullimi i sheshit në Hoqë të Madhe”	
Përshkrimi projektit	Parku përfshin një sipërfaqe në të cilin janë kryer punët e parapara në projekt si : gjelbërimi i sipërfaqes (mbjellja e fidanëve dhe drunjve të ulët, drunj gjethrënës dhe bimë të ndryshme zbukuruese) shtegje të trotuareve, ulëse dhe rrethoja të parkut.	
Outputet / Përfitimet	Plotësimi i nevojave rekreative të banorëve të këtij lokaliteti	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.05.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.08.2012	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	8,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Rahovecit	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	04.10.2012 7,997.80 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	NTSH. INCOM-N – Rahovec	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	7,997.80 €	



Komuna	DRAGASH	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i kanalizimit në fshatin KUK”	
Përshkrimi projektit	Është punuar në rregullimin e kanalizimit fekale, hapja e kanalit, shpërndarja e rërës nën dhe mbi gypa, shtrirja e gypave , ndërtimi i pusetave dhe kokave me kapak të pusetave, mbyllja e kanalit dhe rrafshimi i terenit.	
Outputet/ Përfitimet	Rritje e mirëqenjes sociale të komunitetit .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	14.08.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	18 508,90 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	/	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	29.10.2012. vl. 8 114,50 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	05.12.2012. vl. 9 975,40 €	
Emri i Kontraktuesit	Sh.p.k. “ I.SEFERI” Suharekë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	18 089,90 €	



Komuna	GJILAN	
Titulli i projektit	“Rregullimi i shtratit te lumit Baja ”	
Përshkrimi projektit	Ky projekt është projekt i vazhduar nga viti paraprak 2011, Lumi Baja, historikisht paraqet hapësirën rreth të cilës është zhvilluar qytetit i Gjilanit. Ky projekt përfshinë: rregullimin dhe largimin e derdhjeve të ujërave të zeza dhe rregullimin e ujërave atmosferik, sigurimi nga vërshimet, rregullimi i hapësirës gjelbëruese në bregun e lumit.	
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë banorët e Gjilanit problemet me të cilat ballafaqohet komuna do të jenë më të vogla, njëherit do të krijohen kushte më të mira për të gjitha komunitetet.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22/04/2011
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		57 131.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		08.09.2011 vl. 216 740,45 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		/
Emri i Kontraktuesit		N.N.T.”ART PROJEKT” Viti
Pagesat		
Vlerat e pagesës		57 131,00 €

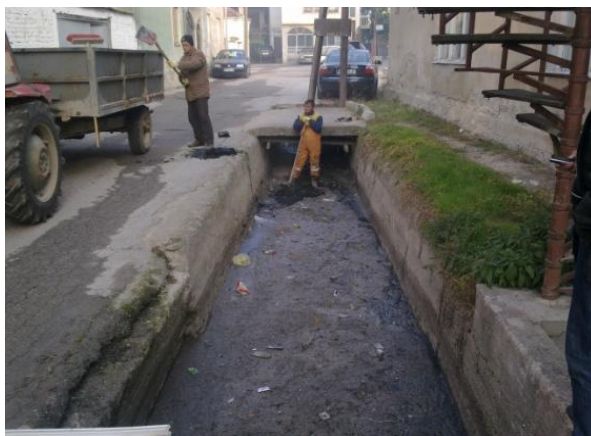

Komuna	GJILAN	
Titulli i projektit	“Rregullimi i infrastrukturës ne fshatin Shillove ”	
Përshkrimi projektit	Projekti: është punuar,ingjizimi gjeodezik i trupit te rrugës,gërmimi,rrafshimi,mbushja me matriale granullor,mbushja me zhavor 0-63,0-31 dhe 0-8 mm,punimi i trotuarit me kubza betoni,kanalizimi atmosferik,vendosja e skajoreve dhe asfaltimi i rrugës në dy shtresa.	
Outputet/ Përfitimet	Rritje e mirëqenjes sociale e komunitetit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22/03/2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	95 575.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	/	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	11.04.2012. vl.89 106,21 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	N.N.T.”EURO TRANS”Gjilan	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	89 106,21 €	



Komuna	GJILAN	
Titulli i projektit	“ Rregullimi i rrjetit te ujësjellesit ne fshatin Kmetoc”	
Përshkrimi projektit	Projekti: është punuar,hapja e kanalit,instalimi i shiritit sinjalizus,shtrirja e rërës nën dhe mbi gypa,shtrirja e gypit,mbulimi i kanalit,punimi i pusetave me të gjitha pjesët fazonike,punimi i pjesëve te rrugës së dëmtuar si dhe trotuaret.	
Outputet / Përfitimet	Përmirësim i kushteve jetesore dhe rritje e mirëqenjes sociale.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	11.09.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	23 000,00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	19.07.2012, vl.56 295,04 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	KNTSH “TEUTA-M” Gjilan	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	23 000,00 €	



Komuna	ISTOG	
Titulli i projektit	“Renovim i ndertesës se kuvendit”	
Përshkrimi projektit	Realizimi i punimeve në këtë projekt ka bërë sigurimin e hapësirës për akomodim të zyrtarëve komunal dhe asamblenë komunale,është punuar në riparimin e kulmit, ndriçimi dhe zërimi i sallës së asamblesë komunale, është bërë ndriçimi i jashtëm dhe rregullimi i jashtëm i hapësirave gjelbëruese, renovimi i fasadës së jashtme, renovimi i korridoreve, instalimi i rrjetit të internetit , izolimi termik i objektit dhe mobilimi i zyrave.	
Outputet/ Përfitimet	Me këtë projekt ka përfitu komuniteti i kësaj komune në kontekst të rritjes së efikasitetit dhe kualitetit te shërbimeve .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	80 000,00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	17 157,10 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	26.06.2012 me vl. 97 175,10 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	Termo-Montimi” - Prishtine	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	80 000,00 €	



Komuna	MALISHEVË	
Titulli i projektit	“Rrjeti i kanalizimit ne fshatin Senik dhe Drenoc”	
Përshkrimi projektit	Është punuar në rregullimin e kanalizimit fekale, hapja e kanalit, shpërndarja e rërës nën dhe mbi gypa të polietilenit Ø 300, shtrirja e gypave , ndërtimi i pusetave dhe kokave me kapak të pusetave, mbyllja e kanalit dhe rrafshimi i terenit përgjatë gjithë gjatësisë së rrugës.	
Outputet / Përfitimet	Përmirësimi i kushteve jetësore për komunitetin.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	23/06/2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	70 000,00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	/	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	05.09.2012 v1. 123 930,00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	BURIMI” Malisheve	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	69 999,48 €	



Komuna	NOVOBËRDË	
Titulli i projektit	“Furnizimi me inventar për objektin e administratës”	
Përshkrimi projektit	Furnizimi me nomenklaturë dhe llojet e nevojshme të inventarit të kërkuar me projekt.	
Outputet/ Përfitimet	Përmirësim i kushteve për punë më efektive dhe kualitative të shërbyesve civil e me këtë përmirësimi i shërbimeve për komunitetin.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	20.09.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30 000,00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	/	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	10.12.2012. vl. 23 956,00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i Kontraktuesit	Sh.p.k. “GRANITI”-Suharekë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	23 956,00 €	



Komuna	NOVOBËRDË	
Titulli i projektit	“Rregullimi i objektit të administratës ”	
Përshkrimi projektit	Është punuar në punimet e muratimit, gjetimi dhe ngjyrosja e mureve, ngjyrosje me ngjyrë yndyrore, punimet e dyshemesë me nivelizim, shtruarja e laminatit, pllakave të qeramikës, punimet e betonit,vendosja e dyerve dhe dritareve, punimi i llamarinës, gardhit të shkallëve, punimi i fasadës, instalimet elektrike, internetit dhe telefonisë, sinjalizimi kundër zjarrit, hidroinstalimet dhe instalimet makinerike.	
Outputet/ Përfitimet	Me këtë projekt përfiton komuniteti i kësaj komune në aspektin e rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24/04/2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100 000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	07.08.2012 me vl. 97 077,98 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	Mak Building” nga Vushtria	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	89 474,26 €	



Komuna	PEJË
Titulli i projektit	“ Ndërtimi i kanalizimit fekale rrethi Vitomirice-Qyshk”
Përshkrimi projektit	Projekti i kanalizimit ka një gjatësi prej 1,650 m’ ku është punuar hapja e kanalit, shpërndarja e rërës nën dhe mbi gypa, shtrirja e gypave Ø 400 mm, Ø 500 mm dhe gypave Ø600 mm, punimi i pusëve me konese dhe kapak të betonit, mbulimi i kanalit dhe rrafshimi i tij.
Outputet/ Përfitimet	Ritje e mirëqenjes sociale të komunitetit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	27.06.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	88,000,00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	05.10.2012. v.l. 185,105,87 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/
Emri i Kontraktuesit	NN“VALA”& shpk.“PIRAMIDA III “ Peje
Pagesat	
Vlerat e pagesës	88,000,00 €




Komuna	GRACANICË	
Titulli i projektit	“Rikonstruimi dhe ndertimi i rrugë Laplje Selo-Qaglavica-Faza I”	
Pershkrimi i projektit	Në kuadër të projektit është bërë rikonstruimi i rrjetit të tanishëm të konstruksionit rrugor dhe kemi fituar një rrugë moderne me infrastrukturë gjërsia B=5,50m. Rruga përmban gjithashtu edhe shtegun për këmbësor.	
Outputi/ Përfitimet	Me rikonstruim është bërë më kualitative lidhja mes dy vendeve , siguria më e madhe në trafik. Para së gjithash kjo rruge e rikonstruktuar kalon në qendër të fshatit Laplje Selo, në mes të spitalit dhe shkollës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		24.04.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		120,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka		100,000.00 €
Kontrata		
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit te kontratës se vlerës		12.06.2012 175,312.30 €
Data e nënshkrimit te vlerës së aneks kontratës		/
Emri i kontraktuesit		SH.P.K”EUROPA PARTNERS”
Pagesat		
Vlera e pagesës		120,000.00 €



Komuna	GRACANICË	
Titulli i projektit	“Rikonstruimi dhe ndërtimi i rrugës Laplje Selo-Qaglavica-Faza II”	
Pershkrimi i projektit	Në kuadër të këtij projekti është bërë rikonstruimi i trakës së dëmtuar të rrugës,për ta fituar një rrugë moderne, me gjërsi prej B=5,50m duke përfshirë edhe shtegun për këmbësor të një standarti të lartë.	
Outputi/ Përfitimet	Me Rikonstruim është bërë lidhja kualitative e dy lagjeve, përmirësimi në shumë nivele,sidomos siguri në trafik ,ritja e qarkullimit dhe mundësia më e madhe e zhvillimit komercial në tërë zonën.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	27.06.2012	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	80,000.00 €	
Vlera e bashkëfincnimit nga komuna / nëse ka	20,960.10 €	
Kontrata		
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkimit dhe vlera e kontratës	21.08.2012 93,790.12 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i kontraktuesit	SH.P.K”CONEX GROUP”	
Pagesat		
Vlera e pagesës	80,000.00 €	



Komuna	GRACANICË	
Titulli i projektit	“Furnizimi me inventar për komunën e Graçanicës”	
Pershkrimi i projektit	Eshtë siguruar Inventari për zyra në objektin e komunës i cili ka qenë i nevojshem për punë dhe funksionim të komunës.	
Output/ Përfitimet	Sigurimi i inventarit për zyra i nevojshëm për pune dhe fukcionim të punësuarve në komunë për shërbime më të mira për qytetarët .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit	20.09.2012	
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Vlera Totale e siguruar nga MAPL	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka	/	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	18.12.2012 29,650.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i kontraktuesit	N.N.P “STANDARD PLUS” - MALISHEVË	
Pagesat		
Vlera e pagesës	29,650.00 €	

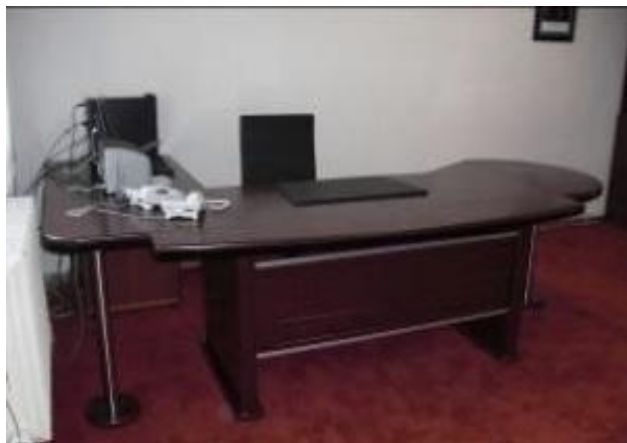

Komuna	RANILLUG	
Titulli i projektit	“Furnizimi me inventarë për komunën Ranillug”	
Pershkrimi i projektit	Inventari është siguruar sipas nevojës për kompletimin e zyrave me tavolina, karriga, dollape etj.	
Output/ Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti përmirsohen kushtet e punës të punësuarve në komunë,dhe përmirësimi i shërbimeve komunale.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		20.09.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		20,000.00 €
Vlera e bashkefinancimit nga komuna / nese ka		/
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		11.12.2012 22,000.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		/
Emri i kontraktuesit		NTP” Eurometali” – Gjilane
Pagesat		
Vlera e pagesës		20,000.00 €



Komuna	SHTËRPCE	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe trotuarit në Shtërpce”	
Pershkrimi i projektit	Në qendër të Shtërpces me realizimin e këtij projekti më lehtë shfrytëzohet trotuari për këmbësor, janë larguar makinat nga trotuaret në qendër të qytetit ,që ka ndiku në zhvillimin e biznesit.Afër trotuarit me realizimin e këtij projekti është përmirësuar mbledhja e ujit atmosferik në rrugën kryesore.	
Output/ Përfitimet	Me realizimin e projektit të ndërtimit të kanalizimit atmosferik dhe trotuarit është përmirësuar mjedisi jetësor,kualiteti i jetës dhe lëvizja me e lirë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit	24.04.2012	
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	110,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	11,116.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	25.06.2012 115,996.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i kontraktuesit	“LINDA” SHPK-Ferizaj	
Pagesa		
Vlera e pagesës	110,000.00 €	



Komuna	SHTËRPCE	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i kanalizimit dhe asfaltimi i rrugës në Brezovicë	
Pershkrimi i projektit	Në këtë projekt është ndërtuar një pjesë e kanalizimit fekale e cila kalon përmes f. Blatestica në Brezovicë, ky kanalizim deri tash është derdhë në lumin Lepenc.Një pjesë e kanalizimit është derdhë në fusha të hapura ku ka ndikuar në përhapjen e sëmundjeve të ndryshme.	
Outputi/ Përfitimet	Ky projekt ka ndikuar në kualitetin e jetës, të biznesit, zvogëlimin e ndotjes së mjedisit si për qytetarët e Shtërpces dhe vizitorët.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit	27.06.2012	
Data e nënshkrimit te aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	74,031.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	/	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontatës	22.08.2012	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	31.10.2012 / 4,867.36 €	
Emri i kontraktuesit	NPN “LIRIA”- Bitinja e Eperme	
Pagesat		
Vlera e pagesës	54,594.36 €	



Komuna	GRAÇANICË	
Titulli i projektit	“Qendra e zanateve dhe tregtisë në komunën e Graçanicës”	
Pershkrimi i projektit	Eshtë bërë ndërtimi i lokaleve (dyqane tregtare). Ketu jane perfshire punet me llamarinë,punët në mbulimin e kulmit, izolimi dhe mallterimi.	
Outputi/ Përfitimet	Me këtë projekt do te permirsohet lëvizja e mallit dhe shërbimeve , qytetarëve(klijentëve), përmirsim i kualitetit të shit-blerjes.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit	26.09.2012	
Data e nënshkrimit te aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	23,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	9,822.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	14.11.2012 32,822.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës	/	
Emri i kontraktuesit	PP “IZOL PROMET MF”Graçanicë	
Pagesat		
Vlera e pagesës	23,000.00 €	



Komuna	GRAQANICË - LIPJAN	
Titulli i projektit	"Ndërtimi I rrugës Dobratin- Sllovijë"	
Përshkrimi projektit	Punimet: inçizimi, piketimi I terenit,heqja e asfaltit të vjetër,zgjerimi i rrugës, rrafshimi I terenit,betonimi i murit mbrojtës,punimi i lëshesave dhe vendosja e gypave të betonit , shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-60 mm ,tamponit 0-30 mm dhe tamponit 0-8 mm dhe ngjeshja e tij si dhe shtrirja e asfaltit në dy shtresa 7+4 cm, janë bërë të gjitha shqyrtimet e duhura sipas standardeve.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e fshatit Dobratin të komunës së Graçanicës dhe banorët e fshatit Sllovij të komunës së Lipjanit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.03.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	.	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	90,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	09.07.2012 - 74,121.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N .N .T "ABC" Podujevë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	74,121.00 €	



Komuna	JUNIK - GJAKOVË	
Titulli i projektit	Rregullimi i parkut në brigjet përgjatë shtratit te lumit Erenik"	
Përshkrimi projektit	Punimet: pastrimi, gjërmimi, përgatitja , rrafshimi dhe planifikimi terrenit, shpërndarja e kabullit elektrik, shtrirja e humusit dhe mbjellja barit gjelbërimit, luleve dhe fidanëve drusore, punimi i tamponi vendosja e kubëzave nga betoni , rregullimi i mureve nga betoni për vazo, vendosja e skajoreve si dhe elemente montuese siç janë karrige shtyllat elektrike , shportat.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e komunës së Junikut dhe banorët e komunës së Gjakovës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.03.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	45,925.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	25.06.2012- 27,732.25 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N.T.p" Fidani-I" Deçan&Sh.P.K " Accord Investments-Sah" Prishtinë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	28,707,25 €	



Komuna	VITI - KLLOKOT	
Titulli i projektit	" Ndërtimi i trotuarit Klllokot - Radivojc""	
Përshkrimi projektit	Eshtë punuar në gjurmimin e kanalit atmosferik ku janë vendosur gypat dhe është bërë nivelizimi I kanalit, shtruarja e tamponit për vendosjen e kubëzave , vendosja e kubëzave, rregullimi i lëshesave dhe zgjerimi i urave, vendosja e skajoreve, ngritja e pusëve , vendosja e mbrojtëseve dhe të gjitha punimet tjera percjellese.	
Outputet / Përfitimet	Banorët e fshatit Radivijcë të komunës së Klllokotit dhe banorët e fshatatrave të komunës së Vitisë	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		22.03.2012
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		75,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		3,731.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		MAPL
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		13.07.2012- 78,731.40 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		"Magjistranja" sh.p.k Gjilan
Pagesat		
Vlerat e pagesës		74,488.25 €



Komuna	SHTËRPCE - FERIZAJ	
Titulli i projektit	“Instalimi elektronik I parkingut ne qendrën sportive ne Shterpçë”	
Përshkrimi projektit	Gërmimi i kanalit për shpërndarjen e kabullit elektrik, shtrirja e kabullit , ndërtimi i bazamentit për vendosjen e kabinës dhe instalimeve elektronike, asfaltimi i pjesës së rrugës, instalimi elektronik i pajisjeve .	
Outputet / Përfitimet	Banorët e komunës së Shterpçës dhe banorët e komunës së Ferizajit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.03.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	.	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	27.08.2012- 33,600.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	N. .SHT "Ekoinvest”Prishtinë	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	33,600.00 €	



Komuna	PRIZREN - DRAGASH - MAMUSH	
Titulli i projektit	"Krijimi I kushteve për zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjes së ambientit nëpërmes ndërtimit të vend piknikeve në komunat: Prizren, Dragash dhe Mamushë"	
Përshkrimi projektit	Punimet: janë kryer të gjitha punimet në bazë betoni vendosur shtëpiza prej druri me të gjitha elementet përcjellëse , janë vendosur tavolinat dhe elemente të parafabrikuara , skarat dhe shportat e mbeturinave në tri lokacionet	
Outputet / Përfitimet	Banorët e komunës së Prizrenit, Dragashit dhe Mamushës ku do të përmirësohen kushtet për pushim dhe rekracion	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.03.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	.	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	89,850.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	21.06.2012 - 59,951.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Multi Business Group" sh.p.k &Renault Tahiri" shpk , Prizren	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	58,722.00 €	



Komuna	RAHOVEC- SUHAREKË MALISHEVË	
Titulli i projektit	"Krijimi I kushteve për zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjes së ambientit nëpërmes ndërtimit të vend pikniqeve në komunat : Rahovec, Suharekë dhe Malishevë"	
Përshkrimi projektit	Punimet: janë kryer të gjitha punimet në bazë betoni vendosur shtëpiza prej druri me të gjitha elementet përcjellëse , janë vendosur tavolinat dhe elemente të parafabrikuara , skarat dhe shportat e mbeturinave dhe këndi i lojërave në tri lokacionet	
Outputet/ Përfitimet	Banorët e komunës së Rahovecit, Suharekës dhe Malishevës ku do të përmirësohen kushtet për pushim dhe rekracion	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.03.2012	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	.	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	89,850.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	22.06.2012 - 54,209.00€	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		
Pagesat		
Vlerat e pagesës	51,986.43 €	



Komuna	ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE	
Titulli i projektit	Furnizim me gjenerator	
Përshkrimi projektit	Ky furnizim do të sigurojë vazhdimin e punës së administratës së ZAMV-së me qëllim të kryerjes së obligimeve zyrtare, gjithashtu do të arrihet efikasiteti në punë duke mbuluar tërë hapësirën.	
Outputet / Përfitimet	Shërbime të vazhdueshme për qytetarët	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	9,480.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	09.07.2012 9,480.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“Auto Grezda”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	9,480.00 €	



Komuna	ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE	
Titulli i projektit	Furnizim me detektor	
Përshkrimi projektit	Ky furnizim do të ofroj siguri dhe kontroll më të madh për personelin e Zyrës Administrative të Mitrovicës Veriore me qëllim të kryerjes së obligimeve zyrtare, dhe arritjes së efikasitetit në punë	
Outputet / Përfitimet	Zyrtarët e ZAMV do të kenë një ambient më të sigurt të punës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	7,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	30.07.2012	6,440.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“ Logic System”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	6,440.00 €	



Komuna	ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE	
Titulli i projektit	Blerja e veturave për ZAMV	
Përshkrimi projektit	Ky furnizim do të plotësoj mungesën e veturave në ZAMV i cili do të mundësoj transportin e personelit me qëllim të kryerjes së obligimeve zyrtare, gjithashtu do të arrihet efikasiteti në punë duke mbuluar tërë hapësirën e territorit të Kosovës.	
Outputet / Përfitimet	Krijohen kushteve normale për punë për personelin e ZAMV-së	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		30,020.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		MAPL
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës		20.12.2012 27,980.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit		“Hyundai Auto”
Pagesat		
Vlerat e pagesës		27,980.00 €



Komuna	MAPL	
Titulli i projektit	Pajisje për IT - MAPL	
Përshkrimi projektit	Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative ka ndihmuar në punën e stafit për të kryer detyrat dhe obligimet ligjore	
Outputet/ Përfitimet	Rritja e efikasitetit në kryerjen e detyrave nga ana zyrtarëve	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00€	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	(Kontrat në tri Lote) 49,050.03 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	Furnizimi nga tre furnitor	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	49,050.03 €	



Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2012

Komuna	Nr I proj.	Emri i projektit	Kodi I projektit	Fondi	Financimi	Vlera e kontrates	Procedurat e prokurimit	Pagesat
Shtime	1	Rregullimi I shtratit të lumit në Shtime, faza e I-të (vazhdim)	13301	IPA	49,800.00	49,800.00	Komuna	49,734.93
	2	Zgjerimi dhe pastrimi I shtratit të lumit në Shtime, faza e II-të	13302	IPA	60,000.00	88,900.00	Komuna	60,000.00
Graçanicë	3	Rikonstruimi I rrugës permes Llaple Sello -prej spitalit kah Çagllavica	13309	IPA	120,000.00	175,312.30	Komuna	120,000.00
Gjilan	4	Ndertimi I rruges ne Shillove Faza II	13312	IPA	95,575.00	89,106.21	Komuna	89,106.21
	5	Rregullimi i shtratit të lumit Baja	12929	GS	57,131.00	57,131.00	Komuna	57,131.00
Partesh	6	Ndërtimi i Qendrës rajonale të kulturës	13313	IPA	300,000.00	300,000.00	Komuna	300,000.00
Deçan	7	Ndërtimi I rrugës "Mehmet Uka " Deçan	13418	GS	70,000.00	293,517.45	Komuna	70,000.00
Skenderaj	8	Vazhdim I ndertimit te objektit të KK Skenderaj	12918	IPA	235,000.00	235,000.00	Komuna	235,000.00
Mitrovicë	9	Ndertimi I rruges Xheme Lami	13430	GS	24,303.50	24,121.90	Komuna	24,121.90
Istog	10	Renovimi i kulmit të ndërtesës komunale	13317	IPA	80,000.00	97,175.10	Komuna	80,000.00
Malisheva	11	Rrjeti i kanalizimit në fshatrat Senike dhe Drenovc	13410	IPA	70,000.00	123,930.00	Komuna	69,999.48
Shtërpce	12	Ndërtimi I kanalizimit atmosferik dhe trotuarit në lagjen Shtërpce	13318	IPA	110,000.00	115,996.00	Komuna	110,000.00
Rahovec	13	Ndërtimi I objektit të AMF-së dhe rrethimi I oborrit të AMF-së në fshatin Xërxë	13306	IPA	45,000.00	84,228.65	Komuna	45,000.00

	14	Rregullimin e shtratit të lumit "Duhlllo" në Rahovec	13307	IPA	35,000.00	1,137,929.71	Komuna	35,000.00
	15	Ndriqimi publik ne Hoqe te Madhe	13413	GS	3,500.00	3,494.70	Komuna	3,494.70
	16	Rregullimi I parqeve ne Hoqe te Madhe	13414	GS	8,000.00	7,997.80	Komuna	7,997.80
Ferizaj	17	Hortikultura- Gjelbërimi i hapësirave të reja në qytet	13417	GS	35,400.00	76,304.34	Komuna	35,400.00
Dragash	18	Ndertimi I kanalizimit ne fshatin Kuk	13428	GS	18,508.50	18,089.90	Komuna	18,089.90
Lipjan	19	Rikonstruimi dhe zgjerimi I rrugës Lipjan-Silovi	13429	GS	80,000.00	334,959.10	Komuna	80,000.00
Podujevë	20	Rregullimi I shtratit të lumit Llap	12939	GS	70,000.00	147,372.20	Komuna	70,000.00
Ferizaj	21	Asfaltimi I rrugës në fshatin Zaskok deri në Pleshinë	13416	GS	80,000.00	199,837.60	Komuna	80,000.00
Peja	22	Ndërtimi I kanalizimit fekal Rrethi I Vitomiricës - Qyshk	13420	GS	88,000.00	185,105.87	Komuna	88,000.00
Shterpca	23	Ndërtimi I kanalizimit dhe asfaltimi I rrugëve Brezovicë	13412	IPA	74,031.00	54,594.36	Komuna	54,594.36
Viti	24	Furnizimi me inventar	13713	GS	30,000.00	31,900.00	Komuna	30,000.00
Gracanica	25	Rekonstruimi dhe ndërtimi i rrugës Llapnasellë - Çagllavicë	13423	FK	80,000.00	93,790.12	Komuna	80,000.00
Suharekë	26	Ndërtimi I stadiumit të qytetit - faza e I-rë	13303	IPA	120,000.00	118,396.00	Komuna	98,310.65
Mitrovicë	27	Parkingu I Tregut të Gjelbërt	13310	IPA	35,400.00	46,666.66	Komuna	35,400.00

	28	Rregullimi i Objektit Komunal	13311	IPA	64,600.00	50,723.49	Komuna	50,723.49
Novobërdë	29	Rregullimi i objektit të administratës Komunale	13315	IPA	100,000.00	97,077.98	Komuna	89,474.26
Prizren	30	Ndërtimi I pikave grumbulluese dhe furnizimi me kontejner	13411	IPA	70,000.00	133,362.50	Komuna	70,000.00
Fushe-Kosova	31	Ndriçimi solar në Fushë Kosovë	13419	GS	75,000.00	84,253.36	Komuna	75,000.00
Klllokot	32	Furnizimi me inventar	13712	GS	30,000.00	29,330.00	Komuna	29,330.00
Novo Bërdë	33	Furnizimi me inventar	13716	GS	30,000.00	23,956.00	Komuna	23,956.00
Ranillug	34	Furnizimi me inventar	13719	ZHR	20,000.00	22,000.00	Komuna	20,000.00
Hanit të Elezit	35	Shtrimi me kubeza betoni të rrugës në fshatin Krivenik	13720	ZHR	21,925.00	28,675.00	Komuna	21,925.00
Gjilan\	36	Rregullimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Kmetocë	13718	GS	23,000.00		Komuna	23,000.00
Hani I Elezit	37	Asfaltimi I rruges lagja e re-Pustenik	13409	IPA	120,000.00	492,994.62	Komuna	120,000.00
Gracanicë	38	Qendra tregtare e zanatit	13721	ZHR	23,000.00	32,822.00	Komuna	23,000.00
Gracanicë,	39	Furnizimi me inventar	13717	GS	30,000.00	29,650.00	Komuna	29,650.00
Kamenicë	40	Rekonstruimi i parkut në Muçiverc	13421	GS	19,700.00	26,714.80	Komuna	7,502.88

							Komuna	
Kamenicë	41	Furnizimi me inventar	13714	GS	30,000.00	17,457.00		
							Komuna	
Gjakovë	42	Ndërtimi i parkut në qendër të Qytetit	13415	GS	80,000.00	61,536.40		16,000.00
							Komuna	
Partesh	43	Furnizimi me inventar	13715	GS	30,000.00			
Junik	44	Rehabilitimi i rrugëve lokale në Junik	13305	IPA	100,000.00	86,151.00	MAPL	86,151.00
							MAPL	
Obiliq	45	Vazhdim i ndërtimit të rrjetit të kanalizimit	13304	IPA	95,000.00	50,020.24		50,020.24
Kaçanik	46	Asfaltimi I rrugës në fshatin Dubravë - Biçec	13316	IPA	80,000.00	84,482.72	MAPL	80,000.00
							MAPL	
Viti	47	Ndërtimi i trotuarit rrugës dhe pllato në oborrin e shkollës fillore "Njazi Rexhepi" në fshatin Sllatinë e Epërme	13308	IPA	90,000.00	97,304.85		89,221.56
							MAPL	
Kamenicë	48	Trotuari dhe riasfaltimi I rrugës në mes dy rrethrrrotullimeve në Kamenicë	13319	IPA	100,000.00	105,660.00		97,833.97
							MAPL	
Ranillug	49	Asfaltimi i rrugëve kah ndërtesa e re e komunës	13300	IPA	150,000.00	140,653.85		92,405.22
							MAPL	
Klllokot	50	Ndërtimi i Stacionit policor në Klllokot	13314	IPA	100,000.00	86,707.32		58,327.50

ZAMV		51	Furnizim me gjenerator	13424	FK	9,480.00	9,480.00	MAPL	9,480.00
ZAMV		52	Furnizim me detektor	13426	FK	6,440.00	6,440.00	MAPL	6,440.00
ZAMV		53	Blerja e veturave për ZAMV	13722	FK	30,020.00	27,980.00	MAPL	27,980.00
MAPL		54	Paisje per IT - MAPL	13133		100,000.00			49,050.03
MAPL		55	Mirembajtja e portalit ministror ne komuna	12189		38,500.00	32,850.00		18,991.84
MAPL		56	Rregullimi i varrezave ortodokse ne Prishtinë	13422	GS	70,000.00	24,636.95	MAPL	24,530.95
Graçanicë	Lipjan	57	Ndertimi i rrugës Dobratin-Silovi	13297	ZHR	90,000.00	74,121.00	MAPL	74,121.00
Prishtinë	Podujevë-Obiliq	58	Tregu i kombinuar	13289	ZHR	90,000.00	150,695.50	Komuna	90,000.00
Viti	Klllokot	59	Ndërtimi i trotuarit Klllokot - Radivojc	13290	ZHR	75,000.00	78,731.40	MAPL	74,488.25
Junik	Gjakovë	60	Rregullimi i parkut ne brigjet përgjatë shtratit te lumit "Erenik"e kan nje MM këto dy komuna për këtë projekt	13291	ZHR	45,925.00	28,731.25	MAPL	28,707.25
Shtërpçë	Ferizaj	61	Instalimi elektronik I parkingut ne qendrën sportive ne Shtërpçë	13298	ZHR	35,000.00	33,600.00	MAPL	33,600.00
Vushtrri	Mitrovicë	62	Asfaltimi i rrugës Pasom-Reshan	13292	ZHR	95,000.00	165,727.00	Komuna	95,000.00
Pejë	Istog	63	Asfaltimi I rrugës Ruhot-Tuurbohoc-Staradan me gjatesi 1700 m	13296	ZHR	90,000.00	112,400.00	Komuna	90,000.00
Skenderaj	Mitrovicë	64	Avansimi i qendrës për grumbullimin e bimëve mjekësore për komunat Skenderaj dhe Mitrovicë	13293	ZHR	64,450.00	78,516.50	Komuna	64,450.00

Rahovec	Malishevë-Suharekë	65	Krijimi I kushteve për zhvillim e turizmit dhe mbrojtjes se ambientit nepërmes ndërtimit te vend pikniqeve në komunat: Rahovec-Malishevë dhe Suharekë	13294	ZHR	89,850.00	54,209.00	MAPL	51,986.43
Prizren	Dragash-Mamushë	66	Krijimi I kushteve për zhvillim te turizmit dhe mbrojtjes se ambientit nepërmes ndërtimit te vend pikniqeve ne komunat: Prizren -Dragash dhe Mamushë	13295	ZHR	89,850.00	59,951.00	MAPL	58,722.00
Partesh	Gjilan	67	Zhvillimi i bujqësise kushte për zhvillimin ekonomik	13299	ZHR	70,000.00	55,990.00	MAPL	55,990.00
			Gjithsej			4,646,389.00	6,966,249.70	-	4,033,439.80
