



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti i Reformave dhe Integritimeve Evropiane

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2009**

Dhjetor 2009

FJALA HYRESE E MINISTRIT

Të nderuar lexues,

Kosova ka nevojë që të rris kapacitetet e saja në infrastrukturën publike. Në planin afatgjatë edhe procesi i reformës së pushtetit lokal garanton këtë. Natyrisht, procesi është kompleks dhe në këtë drejtim, komunat e Kosovës kanë nevojë për përkrahje që të rrisin kapacitetet inistucionale dhe teknike për të përmisuar kualitetin e shërbimeve për qytetarët.

Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Komuniteti i Donatorëve kanë dhënë një kontribut esencial në këtë drejtim dhe janë plotësisht të përkushtuar që këtë ndihmë ta vazhdojë edhe gjatë viteve të ardhshme.

Raporti që keni në dorë, është vetëm një pjesë e investimeve publike komunale që ka bërë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal gjatë vitit 2009.

Ne shpresojmë që edhe këto investime, do të shtojnë kapacitetet komunale përmes të cilit individët, organizatat dhe gjithë shoqëria mund të kenë, forcojnë dhe mirëmbajnë aftësitë e tyre për të përcaktuar dhe arritur objektivat e tyre zhvillimore përgjatë periudhës së ardhshme kohore, sepse qytetarët tanë kanë nevojë për shërbime më efikase.


Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ka përkrahur komunat me mjete buxhetore për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike dhe po ashtu ne tashmë jemi koordinatori kryesor për nivelin lokal për të orientuar në mënyrën e duhur dhe sipas prioritetve ndihmën e jashtme.

Nga ky raport Ju mund të vëreni se duke punuar bashkë me komunat ne kemi shtuar siperfaqet e parkingjeve dhe gjelbrimeve, kemi godina shëndetësore e shkollore të reja, kemi shtuar kilometrat e gypave të ujit e të rrjetit të kanalizimeve, kemi investuar në digjitalizimin dhe kompjuterizimin e punës në administratat lokale, kemi ndërtuar godina për stafin e administratës komunale dhe tani bilanci është shumë më mirë se vetëm 11 muaj më parë.

Në esencë, këto janë paratë Tuaja që ne po i përdorim, sepse këto investime janë paguar nga taksat e Juaja. Ne jemi përkujdesur që këto të shfrytëzohen me eficiencë dhe aty ku ka më së shumti nevojë.

Prandaj, shpresojmë që duke vazhduar për të punuar bashkarisht, do të rrisim këto kapacitete, për të krijuar një ambient të sigurtë e të prosperuar për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Sadri Ferati
Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal



Përmbajtja:

1. Përmbledhja ekzekutive	5
2. Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve	6
3. Raporti detaj për secilin prej 84 projekteve sipas regjioneve koordinuese	7
3.1 Komuna - Malishevë projekti "Ndërtimi i shk. fillore në fshatin Tërpezë"	7
3.2 Komuna - Pejë projekti "Ndërtimi i rrugës UÇK me 2 Korsi"	8
3.3 Komuna - Pejë projekti "Rregullimi i parkut Kalaja dhe Karagaj"	9
3.4 Komuna - Deçan projekti "Asfaltimi i rrugës në lagjen Gecaj në fshatin Llukë e ulët"	10
3.5 Komuna - Deçan projekti "Rekonstruimi i rrugës qendra e Deçanit- Carrabreg (faza e parë)"	11
3.6 Komuna - Deçan projekti "Asfaltimi i rrugës Irzniq-Kodrall-Pozhar-Llukë e Ulët"	12
3.7 Komuna - Suharekë projekti "Ndërtimi i trotuarit në rrugën Hajdin Berisha- Skenderbeu"	13
3.8 Komuna - Suharekë projekti "Ndërtimi i rrugës Mohlan- Krushicë"	14
3.9 Komuna - Suharekë projekti "Rregullimi i rrugës në fshatin Mushtisht"	15
3.10 Komuna - Suharekë projekti "Vazhdim i rrjetit të kanalizimit në fshatin Doberdolan"	16
3.11 Komuna - Suharekë projekti "Ndërtimi i rrugës Semetisht – Nishor – Faza e II"	17
3.12 Komuna - Istog projekti "Asfaltimi rrugës Suriganë -Cerkolez-Kujavq".	18
3.13 Komuna - Istog projekti "Ndërtimi i kanalizimit në Vrellë- Studenicë"	19
3.14 Komuna - Istog projekti "Asfaltimi dhe kubëzimi i rrugës kopshti i fëmijëve – shkolla-Qendër në Gurakoc"	20
3.15 Komuna - Istog projekti "Asfaltimi i rrugës në qendrën urbane- Banjë"	21
3.16 Komuna - Fushë Kosovë projekti "Asfaltimi i rrugëve lokale në Fushë Kosovë".	22
3.17 Komuna - Junik projektit "Ndërtimi i Objektit të Administratës K. K Junik - Faza I"	23
3.18 Komuna - Zveçan projekti "Ndërtimi i rrjetit elektrik për lagjen Ukaj -Fshati Lipë"	24
3.19 Komuna - Shtime projekti "Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekal dhe rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime"	25
3.20 Komuna - Podujevë projekti "Asfaltimi i rrugës Dumnicë-Llaushë"	26
3.21 Komuna - Podujevë projekti "Asfaltimi i rrugës Letancë – Bajqinë"	27
3.22 Komuna - Prizren projekti "Asfaltimi i rrugës Jashar Salihu Prizren"	28
3.23 Komuna - Prizren projekti "Ndërtimi i zyrës së vendit në fshatin Zhur"	29
3.24 Komuna - Prizren projekti "Pajisje me inventar të qendrës së kulturës në Gjonaj"	30
3.25 Komuna - Prizren projekti "Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi (1,2,3) në Prizren"	31
3.26 Komuna - Rahovec projekti "Kanalizimi fekal në fshatin Çifllak"	32
3.27 Komuna - Rahovec projekti "Meremetimi i ndërtesës së KK- Rahovec"	33
3.28 Komuna - Obiliq projekti "Ndërtimi i kanalizimit fekal në lagjen e re në Milloshevë"	34
3.29 Komuna - Obiliq projekti "Ndërtimi i rrugës në fshatin Sibofc lagja Kelmendi"	35
3.30 Komuna - Obiliq projekti "Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Lulgjak"	36
3.31 Komuna - Obiliq projekti "Sistemi i ujësjellësit në fshatin Sibofc"	37
3.32 Komuna - Glllogoc projekti "Kanalizimi në Glllogar"	38
3.33 Komuna - Glllogoc projekti "Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nekovc"	39
3.34 Komuna - Glllogoc projekti "Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Tërstënik"	40
3.35 Komuna - Lipjan projekti "Rrjeti i ujësjellësit në fshatin Livagjë Dobratinë dhe Konjuh"	41
3.36 Komuna - Prishtinë projekti "Asfaltimi i rrugës në Keqekollë lagja "Spahiu"	42
3.37 Komuna - Prishtinë projekti "Asfaltimi i rrugës Graçanicë-Llappllasellë"	43
3.38 Komuna - Prishtinë projekti "Kultivimi i gjelbërimit në lagjen Ulpiana"	44
3.39 Komuna - Prishtinë projekti "Rregullimi i terrenit sportiv në fshatin Hajvali"	45
3.40 Komuna - Shtërpçë projekti "Rregullimi i ngrohjes, dhe garazheve në ambulancën e mjekësisë familjare në Brod".	46
3.41 Komuna - Ferizaj projekti "Asfaltimi dhe rregullimi i ujësjellësit dhe kanalizimit në fshatrat Blinisht – Zaskok.	47
3.42 Komuna - Hani i Elezit projekti "Asfaltimi i rrugës Përroi i Rrezhancës".	48
3.43 Komuna - Shtërpçë projekti "Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Brod".	49
3.44 Komuna - Novo Bërdë projekti "Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Tërniqec".	50
3.45 Komuna - Kaçanik projektit "Ndërtimi i katit të tretë në objektin KK Kaçanik"	51
3.46 Komuna - Viti projekti "Asfaltimi i rrugës Ramnishtë – Begunc".	52

3.47	Komuna - Shtërpçë projekti "Ndërtimi i objektit shëndetësor në fshatin Brod	53
3.48	Komuna - Mamushë projekti "Ndërtimi i murit mbrojtës përgjatë lumit Topllua"	54
3.49	Komuna - Novo Bërdë projekti "Asfaltimi i rrugës Sallkaj – Abazaj"	55
3.50	Komuna - Kamenicë projekti "Asfaltimi i rrugës në fshatin Drenoc"	56
3.51	Komuna - Novobërdë projekti "Ndërtimi i fushës së sportit në sh.f. Minatori"	57
3.52	Komuna - Kamenicë projekti "Ndërtimi i shkollës dhe ambulancës në Hodec"	58
3.52	Komuna - Kamenicë projekti "Sistemi i Ujësjellësit në fshatin Drenoc"	59
3.53	Komuna - Mitrovicë projekti "Asfaltimi i rrugës Vllada Cvetkoviç në Kodrën e Minatorëve"	60
3.54	Komuna - Mitrovicë projekti "Asfaltimi i rrugës në mëhallën e Boshnjakeve"	61
3.55	Komuna - Dragash projekti "Ndërtimi QMF në fshatin Bresanë"	62
3.56	Komuna - Dragash projekti "Zyra e Vendit në fshatin Brod"	63
3.57	Komuna - Gjilan projekti "Rrjeti i pakompletuar i ujësjellësit në Kufc të Epërm"	64
3.58	Komuna - Gjilan projekti "Hapja dhe ndërtimi i rrugës Llabjan Parallo"	65
3.59	Komuna - Klinë projekti "Kanalizimi fekal në fshatin Gllarev"	66
3.60	Komuna - Klinë projekti "Meremetimi i pjesës së mbetur të objektit të Kryqit të Kuq"	67
3.61	Komuna - Leposaviq projekti "Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Koshtov-Bistricë dhe Ceraj"	68
3.62	Komuna - Gjilan projekti "Ndërtimi i gypit të ujësjellësit në rrugën Hasan Remniku"	69
3.63	Komuna - Gjilan projekti "Asfaltimi i rrugës në fshatin Shillovë"	70
3.64	Komuna - Gjilan projekti "Ndërtimi i Zyrave të Vendit në Pasjak, Zhegër dhe Pogragjë"	71
3.65	Komuna - Gjilan projekti "Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Makresh të Epërm"	72
3.66	Komuna - Gjilan projekti "Rregullimi i rrjetit të kanalizimit në Partësh"	73
3.67	Komuna - Mitrovica projekti "Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kushtovë"	74
3.68	Komuna - Mitrovica projekti "Rehabilitimi i Shtëpive për rastet sociale në Kodrën e Minatorëve"	75
3.69	Komuna - Mitrovica projekti "Rehabilitimi i objekteve banesore i cili gjinden në rrugën Oslobogjenje në mëhallën e Boshnjakeve"	76
3.70	Komuna - Mitrovicë projekti "Ujësjellësi në fshatin Kodër"	77
3.71	Komuna - Mitrovicë projekti "Rregullimi i varrezave të qytetit"	78
3.72	Komuna - Mitrovicë projekti "Ndërtimi i sistemit të Ujësjellësit në fshatin Vaganicë"	79
3.73	Komuna - Skenderaj projekti "Ndërtimi i Objektit të Administratës Komunale"	80
3.74	Komuna - Gjilan projekti "Përfundimi i objektit të shtëpisë së kulturës në Stanishor"	81
3.75	Komuna - Vushtrri projekti "Asfaltimi i rrugës në fshatin Maxhunaj lagjeja Qelaj"	82
3.76	Komuna - Vushtrri projekti "Asfaltimi i rrugës në fshatin Druar lagjeja Gecaj"	83
3.77	Komuna - Vushtrri projekti "Asfaltimi i rrugës në fshatin Mihaliq"	84
3.78	Komuna - Vushtrri projekti "Pajisje me mjetë të domosdoshme të punës për drejtorin komunale për mbrojtje dhe shpëtim dhe teknologji informative"	85
4.	Lista me Projektet e komunave të financuara nga MAPL për vitin 2009.....	86

1. Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim Avancimin e Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

MAPL si çdo vit buxhetor ka përkrahur komunat me mjete kapitale për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike me qëllim të përmirësimit të kushteve të infrastrukturës për të gjithë qytetarët e Kosovës. MAPL tashmë është një prej koordinatorëve kyç për nivelin lokal për të orientuar edhe donacionet në nivelin e duhur dhe sipas prioriteteve.

Ky raport është i detajizuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MAPL – së në shumë projekte të komunave, ka raste ku MAPL është financues i projektit në tërësi. Gjithsej MAPL në vitin 2009 ka realizuar 84 projekte në 36 komunat e Republikës së Kosovës, këto projekte janë të paraqitura në pjesën e parë të raportit ku janë të ndara në 4 grupe sipas regjioneve koordinuese.

2. Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve

Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal monitorimin dhe ecurinë e projekteve nëpër komunat e Republikës së Kosovës e ka realizuar duke i ndarë zyrtarët e Departamentit të Reformës dhe Integritimeve Evropiane në katër grupe punuese ku secili grup ka pasur në përgjegjësi monitorimin e projekteve. Katër grupet që kanë koordinuar dhe monitoruar projektet janë mbikëqyrur nga drejtori i DRIE-s z.Besim Kamberaj.

Grupi I ka qenë i përbërë prej: Fetije Begolli, Tushe Berisha, Besa Shala dhe Hanife Alimusaj, ky grup ka monitoruar projektet në këto komuna: Fushë Kosovë, Zveçan, Suharekë, Malishevë, Deçan, Gjakovë, Istog, Pejë dhe Junik.

Grupi II ka qenë i përbërë prej: Vjollca Selimi, Emine Hoti dhe Fatmire Thaçi, ky grup ka monitoruar projektet në këto komuna: Gllogoc, Lipjan, Obiliq, Podujevë, Prishtinë, Shtime, Gracanica (Pilot), Prizeren dhe Rahovec.

Grupi III ka qenë i përbërë prej: Fatos Qerimi, Ramadan Potera dhe Sanije Dërguti, ky grup ka monitoruar projektet në këto komuna: Mamushë, Shtërpç, Novo Berdë, Kaçanik, Kamenicë, Ferizaj, Viti dhe Hani Elezit.

Grupi IV ka qenë i përbërë prej: Drin Haraçia, Mehdi Retkoceri, Lumnije Azemi, Ymer Raci dhe Naim Zeqiri, ky grup ka monitoruar projektet në këto komuna: Klinë, Dragash, Leposaviq, Mitrovicë, Skenderaj, Vushtrri, Zubin Potok dhe Gjilan.

3. Raporti detaj për secilin prej 84 projekteve sipas regjioneve koordinuese

Komuna	Malishevë
Titulli i projektit	Ndërtimi i shk. fillore në fshatin Tërpezë
Përshkrimi i Projektit	Projekti - Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Tërpezë është dizajnuar në mënyrë që të krijoj kushte më të volitshme për zhvillimin e procesit edukativo-arsimor të shkollës fillore. Fshati ka 175 shtëpi banimi dhe 1068 banore. Me projekt është paraparë që objekti të përfshijë një sipërfaqe prej 500m², ndërsa përmban 4 dhoma mësimi, sallën e arsimitarëve dhe lokalet tjera përcjellëse.
Outputet / Përfitimet	Përmirësimi i kushteve për zhvillimin e procesit edukativo-arsimor të 257 nxënësve të shkollës fillore , si dhe edukim i brezit të ri.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	17.04.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	139,883.61 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	24.04.2009.
Vlera e Kontraktuar	339 726,94 €
Emri i Kontraktuesit	NNP" ARBERI"-Malishevë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	139,883.61 €

Fotot :



Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Tërpezë

Komuna	Pejë
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugës "UÇK" me 2 Korsi.
Përshkrimi i Projektit	Projekti ndihmon zhvillim të mirë socio- ekonomik të qytetarëve dhe gjithashtu ofron siguri më të madhe në të gjitha fushat e jetës, e më së shumti do t'u ofroj një komoditet ngasësve të veturave dhe këmbësorëve. Projekti përfshinë trasimin, ngjeshjen, shtresat paraprake dhe asfaltimi i rrugës me 2 korsi sipas projektit standardeve të nevojshme.
Outputet / Përfitimet	Mirëqenie sociale , ndikim në zhvillim ekonomik, qarkullim normal i automjeteve dhe këmbësoreve etj.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	17.03.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	450 000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.08.2009.
Vlera e Kontraktuar	1.469.428,00 €
Emri i Kontraktuesit	Engineering grup-Arton Dodaj.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	450 000,00 €

Fotot :



Ndërtimi i rrugës "UÇK" me 2 Korsi.

Komuna	Pejë
Titulli i projektit	Rregullimi i parkut Kalaja dhe Karagaq.
Përshkrimi i Projektit	Në parkun Karagaq është paraparë rregullimi i rrugëve – kubëzimi i këtyre rrugëve, vendosja e anësorëve, vendosja e dheut dhe hedhja e farës së barit. Po ashtu në parkun e Karagaqit do të shtrohen shtigjet me zhavorr, dhe do të bëhet kubëzimi i hapësirës dhe rregullimi i liqenit artificial.
Outputet/ Përfitimet	Krijimi i hapësirave rekreative.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	23.08.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100 000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.05.2009
Vlera e Kontraktuar	99,075.60 €
Emri i Kontraktuesit	
Pagesat	
Vlerat e pagesës	99,075.00 €


Fotot :



Rregullimi i parkut Kalaja dhe Karagaq.

Komuna	Deçan
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në lagjen Gecaj në fshatin Llukë e ulët.
Përshkrimi i Projektit	Ndër prioritetet kryesore për zhvillim të infrastrukturës rrugore komunale është edhe projekti "Asfaltimi i rrugës në lagjen e Gecajve në fshatin Llukë e Ulet" në gjatësi L-490 m dhe B-3,5-4,5 m. Kjo rrugë ka rëndësi të madhe në zhvillimin e jetës normale për shumë banorë të kësaj ane e sidomos për njerëzit të cilët do të vizitonin Kullën e Gecajve e cila është pjesë shumë rëndësishme e trashëgimisë kulturore.
Outputet / Përfitimet	Zhvillim ekonomik, qarkullim normal i automjeteve dhe këmbësoreve
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	25.09.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	49 983,00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.10.2009
Vlera e Kontraktuar	39 876,20€
Emri i Kontraktuesit	
Pagesat	
Vlerat e pagesës	39 876,20€

Fotot :

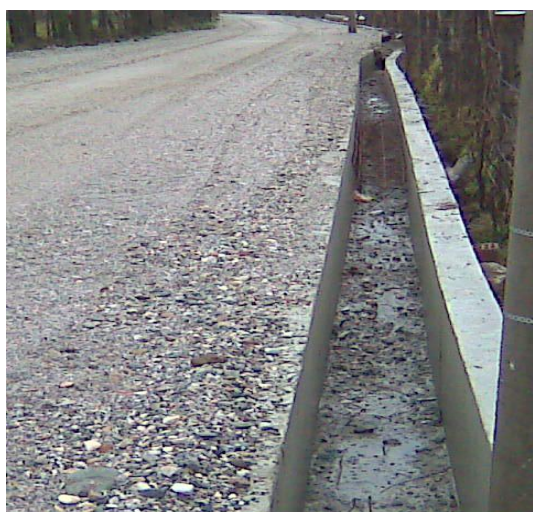

Asfaltimi i rrugës në lagjen Gecaj në fshatin Llukë e ulët.

Komuna	Deçan
Titulli i projektit	Rekonstruimi i rrugës qendra e Deçanit- Carrabreg (faza e parë)
Përshkrimi i Projektit	Asfaltimi i rrugës është bërë në gjerësi sa të kalojnë dy automjete në të njëjtën kohë në drejtime të ndryshme të mos pengojnë njëra tjetrën dhe do të jetë një rrugë transite e qytetit, do të mundësoj qarkullimin e lirë dhe më të mirë të qytetarëve.
Outputet / Përfitimet	Kanë përfituar 2000 banorët e fshatit Carrabreg dhe K.K Deçan.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.02.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	K.K. Deqan
Data e nënshkrimit të kontratës	30.04.2009
Vlera e Kontraktuar	283.803.18 €
Emri i Kontraktonit	“ Lika Trade” Sh.P.K.Deqan
Pagesat	
Vlerat e pagesës	100,000.00€

Fotot :



Rekonstruimi i rrugës qendra e Deçanit- Carrabreg (faza e parë)

Komuna	Deçan
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Irzniq-Kodralli-Pozhar-Llukë e Ulët
Përshkrimi i Projektit	Ndër prioritetet kryesore për zhvillim të infrastrukturës rrugore komunale ishte edhe projekti “Asfaltimi i rrugës Irzniq-Kodralli-Pozhar-Llukë e Ulët “ Asfaltimi i kësaj rruge është bërë në gjerësi sa të kalojnë dy automjete në të njëjtën kohë në drejtime të ndryshme të mos pengojnë njëra tjetrën dhe do të jetë një rrugë transite e qytetit, do të mundësoj qarkullimin e lirë dhe më të mirë të qytetarëve
Outputet / Përfitimet	Shkurtimi i rrugës në magjistralen Pejë deri afër Gjakovës që lidh shumë fshatra, ku qarkullimi i qytetarëve dhe mallrave do të jetë më i lehtë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	17.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	120,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	K.K.Deqan
Data e nënshkrimit të kontratës	30.04.2009
Vlera e Kontraktuar	277.744.00 €
Emri i Kontraktorit	“ Lika Trade” Sh.P.K.Deqan
Pagesat	
Vlerat e pagesës	120,000.00€

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Irzniq-Kodralli-Pozhar-Llukë e Ulët

Komuna	Suharekë
Titulli i projektit	<i>Ndërtimi i trotuarit ne rrugën "Hajdin Berisha-Skenderbeu"</i>
Përshkrimi i Projektit	Realizimi i këtij projekti ishte prioritet i Komunës ku me përfundimin e këtij projekti iu ka mundësuar banorëve qarkullim më të mirë. Ne këtë rrugë është bërë ndërtimi i trotuarit me kubëza betoni në trashësi prej 8 cm, mbi rëre (5 cm) sipas projektit detal dhe standardeve të ndërtimit.
Outputet / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar qytetarët e këtij lokacioni të cilëve ju ka mundësuar qarkullim me i lehtë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.09.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	102 000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.10.2009.
Vlera e Kontraktuar	102,000.00€
Emri i Kontraktuesit	"Bamirësi" Suharekë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	102,000.00€

Fotot :



Ndërtimi i trotuarit ne rrugën "Hajdin Berisha- Skenderbeu"

Komuna	Suhareka
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugës Mohlan- Krushicë
Përshkrimi i Projektit	Realizimi i këtij projekti krijon kushte për investime të mëtejme në fushën e blegtorisë dhe bujqësisë etj. Ndërtimi i rrugës lidhë 3 fshatra dhe është në gjatësi prej 3360 m. Po ashtu është paraparë të ndërtohet sistemi i largimit të ujërave atmosferike zgjerim për prankalim të autobusëve, bankinat.
Outputet / Përfitimet	Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar fshatrat Llanisht, Papaz, Budakove nëpër të cilën qarkullojnë afër 841 banorë dhe 487 nxënës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	16.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	150 000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.07.2009.
Vlera e Kontraktuar	335 834,82 €
Emri i Kontraktuesit	“Emona” Suhareke
Pagesat	
Vlerat e pagesës	149,999.97 €

Fotot :



Ndërtimi i rrugës Mohlan- Krushicë

Komuna	Suhareka
Titulli i projektit	Rregullimi i rrugës në fshatin Mushtisht
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt fillon nga qendra dhe vazhdon për në lagjen nr. 1 dhe do të ketë gjatësinë prej 2000m me gjerësi 5.5 m, realizimi i kanalizimit të ujërave atmosferik me elemente përcjellëse, si dhe finalizimi i tyre sipas standardeve. Kjo rrugë lidhet me rrugën Suharekë - Shtërpçë
Outputet / Përfitimet	Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar afër 2000 banor të lagjes nr .1 ndërsa i tërë fshati ka 5700 banorë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	16.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50 000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.06.2009
Vlera e Kontraktuar	131 829,22 €
Emri i Kontraktuesit	NNP “NBT ING”
Pagesat	
Vlerat e pagesës	50 000,00€

Fotot :



Rregullimi i rrugës në fshatin Mushtisht

Komuna	Suhareka
Titulli i projektit	Vazhdim i rrjetit të kanalizimit në fshatin Doberdolan
Përshkrimi i Projektit	Realizmi i këtij projekti do të bëhet me qëllim të parandalimit të epidemive të ndryshme, kështu që ky projekt përfshinë derdhjen e ujërave në gropën septike aktuale të fshatit Dobërdolan e cila gropë duhet të eliminohet, dhe vazhdimi i këtij rrjeti deri të kycja në rrjetin e kanalizimit ekzistues të fshatit Studenqan. Gjatësia e kanalizimit është 1000 m.
Outputet / Përfitimet	Përfitues të drejtpërdrejt do të jenë banorët e fshatrave Dobërdolan dhe Studenqan me gjithsej 6580 banore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	16.04.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	34 000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	27.10.2009.
Vlera e Kontraktuar	74.361,80 €
Emri i Kontraktuesit	"SMAKA"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	33,999.99 €


Fotot :



Vazhdim i rrjetit të kanalizimit në fshatin Doberdolan

Komuna	Suharekë
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugës Semetisht – Nishor – Faza e II
Përshkrimi i Projektit	Një ndër prioritetet e KK Suharekë ishte edhe vazhdimi i projektit për ndërtimin rrugës Semetisht –Nishor. Ky projekt do të përfshijë ndërtimin e rrugës me gjatësi 4 km dhe gjerësi 5.5 m në drejtim të Semetisht- Nishor – Kravasari sipas standardeve.
Outputet / Përfitimet	Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar banorët e fshatrave Semetisht –Nishor –Kravasari me mbi 4000 banor, nxënësit e shkollave fillore “Hasan Prishtina” dhe “Bajram Curri” me gjithsej 634 nxënës si dhe qytetarë të tjerë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	16.04.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	166 000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	08.06.2009.
Vlera e Kontraktuar	193.932,69 €
Emri i Kontraktuesit	“GASHI ING”
Pagesat	
Vlerat e pagesës	166 000,00 €

Fotot :

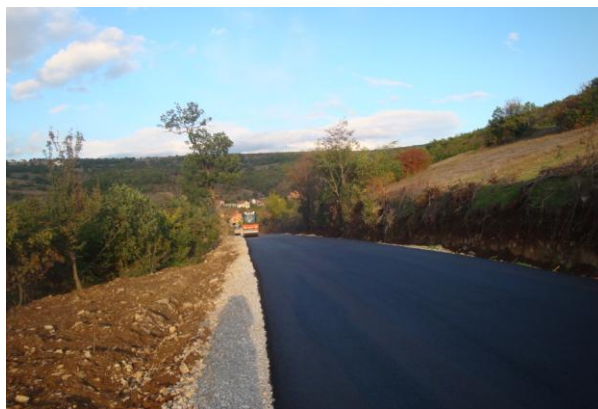

Ndërtimi i rrugës Semetisht – Nishor – Faza e II

Komuna	Istog
Titulli i projektit	Asfaltimi rrugës Suriganë -Cerkolez-Kujavq.
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt përfshin asfaltimin e rrugës me gjatësi prej 3960m., e cila ka rëndësi shumë dimensionale në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Punët që janë përfshi në këtë projekt janë ngjeshja e trasesë, gërmimi dhe largimi i materialit mbushja me zhavorr natyral, punimi i tamponit dhe shtresës së asfaltit, vendosja e gypave dhe hapja e kanaleve anësore.
Outputet / Përfitimet	Me këtë rrugë përfitojnë tre fshatra e cila mundëson ndaljen e emigrimit fshat –qytet etj.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	07.08.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	310.000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	02.10.2009
Vlera e Kontraktuar	329.169.00 €
Emri i Kontraktonit	Graniti -Istog
Pagesat	
Vlerat e pagesës	310,000.00 €

Fotot :



Asfaltimi rrugës Suriganë -Cerkolez-Kujavq.

Komuna	Istog
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalizimit në Vrellë- Studenicë
Përshkrimi i Projektit	Vrella është një ndër fshatrat më të mëdha të komunës së Istogut me mbi 4300 banor e cila shtrihet afër bjeshkëve të thata. Ky lokalitet që moti është ballafaquar me problemin e ndërtimit të kanalizimit të ujërave të zeza.
Outputet / Përfitimet	Në këtë kanalizim kyçen 900 shtëpi (familje) me 4300 banorë me ç'rast përmirësohet standardi jetësor, zvogëlohet shpërngulja fshatë- qytet dhe evitohet rreziku i sëmundjeve të ndryshme epidemiologjike.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	10.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	367 130,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	16.07.2009.
Vlera e Kontraktuar	367 130,00 €
Emri i Kontraktonit	SHA Berisha Kompani
Pagesat	
Vlerat e pagesës	367 130,00 €


Fotot :



Ndërtimi i kanalizimit në Vrellë- Studenicë

Komuna	Istog
Titulli i projektit	Asfaltimi dhe kubëzimi i rrugës kopshti i fëmijëve - shkolla-Qendër në Gurakoc.
Përshkrimi i Projektit	Qendra urbane e Gurakocit shtrihet në pjesën qendrore të territorit të komunës së Istogut me një popullsi prej 4355 banorë. Projekti përfshin asfaltimin e rrugës në gjatësi prej 1200 m si dhe kubëzimi i trotuareve .
Outputët / Përfitimet	Me këtë rrugë dhe trotuare përfitojnë më se 4400 banorë të kësaj qendre, lëvizja e lirë dhe evitimi i aksidenteve të komunikacionit si dhe do të ndikon në zhvillimin ekonomik.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	16.04.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	29.06.2009
Vlera e Kontraktuar	99.279,00 €
Emri i Kontraktonit	NNSH "Themeli"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	99.279,00 €

Fotot :

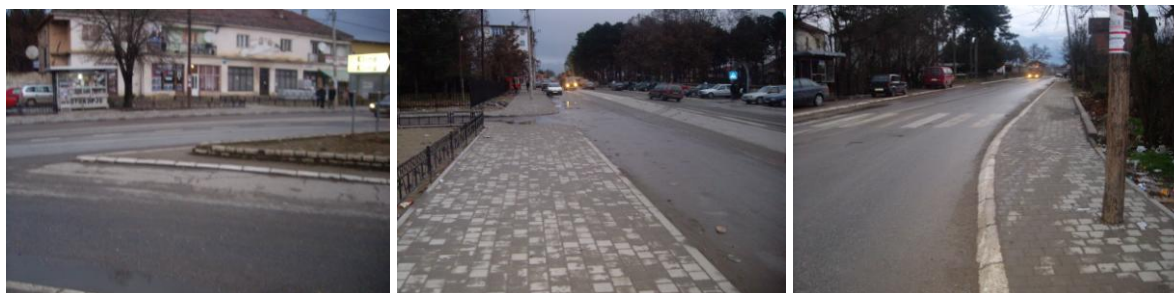

Asfaltimi dhe kubëzimi i rrugës kopshti i fëmijëve -shkolla-Qendër ne Gurakoc

Komuna	Istog
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në qendrën urbane- Banjë
Përshkrimi i Projektit	Qendra urbane e Banjës shtrihet në pjesën perëndimore të territorit të komunës së Istogut me një komunitet të përzier dhe popullatë mbi 2000 banorë. Projekti përfshinë asfaltimin e rrugës me gjatësi 1200m. Ky projekt përfshin fazën e tretë të ndërtimit
Outputet / Përfitimet	Ky projekt ndikon në zhvillim ekonomik, lehtësimin e qarkullimit të përgjithshëm në trafik.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	16.04. 2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100 000,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.07.2009
Vlera e Kontraktuar	114.250,00
Emri i Kontraktuesit	Sh.p.k "Granit" Istog
Pagesat	
Vlerat e pagesës	100,000.00 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës në qendrën urbane- Banjë

Komuna	Fushë Kosovë
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve lokale në Fushë Kosovë.
Përshkrimi i Projektit	Komuna e Fushë Kosovës ka mbi 30,000 banor, sipërfaqe rreth 100 km ² , është pikë lidhëse në mes Prishtinës dhe Aeroportit ku edhe autostrada kalon nëpër qytezën e Fushë Kosovës. Janë asfaltuar 25 rrugica lokale. Banorët e këtyre lagjeve janë përball me probleme të shumta për shkak të rrugës së pa asfaltuar.
Outputët / Përfitimet	Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar qytetarët e këtyre lagjeve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	28.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	350,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	20.05.2009
Vlera e Kontraktuar	349.942.55 €
Emri i Kontraktonit	Burimi,sh,p,k,Doganaj-Kaçanik
Pagesat	
Vlerat e pagesës	349.942.55 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugëve lokale në Fushë Kosovë.

Komuna	Junik
Titulli i projektit	Ndërtimi i Objektit të Administratës K. K Junik - Faza I
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i objektit të administratës – faza e parë , ku përfshihen punimet e vrazhda (deri në kulm) , themelet, pllakat mbi themele , mbi përdhes, kati i parë dhe kati i dytë, mbulesa (kulmi), muratimi i mureve të jashtme dhe të brendshme duke e përfshirë edhe ujësjellësin , kanalizimin dhe elektriken - rrjetin primarë.
Outputët / Përfitimet	Përfundimin i këtij projekti do të ndikoj në rezultatet e punës duke u bazuar në kushtet më të mira të ambientit punues.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	18.05.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	300,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	05.10.2009
Vlera e Kontraktuar	268,819.47 €
Emri i Kontraktonit	N.N.T“ Albes “ Istog
Pagesat	
Vlerat e pagesës	161,291.67€

Fotot :



Ndërtimi i Objektit të Administratës K. K Junik - Faza I

Komuna	Zveçan
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrjetit elektrik për lagjen Ukaj -Fshati Lipë
Përshkrimi i Projektit	Ndërtimi i rrjetit elektrik për lagjen Ukaj fshati Lipë,për furnizim normal me energji elektrike dhe kushte elementare për jetë është ndërtuar rrjeti i ri i linjës së re të tensionit të lartë dhe tensionit të ulët përbrenda lagjes si dhe vendosja e një trafostacioni në këtë lagje.
Outputet / Përfitimet	Me përfundimin e këtij projekti banorët e fshatit Lipë do të kenë furnizimin më të rregullt të energjisë elektrike
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	12.06.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	75,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	14.10.2009
Vlera e Kontraktuar	74.888.00 €
Emri i Kontraktonit	Everyday
Pagesat	
Vlerat e pagesës	74.888.00 €

Fotot :



Ndërtimi i rrjetit elektrik për lagjen Ukaj -Fshati Lipë

Komuna	Shtime
Titulli i projektit	Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekale dhe rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime
Përshkrimi i Projektit	Qyteti i Shtimes numëron rreth 12,000 mijë banorë me 1,645 shtëpi banimi, 461 lokale afaristë, 3 shkolla, 1 ambulancë, entin special si dhe disa objekte shoqërore. Falë kryqit të kuq Gjerman prej vitit 2002 u zgjidh problemi shumë i madh i ujit të pijshëm, por si pasojë e mungesës së kanalizimit qendror fekal prej vitit 1994-1996 janë paraqitur 149 të sëmur nga epidemia e tifos abdominale. Shkaku që u paraqit kjo epidemi ishte pikërisht mungesa e kanalizimit adekuat fekal si dhe mungesa e atëhershme e ujësjellësi. Realizimi i këtij projekti mundëson një ambient më të shëndosh dhe më të mirë për banorët e kësaj anë.
Outputet / Përfitimet	Përmirësimi i shërbimeve komunale, trajtimi adekuat i ujërave të zeza, parandalimi për përhapjen e epidemive të ndryshme, ambient më të pastër dhe më të shëndosh, do të krijohen parakushte për rregullimin e infrastrukturës së gjithëmbarshe të qytetit si dhe qarkullimi më i lehtë për automjete.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	10.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	450,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	13.05.2009
Vlera e Kontraktuar	499,957.09
Emri i Kontraktonit	NPTSH "Getoari" - Prizren
Pagesat	
Vlerat e pagesës	450,000.00€

Fotot :



Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekale dhe rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime

Komuna	Podujevë
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Dumnicë-Llaushë
Përshkrimi i Projektit	Rruga ka qenë e pa asfaltuar dhe e shkatërruar, si dhe me plot me gropa, ku ka penguar qarkullimin e lire të qytetarëve dhe në mungesë të kësaj nuk ka pasur perspektiv për zhvillim ekonomik, e as zhvillimit të sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë. Popullata vazhdimisht është shpërngulur nga këto treva pasi që kanë munguar kushtet për një jetë normale. Rruga është e gjatë 5353m, e gjerë 5m, trashësia e asfaltit me një shtresë d=7cm, gjendet në zonën kufitare me Serbinë .
Outputet/ Përfitimet	Qarkullimin e lirë të qytetarëve , zhvillimin e bizneseve privatë, punësimin e femrës në të dy sektorët, rregullimin e ambientit e në shumë lëmi tjera si dhe ndihmon në bashkëpunimin ndërkufitar.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	10.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	13.11.2009
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	479,878.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	02.06.2009
Vlera e Kontraktuar	553,334.21
Emri i Kontraktonit	„Toifor” shpk, Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	479,878.00€

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Dumnicë – Llaushë

Komuna	Podujevë
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Letancë – Bajqinë
Përshkrimi i Projektit	Nëpër këtë rrugë frekuentojnë banorët e fshatit Bajqinë, Letanc, Doberdol, Zakut numri i të cilave është më tepër se 6.000 banor. Por nëpër këtë rrugë qarkullojnë edhe shumë banorë të fshatrave tjera që gjinden rreth fshatrave të cekura më lartë pasi që kjo rrugë e shkurton rrugën për në Podujevë. Fshatrat Letanc dhe Bajqinë gjinden në veri të Podujevës. Fshati Letanc është në pjesën veriore të Podujevës kurse në anën veriperëndimore lidhet me këtë rrugë me fshatin Bajqinë. Në mungesë të kësaj rruge banorëve të kësaj ane shpesh ju ka vështirësuar udhëtimi deri në Podujevë.
Outputët / Përfitimet	Rruga lidhë rrugën e asfaltuar Podujevë-Kërpimëh me fshatin Letanc dhe Podujevë për disa kilometra do të jetë më e shkurt. Do të behët zgjerimi i rrugës dhe qarkullimi i qytetarëve dhe nxënësve do të jetë shumë me i lirshëm.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	16.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	246,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	17.09.2009
Vlera e Kontraktuar	397,873.46
Emri i Kontraktonit	„Toifor” shpk, Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	123,000.00€

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Letancë – Bajqinë

Komuna	Prizren
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës „Jashar Salihu” Prizren
Përshkrimi i Projektit	Gjendja aktuale e kësaj rruge ka qenë jo e mirë, kanë qenë evidente gropa të mëdha që kanë pamundësuar qarkullimin e lirë të automjeteve dhe banorëve të kësaj pjese. Vështirësi në qarkullim e banorëve të kësaj pjese ka pasur sidomos gjatë dimrit. Realizimi i këtij projekti ka përmirësuar kushtet e transportit për automjetet dhe qarkullimit të kalimtarëve në rrugë.
Outputet / Përfitimet	Rezultat i këtij projekti është përmirësimi i infrastrukturës rrugore, përmirësimi i kushteve jetësore dhe lëvizja e lirë e qytetarëve në këtë lokalitet.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	28.09.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	40,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	04.11.2009
Vlera e Kontraktuar	70,818.68
Emri i Kontraktorit	NNp,, Renelual Tahir”
Pagesat	
Vlerat e pagesës	40,000.00

Fotot :



Asfaltimi i rrugës „Jashar Salihu” Prizren

Komuna	Prizren
Titulli i projektit	Ndërtimi i zyrës së vendit në fshatin Zhur
Përshkrimi i Projektit	Në Republikën e Kosovës vendbanimet janë të shpërndara dhe larg qendrave komunale dhe institucioneve tjera, andaj ka qenë e nevojshme që shërbimet komunale të jenë më afër qytetarëve për arsye se qytetarët mos të udhëtojnë deri në zyrat komunale në qytetet më të mëdha për të përfituar nga shërbimet komunale. Qytetarëve iu është dashtë të paguajnë shpenzimet e udhëtimit deri në zyret më të afërta komunale.
Outputët / Përfitimet	Me përfundimin e projektit ofrohen shërbimeve më afër për qytetarëve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	16.06.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	08.10.2009
Vlera e Kontraktuar	33,553.23
Emri i Kontraktonit	N.P.N. „Pro-Ark”
Pagesat	
Vlerat e pagesës	13,421.29 €

Fotot :



Ndërtimi i zyrës së vendit në fshatin Zhur

Komuna	Prizren
Titulli i projektit	Pajisje me inventar të qendrës së kulturës në Gjonaj
Përshkrimi i Projektit	Qendra e kulturës në Gjonaj mbulon nevojat e Regjionit të Hasit me rreth 20.000 banorë, është në qendër të fshatit Gjonaj, aty ku zhvillohen shumë aktivitete jo vetëm kulturore por në këtë qendër funksionon OJQ “Iniciativa Rinore”, SHKA “Malësori” që është shumë aktive dhe në çdo vit organizohet Festivalin Folklorik “Hasi Jehon” ngjarje që ka kaluar kufijtë e Kosovës. Gjithashtu funksionon Biblioteka e pranuar nga MKRS e Qeverisë së Kosovës, në këtë qendër organizohen kurse të gjuhës angleze dhe të kompjuterëve pasi që me donacionin e Fondacionit SOROS funksionon edhe kabineti i kompjuterëve.
Outputët / Përfitimet	Me ndërtimin e kësaj Qendre jeta në Has është bërë më atraktive, më tërheqëse sidomos për të rinjtë .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	27.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	75,450.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.06.2009
Vlera e Kontraktuar	72,599.00
Emri i Kontraktonit	N.T. „Kosovatregu” Prizren
Pagesat	
Vlerat e pagesës	72,599.00€

Fotot :



Pajisje me inventar të qendrës së kulturës në Gjonaj

Komuna	Prizren
Titulli i projektit	Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi (1,2,3) në Prizren
Përshkrimi i Projektit	Qyteti i Prizrenit ka mbi 220,000.00 banor ku ka nevojë për krijimin e miniparqeve dhe hapësirave tjera rekreative për qytetarët, ku dihet ndërtimet e mëparshme pa planifikim kanë bërë që qyteti të mos ketë sipërfaqe të mëdha gjelbëruese dhe rregullim të infrastrukturës ambientale. Këtu është bërë mbjellja e barit, vendosja e ulëseve, ndriçimi etj.
Outputët / Përfitime	Krijimi i vendeve rekreative për qytetarët.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	14.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.06.2009
Vlera e Kontraktuar	85,403.55
Emri i Kontraktonit	OE-NSH "Shërbimi" -Prizren
Pagesat	
Vlerat e pagesës	85,403.45€

Fotot :



Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi (1,2,3) në Prizren

Komuna	Rahoveci
Titulli i projektit	Kanalizimi fekal në fshatin Çifllak
Përshkrimi i Projektit	Pjesa më e madhe e territorit të komunës ka mbetur e pambuluara me rrjet kështu që ka qenë e domosdoshme realizimi i rrjetit të kanalizimit në vendbanimet ku nuk ka rrjet. Ky projekt me gjatësi L=7km është projekt qenësor në infrastrukturën e fshatit Çifllak, fshat ky i banuar me popullatë të dendur. Problemi i ujërave të zeza mbi sipërfaqe bie deri të një varg i problemeve tjera siç është: shkatërrimi i rrugës në vijat ku ujërat e kanalizimit rrjedhin të lira mbi sipërfaqe, ndotja e ambientit dhe ashtu me një shkallë të ndotjes mjaft të madhe, mundësia e përhapjes së epidemive, pamundësia e mbajtjes së higjienës në rrugë etj.
Outputët / Përfitimet	Eliminimi i epidemive të cilat shkaktohen si pasojë e ujerave fekalë, krijimi i infrastrukturës me të mirë për qytetarët, mbrojtja e ambientit si dhe ndalimi i shtrirjes së ujërave të zeza në sipërfaqe të tokës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	14.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	130,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	03.06.2009
Vlera e Kontraktuar	142,820.019
Emri i Kontraktonit	NPTN "Krasniqi" - Prizren
Pagesat	
Vlerat e pagesës	130,000.00€

Fotot:



Kanalizimi fekal në fshatin Çifllak

Komuna	Rahovec
Titulli i projektit	Meremetimi i ndërtesës së KK- Rahovec
Përshkrimi i Projektit	Administrata komunale e KK Rahovec aktualisht ka pasur mungesë të hapësirës për punë. Departamentet komunale kanë qenë të shpërndara nëpër disa ndërtesa dhe kjo ka paraqitur problem si për shërbimet në komunë ashtu edhe për qytetarët e komunës së Rahovecit .Për këtë arsye Kuvendi Komunal Rahovec duke i marrë parasysh këto probleme ka vendosur që ta bëjë meremetimin.
Outputët / Përfitimet	Përmirësimi i kushteve për punë, si dhe shërbime më efikase për qytetar.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	14.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	20,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	19.08.2009
Vlera e Kontraktuar	19,977.83
Emri i Kontraktonit	NNH „Morina ib” Rahovec
Pagesat	
Vlerat e pagesës	19,977.83

Fotot :



Meremetimi i ndërtesës së KK- Rahovec

Komuna	Obiliq
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalizimit fekal në lagjen e re në Milloshevë
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt ka qenë projekti qenësor në infrastrukturën e fshatit Milloshevë, pasi që ky fshat është i banuar me popullatë të dendur , kështu që ujerat e zeza shpesh kanë dal mbi sipërfaqe gjë që kanë shkaktuar probleme shumë serioz. Gjatësia e kanalizimit është L=2500m,fshati Millosheve ka shtrirje nga kryqëzimi i rrugës Obiliq-Mitrovice-Podujeve-Prishtine e deri të fabrika e re e stiroporit në drejtim të Obiliqit dhe të pompa në hyrje të fshatit, lagja numëron rreth 200 shtëpi me numër të banorëve rreth 1200.
Outputët / Përfitimet	Realizimi i këtij projekti do të ndikoj në standardin e banorëve pasi që gjendja e tanishme është i ndotja e ambientit . Realizimi i këtij projekti do të ndikoj në përmirësimin ambientit me këtë edhe eliminimin e epidemive të ndryshme ,po ashtu realizmi i këtij projekti do të ndikoj në mos ndotjen e ujit të pijshëm.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	28.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	36,412.58 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.07.2009
Vlera e Kontraktuar	37.061,15
Emri i Kontraktonit	N.P.N "Ballkan Projekt"Obiliq
Pagesat	
Vlerat e pagesës	36,412.58 €

Fotot :



Ndërtimi i kanalizimit fekal në lagjen e re në Milloshevë

Komuna	Obiliq
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugës në fshatin Sibofc lagja "Kelmendi"
Përshkrimi i Projektit	Rruga në masë të konsiderueshme ka qene e shkatërruar dhe ka pasur mjaft gropa gjë dhe ka ekzistuar rreziku nga automjetet gjë ka ndikuar deri të fatkeqësitë e ndryshme automobilistike. Gjatësia e kësaj rruge është 1083 m,kjo rruge lidh këtë pjesë të territorit me fshatra të komunave, të komunës Vushtrrisë dhe të komunë së Drenasit ,sepse lidhet me dy trasat e rrugës së asfaltuar të cilat janë në të dy krahët. Realizimi i këtij projekti mundëson në përmirësimin e qarkullimit të qytetarëve, dhe në zhvillimin e bizneseve.
Outputët / Përfitimet	Parandalimi i aksidenteve,zhvillimi ekonomik dhe social,shkurtimi i udhëtimit si dhe lidhja me komunat tjera.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	28.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	106,019.30 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	28.05.2009
Vlera e Kontraktuar	103,163.58 €
Emri i Kontraktonit	N. P. SH. Bageri
Pagesat	
Vlerat e pagesës	103,163.58 €

Fotot :



Ndërtimi i rrugës në fshatin Sibofc lagja Kelmendi

Komuna	Obiliq
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Lulgjak
Përshkrimi i Projektit	Kanalizimi në fshatin Lulgjak ka shtrirje buzë magjistrales Prishtine-Mitrovice. Lagja numëron rreth 150 shtëpi dhe numri mesatar i banorëve është rreth 900. Gjatësia e kanalizimit është 2200m. Rregullimi i këtij kanalizimi dukshëm ka ndikuar në përmirësimin e mjedisit dhe kushteve, të banorëve të këtij fshati.
Outputët / Përfitimet	Rregullimi i këtij kanalizimi dukshëm do të ndikoj ne përmirësimin e mjedisit dhe kushteve,do të beje lidhjen e kësaj lagjeje me kanalizimin e ndërtuar pak vite me herët ne fshatin Millosheve Parandalimi i e sëmundjeve dhe epidemive.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	26.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	35,657.72
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	24.07.2009
Vlera e Kontraktuar	35,657.72
Emri i Kontraktonit	N.N.P" Ardi" nga Obiliqi
Pagesat	
Vlerat e pagesës	35,657.72

Fotot :



Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Lulgjak

Komuna	Obiliq
Titulli i projektit	Sistemi i ujësjellësit në fshatin Sibofc
Përshkrimi i Projektit	Rrjeti shpërndarës i ujësjellësit është realizuar për furnizim me ujë të pijes për 1440 banor të fshatit Sibofc. Rrjeti i paraparë mbulon pesë lagje, gjatësia e ujësjellësit sipas projektit është L=10330m. Realizimi i këtij projekti përfshinë: punët tokësore, punët montuese dhe punët tjera. Gjithashtu realizimi i këtij projekti ka ndikuar në përmirësimin e ujësit të pijshëm për banoret e këtij fshati.
Outputët / Përfitimet	Zgjidhja e problemit të ujit të pijes. Parandalimi i sëmundjeve dhe epidemive.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	28.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	150.340,20€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	14.07.2009€
Vlera e Kontraktuar	116.205,00€
Emri i Kontraktorit	N.N.P "SOPI"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	114,171.41 €

Fotot :



Sistemi i ujësjellësit në fshatin Sibofc

Komuna	Glllogoc
Titulli i projektit	Kanalizimi në Gllobar
Përshkrimi i Projektit	Gjendja në fshatin Gllobar ka qenë mjaft e rëndë për shkak të mungesës së infrastrukturës lokale, ku këtë gjendjen me tepër e ka vështirësuar mungesa e rrjetit të kanalizimit ku një numër i madh i banorëve të këtij fshati i ju është kanosur rreziku i shfaqjes së ndonjë epidemie nga ujërat e zeza. Në Fshatin Gllobar jetojnë 162 familje, me rreth 1,728 banor. Ndotja e ujit të pijshëm ka qenë problem i cili shkaktohej nga mungesa e kanalizimit (depërtimi i ujërave të zeza).
Outputët / Përfitimet	Mbrojtja e ambientit Mbrojtja e shëndetit të banorëve të këtij fshati.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	13.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	98,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.06.2009
Vlera e Kontraktuar	98,793.01 €
Emri i Kontraktonit	N.N.P" Diamanti"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	98,000.00 €

Fotot :



Kanalizimi në Gllobar

Komuna	Glllogoc
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nekovc
Përshkrimi i Projektit	Në fshatin Nekovc jetojnë rreth 3230 banor, me numër të shtëpive 401. Mungesa e rrjetit të kanalizimit ka paraqitur rrezik për përhapjen e ndonjë epidemie nga ujërat e zeza që në këtë vit në komunën e Glllogocit është paraqitur edhe sëmundja e verdhëzës. Rrjeti i kanalizimit është në një gjatësi prej 11000m që e mbulon tërë fshatin Nekovc . Rrjeti ka qene në gjendje të rend dhe në mungesë të mjeteve ky projekt ka mbetur pa u kryer edhe pse vet komuniteti ka përgatitur edhe projektin kryesor për implementim.
Outputët / Përfitimet	Mbrojtja e ambientit Mbrojtja e shëndetit të banorëve të këtij fshati
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	26.05.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	24.09.2009
Vlera e Kontraktuar	49,185.77 €
Emri i Kontraktonit	N.SH.T."EUROSERVICE"-Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	30,000.00

Fotot :



Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nekovc

Komuna	Gllogoc
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Tërstënik
Përshkrimi i Projektit	Gjendja në fshatin Tërstënik është mjaft e rëndë për shkak të mungesës së infrastrukturës lokale, këtë gjendje me tepër e ka vështirësuar mungesa e rrjetit të kanalizimit ku një numër i madh i banorëve të këtij fshati i ju është kanosur rreziku i shfaqjes së ndonjë epidemie nga ujërat e zeza. Fshati Tërstënik ka një numër të madh të banorëve. Mos ekzistimi i rrjetit të kanalizimit ka shkaktuar edhe ndotjen e ujit të pijshëm.
Outputët / Përfitimet	Mbrojtja e ambientit Mbrojtja e shëndetit të banorëve të këtij fshati.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	26.05.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.10.2009
Vlera e Kontraktuar	43,075.65
Emri i Kontraktorit	N.N.P"BEQIRI"-Drenas
Pagesat	
Vlerat e pagesës	43,075.65 €

Fotot :



Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Tërstënik

Komuna	Lipjan
Titulli i projektit	Rrjeti i ujësjellësit në fshatin Livagjë Dobratinë dhe Konjuh
Përshkrimi i Projektit	Problem kryesor për këto fshatra dhe këta banorë ka qenë problemi me furnizim me ujë të pijshëm, ku deri e me tani këta banorë janë furnizuar nga pusët gjë që shpesh kjo ka paraqitur rrezik nga shfaqja e ndonjë epidemie nga ujërat nëntokësore . Realizimi i këtij projekti ka përfshirë riparimin e sistemit të ujerave dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja të nevojshme..
Outputët / Përfitimet	Rezultat i projektit është siguri i ujit të pijshëm. Përmirësimi i kushteve higjienike - shëndetësore. Zvogëlimi dhe eliminimi i sëmundjeve ngjitëse . Përmirësimi i kualitetit të ujit të klorinuar
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	180,000.00
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	09.10.2009
Vlera e Kontraktuar	178,695.62
Emri i Kontraktorit	CDF
Pagesat	
Vlerat e pagesës	178,695.62 €

Fotot :



Rrjeti i ujësjellësit në fshatin Livagjë Dobratinë dhe Konjuh

Komuna	Prishtinë
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në Keqekollë lagja "Spahiu"
Përshkrimi i Projektit	Gjendja e kësaj ka qenë rrugë jo e mirë, ka pasur gropa të mëdha që kanë pamundësuar qarkullimin e lirë të automjeteve dhe iu ka vështirësuar jetën banorëve të kësaj pjese, gjë që ne ka ndikuar migrimin e qytetarëve në qytete tjera , Vështirësi në qarkullim banorët e këtyre pjesëve ka pasur sidomos gjatë stinës së dimrit . Realizimi i këtij projekti ka ndihmon qarkullimin e qytetareve si dhe në zhvillimin e bizneseve .Ku me këtë projekt janë nderuar 400 m rrugë.
Outputtë / Përfitimet	Përmirësimi i infrastrukturës rrugore të zonave rurale, dhe ndalimi i shpërnguljes së banorëve të zonave rurale.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	27.09.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	23.11.2009
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	137,396.74 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	06.11.2009
Vlera e Kontraktuar	137,396.74 €
Emri i Kontraktonit	N.P "Izolimi" Prishtine & "GE Grup Sh.p.k" (Kontraktuesi)
Pagesat	
Vlerat e pagesës	137,396.74 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës në Keqekollë lagja "Spahiu"

Komuna	Prishtinë
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Graçanicë-Llapllasell
Përshkrimi i Projektit	Me këtë projekt kane përfituar mbi 18,000 banor, me një sipërfaqe rreth 3000m, dhe kjo rrugë është pikë lidhëse në mes Prishtinës dhe Gjilanit me Kamenicë. Implementimi i këtij projekti ndikoj në përmirësimin e kushteve të transportit për automjete dhe qarkullimin e qytetarëve.
Outputtë / Përfitimet	Zvogëlimi i aksidenteve në rrugë ,zhvillimi ekonomik si dhe lidhja me qytetet tjera .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	05.6.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	03.11.2009
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	642,218.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	06.11.2009
Vlera e Kontraktuar	642,218.47 €
Emri i Kontraktonit	“Toifor”SH.P.K,Prishtine &V.Z Company”Sh.p.k.Prishtine
Pagesat	
Vlerat e pagesës	256,887.39 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Graçanicë-Llapllasellë

Komuna	Prishtinës
Titulli i projektit	Kultivimi i gjelbërimit në lagjen Ulpiana
Përshkrimi i Projektit	Investimi në këtë zonë do ta rriste edhe mirëqenien e qytetarëve. Projekti i propozuar ka qenë në përputhshmëri me projektet e Komunës për zonën e Ulpianës. Realizimi i këtij projekti ka krijuar hapësirë gjelbëruese për banoret e kësaj pjese të qytetit për të kaluar kohën në ambient të hapura.
Outputët / Përfitimet	Rritja e hapësirës gjelbëruese për qytetaret e Prishtinës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	12.06.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	96,581.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.07.2009
Vlera e Kontraktuar	99,980,00€.
Emri i Kontraktonit	NPK "Hortikultura"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	96,581.00 €

Fotot :



Kultivimi i gjelbërimit në lagjen Ulpiana

Komuna	Prishtinës
Titulli i projektit	Rregullimi i terrenit sportiv në fshatin Hajvali
Përshkrimi i Projektit	Ne punët e projektit janë përfshirë shtrimi me zhavorr ,me asfalt në rreth për vrapime si dhe kushtet e nevojshme për funksionimin e këtij tereni .Implementimi i këtij projekti krijoj kushte më të mira për rinin e këtij fshati pasi që me realizimin e këtij projekti,rinia kane ku të kalojnë kohën e lirë duke u marr me aktivitet të ndryshme sportive.
Outputët / Përfitimet	Rezultat i projektit është ndërtimi i terrenit sportiv. Krijimi i kushteve më të mira të aktiviteteve sportive
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	07.08.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	25,000.00 €
Kontrata	
Data e nënshkrimit të kontratës	18.11.2009
Vlera e Kontraktuar	28,967.67 €
Emri i Kontraktonit	Olti Trasing SH.P.K Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	20,333.95 €

Fotot :



Rregullimi i terrenit sportiv në fshatin Hajvali

Komuna	Shtërpce
Titulli i projektit	Rregullimi i ngrohjes, dhe garazheve, ambulancën e mjekësisë familjare në Brod- Shtërpce.
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt ka përfshi rregullimin e oborrit përreth objektit të ndërtuar më parë, pastaj rregullimi i garazhës për vendosje të automjetit. gjithashtu vendosjen e nxehjes në këtë objekt.
Outputtë / Përfitimet	Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar banorët e fshatrave të Brodit dhe të rrethinës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	16.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	12,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	26.06.2009.
Vlera e Kontraktuar	17,070.23 €
Emri i Kontraktorit	EvcomM Tërmo-monting Kaqanik.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	12,000.00€.

Fotot :



Rregullimi i ngrohjes, dhe garazheve, ambulancën e mjekësisë familjare në Brod- Shtërpce

Komuna	Ferizaj
Titulli i projektit	Asfaltimi dhe rregullimi i ujësjellësit dhe kanalizimit Blinisht – Zaskok.
Përshkrimi i Projektit	Projekti parasheh asfaltimin e kësaj rruge në gjerësi 4 metra dhe në trashësi 7 cm. Kjo rrugë është e rëndësishë se veçantë , sepse lehtëson qarkullimin dhe komunikimin e komunitetit të fshatit Zaskok , dhe të fshatrave të tjera të komunës se Ferizajt ,si :Pleshine , Greme dhe Varosh .Gjatësia e rrugës është 1331 m.
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kane përfituar qytetaret e lokaliteteve të lartcekura, ku tash e tutje do të kenë qarkullim me të mire. Me këtë projekt do të përfitonin mbi 200 familje me mbi 1500 banorë të cilat gravitojnë në këtë lagje të fshatit Zaskok dhe qytetaret e fshatrave të tjera me të cilat degëzohet kjo rrugë .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	04.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	100,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Ferizajt
Data e nënshkrimit të kontratës	28.09.2009.
Vlera e Kontraktuar	144,945.12 €
Emri i Kontraktonit	Euro-park Ferizaj.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	100,000.00 €

Fotot :



Asfaltimi dhe rregullimi i ujësjellësit dhe kanalizimit Blinisht – Zaskok.

Komuna	Hani i Elezit
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Përroi i Rrezhancës.
Përshkrimi i Projektit	Kjo lagje përballlet me probleme të mëdha .Nëpër këtë rrugë për në Han të Elezit udhëtojnë për në shkollë 300 nxënës prej para fillorëve e deri të shkollimi i mesëm, punëtorët dhe disa fshatra. Gjatë muajve me të reshura kjo rrugë vërshohet vazhdimisht nga proi i Rrezhancës dhe bëhet e pakalueshme .Gjatësia e kësaj rruge është 600m
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti qytetarët e lagjes Përroi i Rrezhancës e posaçërisht nxënësit të cilët deri me tani kanë hasur ne vështërsi të mëdha.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	04.06.2009..
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	134,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Hani i Elezit.
Data e nënshkrimit të kontratës	07.09.2009.
Vlera e Kontraktuar	208,182.60€
Emri i Kontraktonit	Company Unikom Suha Reka.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	134,000.00€

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Përroi i Rrezhancës.

Komuna	Shtërpce
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Brod.
Përshkrimi i Projektit	Fshati Brod i komunës së Shtërpçës ka rreth 300 familje me rreth 2500 banor. Fshati ballafaqohet me problemet e shumta të cilat janë si rezultati mungesës së infrastrukturës rrugore. Nga ky projekt do të përfitojnë 1200 banor të fshatit Brod dhe kjo do të ofroj për këta banor një qarkullim të lirë dhe pa pengesa në të gjitha stinët. Asfaltimi do të jetë edhe një mundësi më tepër për nxitje të investimeve dhe zhvillimin e bizneseve në këto anë , e në veçanti krijimin e kushteve për zhvillimin e turizmit veror, vend i cili i plotëson kushtet për aktivitet të tilla.
Outputët / Përfitimet	Realizimi i këtij projekti ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në pengimin e shpërnguljes së banorëve të kësaj treve , dukuri kjo e cila ka ndodh si rezultat i mungesës së kushteve për jetë normale.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	24.03.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	299,999.05€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Shtërpçës..
Data e nënshkrimit të kontratës	26.06.009.
Vlera e Kontraktuar	301,192.97 €
Emri i Kontraktonit	N,N,SH “ Lubotëni” Brod.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	299,999.04 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Brod

Komuna	Novo Bërdë.
Titulli i projektit	Ndërtimi i ujësjellësit në Fshatin Tërniqec.
Përshkrimi i Projektit	Fshati Tërniqec gjendet afër rrugës që shpie për Gjilan është i banuar me komunitetin serb , ne këtë fshat mungon furnizimi me ujë dhe i tërë fshati janë të detyruar të furnizohen ne forma të ndryshme nga një burim qe ekziston ne afërsi të fshatit. Projekti përmban ndërtimin e ujësjellësit banuar me komunitetin serb. Ky projekt është parapa të fillon nga marrja e ujit ne burim të fshatit grumbullimin në një kaptazh pastaj me ane të pompave të dërgohet ne një pike tjetër ne rezervuarin kryesor dhe pastaj të kthehet përsëri ne fshat
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar Banorët e fshatit Tërniqec të cilët tash e tutje do të kenë ujë me cilësi të lart
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	19,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Novo Brdes.
Data e nënshkrimit të kontratës	26.06.2009.
Vlera e Kontraktuar	28,220.00€
Emri i Kontraktonit	Infra plus Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	14,110.00 €

Fotot :



Ndërtimi i ujësjellësit në Fshatin Tërniqec.

<i>Komuna</i>	<i>Kaçanik</i>
<i>Titulli i projektit</i>	<i>Ndërtimi i katit të tretë në objektin KK Kaçanik</i>
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt ka për qëllim që të rrisë hapësirën e administratës komunale në mënyrë që të ofrohen shërbime me të mira për qytetaret e Kaçanikut.
Outputtë / Përfitimet	Me realizim të këtij projekti kanë përfituar edhe stafi i cili punon në administratën komunale e që tani ka kushte më të mira për punë, po ashtu përfitues janë edhe qytetaret sepse tani ofrohen shërbime me cilësore nga ana e administratës komunale në Kaçanik.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	04.05.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	90,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	13.07.2009
Vlera e Kontraktuar	94,580.23 €
Emri i Kontraktorit	"Projekt dhe inxhinjering"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	90,000.00€

Fotot :



Ndërtimi i katit të tretë në objektin KK Kaçanik

Komuna	Viti
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Ramnishtë – Begunc.
Përshkrimi i Projektit	Rrugë e pa shtruar e vështirë për lëvizje të lire të qytetarëve dhe automjeteve. Infrastruktura rrugore e cila I lidhë fshatrat e brezit kufitar me Vitinë ne gjatësi prej 7 km, në gjerësi 4m dhe ne trashësi 8cm për 5000 banore të këtyre fshatrave. Rregullimi I kësaj rruge mundëson qarkullimin qytetarëve dhe ju mundëson kyçje edhe në rrugën Viti- Letnicë e në anën tjetër lidhje me qendrën e Vitisë.
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kane përfituar qytetaret e Vitisë sepse tash e tuje do të kenë qarkullim me të lehtë .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	21.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	250,000.00€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Vitis.
Data e nënshkrimit të kontratës	05.08.009.
Vlera e Kontraktuar	278,728.42 €.
Emri i Kontraktonit	NN'Eur-abi" Viti.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	250,000.00€

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Ramnishtë – Begunc.

Komuna	Shtërpçë
Titulli i projektit	Ndërtimi i objektit shëndetësor në fshatin Brod
Përshkrimi i Projektit	Ky projekt ka për qëllim që qytetareve të fshatit Brod të ju ofroj shërbime me të mira shëndetësore.
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar qytetaret e fshatit Brod që tash e tutje do të marrin shërbime shëndetësore me afër.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	12.02.2009.
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	18,067.45 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL-ja
Data e nënshkrimit të kontratës	
Vlera e Kontraktuar	18,067.45 €
Emri i Kontraktorit	"Bedi-Ndrton" Podujevë.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	18,067.45 €

Fotot :



Ndërtimi i objektit shëndetësor në fshatin Brod

Komuna	Mamushë
Titulli i projektit	Ndërtimi i murit mbrojtës përgjatë lumit Topllua-Mamushë
Përshkrimi i Projektit	Qëllimi i këtij projekti është të sigurohej shtrati i lumit, dhe në kohë të reshurave, mos të vijë gjer të vërshimet, me çka do të dëmtoheshin kulturat bujqësore. Gjatësia e këtij muri është 175 metra.
Outputtë / Përfitimet	Në radhë të parë pronarët e tokave pran lumit, pastaj edhe, qytetaret e tjerë të Komunës së Mamushës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	4.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	160,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Mamushës
Data e nënshkrimit të kontratës	.
Vlera e Kontraktuar.	159,577.01 €
Emri i Kontraktonit	Getoari – Prizren.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	159,577.01 €

Fotot :



Ndërtimi i murit mbrojtës përgjatë lumit Topllua- Mamushë

Komuna	Novo Bërdë
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Sallkaj – Abazaj.
Përshkrimi i Projektit	Gjatësia e kësaj rruge është 1.5km dhe gjerësi prej 3m. Numri i banorëve që e shfrytëzojnë këtë rrugë direkt është 500 banor ndërsa indirekt është 300 banor. Situata aktuale e kësaj rruge është mjaft e keqe pasi që në këtë rrugë është intervenuar para gjashtë viteve por për shkak të mirëmbajtjes jo të rregullt ajo tash ka pësuar shumë dëmtime dhe ka nevojë të madhe të bëhet asfaltimi i sajë. Me asfaltimin e kësaj rruge do të lehtësohej ne mase të madhe qarkullimi i këtyre qytetareve.
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kane përfituar qytetaret e këtyre dy fshatrave të cilët tash e tutje do të kenë me të lehtë qarkullimin.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	20.10.2009
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	88,046.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Novo Brdes.
Data e nënshkrimit të kontratës	12.10.2009.
Vlera e Kontraktuar	88,135.00 €
Emri i Kontraktonit	Bejta Company.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	88,046.00 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Sallkaj – Abazaj

Komuna	Kamenicë	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në fshatin Drenoc.	
Përshkrimi i Projektit	Banoret e këtij lokaliteti kanë për prioritet këtë projekt. Aktualisht rruga ekzistuese është me asfalt të dëmtuar i cili duhet larguar dhe shtruar me asfalt të ri.	
Outputtë / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti qytetarët e Drenocit do të kenë infrastrukturë rrugore me kualitative dhe do të kenë me të lehtë qarkullimin për nevojat e tyre të përditshme.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	4.06.2009.	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit		
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	184,195.40 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Kamenicës.	
Data e nënshkrimit të kontratës		
Vlera e Kontraktuar	184,195.40 €	
Emri i Kontraktonit	“Varna Komerc” Kamenic.	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	184,195.00 €	

Fotot :



Asfaltimi i rrugës në fshatin Drenoc.

Komuna	Novobërdë
Titulli i projektit	Ndërtimi i fushës së sportit në sh.f, Minatori Novobërdë.
Përshkrimi i Projektit	Situata aktuale e kësaj shkolle sa i përket zhvillimit të aktiviteteve sportive është shumë e dobët pasi që është shkolla e vetme fillore e cila nuk posedon teren sportiv, ka një numër të madh të nxënësve prej 260 nxënës të cilët e kanë të kufizuar mundësin për zhvillimin e aktiviteteve sportive. Projekti përmban ndërtimin e fushës sportive në shkollën fillore Minatori
Outputët / Përfitimet	Me përfundimin e këtij projekti kane përfituar nxënësit e kësaj shkolle të cilët tash e tutje do të kenë kushte shumë me të mira për zhvillimin e aktiviteteve sportive.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35.000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Novobërdës.
Data e nënshkrimit të kontratës	16.09.2009.
Vlera e Kontraktuar	35,000.00 €
Emri i Kontraktonit	NN SH"CO-Ing" Prishtinë.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	35,000.00 €

Fotot :



Ndërtimi i fushës së sportit në sh.f, Minatori Novobërdë.

Komuna	Kamenicë
Titulli i projektit	Ndërtimi i shkollës dhe ambulancës në Hodec.
Përshkrimi i Projektit	Banoret e këtij lokaliteti kanë për prioritet këtë projekt, shkollën dhe ambulancën në kuadër të objektit shkollor. Banoret e kësaj ane nuk kanë shkollë dhe janë jashtë sistemit të kujdesit shëndetësor. Komuna e Kamenicës i kushton kujdes të posaçme vendbanimeve serbe për integrimin e tyre.
Outputtë / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar nxënësit dhe banorët e fshatit Hodec ku tash e tutje do të kenë shkollën dhe ambulancën e re.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	60,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Kamenicës.
Data e nënshkrimit të kontratës	15.09.2009.
Vlera e Kontraktuar .	60,000.00 €
Emri i Kontraktonit	NN'Beni-Construkcion" Viti.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	60,000.00 €

Fotot :



Ndërtimi i shkollës dhe ambulancës në Hodec.

Komuna	Kamenicë
Titulli i projektit	Sistemi i Ujësjiellësit në fshatin Drenoc
Përshkrimi i Projektit	Në mungesë të sistemit të ujësjiellësit banorët e Drenocit janë të detyruar të shfrytëzojnë ujin nga pusët që nuk kanë ujë të mirë sipas standardeve. Popullata rrezikohet vazhdimisht me përhapjen e epidemive.
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar qytetaret e Drenocit që tash e tutje do të kenë ujë me kualitet me të lart se deri me tani.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	100,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna e Kamenicës.
Data e nënshkrimit të kontratës	4.09.2009.
Vlera e Kontraktuar	84,957.74 €
Emri i Kontraktonit	Ntp- ARTI – Pozharan.
Pagesat	
Vlerat e pagesës	82,483.23 €

Fotot :



Sistemi i Ujësjiellësit në fshatin Drenoc

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	<i>“Asfaltimi i rrugës Vllada Cvetković ne Kodrën e Minatorëve” ne Mitrovicë</i>
Përshkrimi i Projektit	Kodra e Minatorëve është vendbanim specifik në pjesën Veriore të Mitrovicës ku banojnë shqiptarët, serbët, goranët, boshnjakët, turqit , romët etj. Asfaltimi i kësaj pjese të rrugës duhet të bëhet në gjatësi prej 160m. Në këtë rrugë gjatë ditës kalojnë me qindra automjete. Aktualisht në këtë rrugë është duke u ndërtuar muri mbrojtës për shkak të sigurisë së trafikut. Në këtë projekt përfshihen këto punë: shtruarjen me rërë në trashësi prej 35 cm. dhe ngjeshja e saj, dhe përpunimi mekanik i betonit të asfaltit në trashësi prej 4,0 cm etj.
Outputët / Përfitimet	Efikasiteti më i shpejtë i qarkullimit të qytetarëve dhe i mallit, mos shpërngulja banoreve dhe kthimi i të zhvendosurve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	20,001.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.10/2009
Vlera e Kontraktuar	19,945.00 €
Emri i Kontraktorit	“Negbor” Zveqan
Pagesat	
Vlerat e pagesës	19,945.00

Fotot :



Asfaltimi i rrugës Vllada Cvetković ne Kodrën e Minatorëve” ne Mitrovicë

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	<i>“Asfaltimi i rrugës ne mëhallën e Boshnjakeve” ne Mitrovicë</i>
Përshkrimi i Projektit	Lagja e Boshnjakeve është shume specifike sepse në këtë lagje banojnë nacionalitet të ndryshme. Asfaltimi i rrugës ne rrugën Oslobogjenje e cila është e gjatë 880m dhe është arteria kryesore për këtë lagje sepse gjatë ditës aty kalojnë disa mijëra banor të veriut dhe të jugut të Mitrovicës, gjithashtu përmes kësaj rruge zhvillohet tregtia. Furnizimi, transporti dhe punimi i trasesë me rërë në trashësi prej 35 cm dhe ngjeshja e saj si dhe ne fund përpunimi i asfaltit ne mënyre mekanike.
Outputët / Përfitimet	Përmirësimi i kushteve jetësore dhe lëvizja e lirë e qytetarëve në këtë lokalitet.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	69,973,00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.10/2009
Vlera e Kontraktuar	68,844.04 €
Emri i Kontraktonit	“Jasen” Mitrovice
Pagesat	
Vlerat e pagesës	68.844,04 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës ne mëhallën e Boshnjakeve ne Mitrovicë

Komuna	Dragash
Titulli i projektit	"Ndërtimi QMF ne fshatin Bresane" në Dragash
Përshkrimi i Projektit	Objekti shëndetësor qe gjendet ne këtë fshatë është shumë i vjetër, dhe nuk i plotëson as për afërsisht nevojat për hapësira dhe kushtet e domosdoshme për shërbime kualitative. Numri i banoreve që do të ju ofrohet shërbimi mjekësor do të jetë deri 8000 banor.
Outputtë / Përfitimet	Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në mënyre kualitative për banoret e disa fshatrave, si dhe përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore ne vet komunën e Dragashit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	22.05/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	42,504.50 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.07/2009
Vlera e Kontraktuar	69,977.30 €
Emri i Kontraktonit	Sh.P.k"Puna" Dragash
Pagesat	
Vlerat e pagesës	42,504.50 €

Fotot :



Ndërtimi QMF ne fshatin Bresane" ne Dragash

Komuna	Dragash
Titulli i projektit	"Zyra e Vendit në fshatin Brod" në Dragash
Përshkrimi i Projektit	Ne Republikën e Kosovës në zonat rurale, vendbanimet janë të shpërndara dhe lag qendrave komunale dhe institucioneve tjera(ne disa raste kjo largësi është edhe gjere ne 40 km).Kjo gjendje ndikon ne vështirësimin e shfrytëzimit të komunitetit me shërbimet komunale të cilat janë të shumta si: regjistrimet civile, pisja me dokumente të ndryshme , takime pune, dëgjime publike e tjera. Gjithashtu mungon infrastruktura rrugore, shpenzimet e udhëtimit janë të mëdha dhe humbja e kohës.
Outputët / Përfitimet	Ofrimi i shërbime komuna për qytetaret e vetë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	21.05/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	7,495.50 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.10/2009
Vlera e Kontraktuar	31,526.01 €
Emri i Kontraktonit	K.B.K."Kosmaqi" Drenas
Pagesat	
Vlerat e pagesës	4,937.00 €

Fotot :

Komuna	Gjilan
Titulli i projektit	<i>“Rrjeti i pakompletuar i ujësjellësit në Kufc të Epërm” ne Gjilan</i>
Përshkrimi i Projektit	Kufci e Epërme – shtrihet rreth 4 kam në veri të Gjilanit, është vendbanim i tipit të grumbulluar, nr i banoreve është 250 familje me 2500, banorë, problemi me i madhe qe ballafaqohet është mungesa e rrjetit të ujësjellësit të pa përfunduar.
Outputët / Përfitimet	Do të krijohen kushte të mira për banoret e fshatit Kufca e Epërme -Do të zvogëlohen sëmundjet nga epidemitë e ndryshme .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	27,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.10/2009
Vlera e Kontraktuar	31,526.01 €
Emri i Kontraktonit	K.B.K.”Kosmaqi” Drenas
Pagesat	
Vlerat e pagesës	26,999.75 €

Fotot :



Rrjeti i pakompletuar i ujësjellësit ne Kufc të Epërm” ne Gjilan

Komuna	Gjilan
Titulli i projektit	<i>“Hapja dhe ndërtimi i rrugës Llabjan Parallov” në Gjilan</i>
Përshkrimi i Projektit	Hapja e rrugëve të rendit të tret në Komunën e Gjilanit është caktuar prioritet për arsyeje se një numër i konsiderueshëm vendbanimeve rurale janë në kushte të mjerueshme për shkakun e mungesës së hapjes së rrugëve. Fshati Parallov deri me tash i ka takuar komunës së Gjilanit dhe ka qenë në një largësi shumë të madhe nga vet qendra e qytetit dhe nuk është investuar asnjë herë ,ndërsa ky fshat është shumë afër komunës së Novobërdës dhe njëherit bën pjesë në territorin e komunës ku do të ndodhe decentralizimi .
Outputët / Përfitimet	Do ta ndalonim shpërnguljen e fshatarëve drejt qytetit - Efikasiteti më i shpejtë i qarkullimit të qytetarëve dhe i mallit -Arritja me kohë më të shpejtë në qendrën spitalore -Intervenimi më i shpejtë në raste urgjentë -Bartja e të mirave materiale dhe të mirave bujqësore -Mos amortizimi i automjeteve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	66,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.10/2009
Vlera e Kontraktuar	66,006.50 €
Emri i Kontraktonit	Company”Bejta Comerccce”nga Gjilani
Pagesat	
Vlerat e pagesës	60.000,00 €

Fotot :



Hapja dhe ndërtimi i rrugës Llabjan Parallov në Gjilan

Komuna	Klinë
Titulli i projektit	"Kanalizimi fekale ne fshatin Gllarev" Klinë
Përshkrimi i Projektit	Projekti është në strategjinë e zhvillimit ekonomik të komunës për vitin 2009. Ne këtë fshatë problem kryesore është rregullimi i infrastrukturës , pikërisht rregullimi i kanalizimit të ujërave të zeza e cila është ne gjatësi 6500 m.
Outputët / Përfitimet	Eliminimi i sëmundjeve epidemike infektive, përmirësimi i kushteve jetësore si dhe mbrojtja e ambientit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	21.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	200,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	17.03/2009
Vlera e Kontraktuar	196,720.00 €
Emri i Kontraktonit	"Muratori" Drenas
Pagesat	
Vlerat e pagesës	196,720.00 €

Fotot :



Kanalizimi fekale ne fshatin Gllarev Klinë

Komuna	Klinë
Titulli i projektit	<i>“Meremetimi i pjesës se mbetur të objektit të Kryqit të Kuq” në Klinë</i>
Përshkrimi i Projektit	Objekti i kryqit të Kuq është në fazën e ndërtimit. Ndërtimin e këtij objekti (punimet e vrazhda)i ka bërë Kryqi i Kuq i Kosovës ndërsa një pjese të meremetimit të brendshëm e ka bere UNDP dhe Kuvendi Komunal. Projekti parasheh kryerjen e punimeve të mëposhtme: - Punimin e fasadës se objektit. -Punimin e hapësirës se jashtme(parkingjet, stazat,mbjelljen e barit,bimëve dekorative , ndriçimit dhe rrethojën) -punimi i dyshemesë ,vendosja e dyerve,qeramikës sanitaris veshjen e shkalleve të brendshme dhe të jashtme,mbrojtëset e shkalleve etj.
Outputët / Përfitimet	Me këtë projekt përfitojnë të gjithë qytetaret e komunës se Klinës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	07.08/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	45,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.09/2009
Vlera e Kontraktuar	42,665.25 €
Emri i Kontraktonit	N.N.” Shqipërimi” Klinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	42,665.25 €

Fotot :



Meremetimi i pjesës se mbetur të objektit të Kryqit të Kuq” në Klinë

Komuna	Leposaviq
Titulli i projektit	Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Koshtov-Bistricë dhe Ceraj" ne Leposaviq
Përshkrimi i Projektit	Fshatrat Koshtovë, Bistricë dhe Ceraj nuk e kanë të zgjidhur problemin e ujit të pijes .Këto fshatra janë të banuara me popullatë të madhe , kështu që mungesa e ujit të pijes shkakton problem shumë serioz .Problemi i ujit të pijes bie deri të një varg i problemeve tjera siç janë: mungesa e higjienës familjare dhe gjithëmbarshe e banorëve ,ndotja e ambientit edhe ashtu me një shkallë të ndotjes mjaft të madhe në Mitrovicë,mundësia e përhapjes së epidemive,pamundësinë e mbajtjes së higjienës në ekonomit familjare etj.
Outputët / Përfitimet	Furnizimi i mire i qytetarëve me ujë -zvogëlimi i epidemive të ndryshme.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	23.07/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	35,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.08/2009
Vlera e Kontraktuar	303,877.00 €
Emri i Kontraktonit	NTP" Haxha-com"
Pagesat	
Vlerat e pagesës	35,000.00 €

Fotot :



Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Koshtovë - Bistricë dhe Ceraj" ne Leposaviq

Komuna	Gjilan
Titulli i projektit	Ndërtimi i gypit të ujësjellësit në rrugën "Hasan Remniku" në Gjilan
Përshkrimi i Projektit	Duke e pare gjendjen shume të rende të kësaj lagjeje të qytetit të furnizimit me ujë të pijshëm, kemi identifikuar edhe problemet : -lagjja furnizohet me ujë të pijesh nga puse(bunarët) të cilat gjatë stinës se verës (sezoni veror) këto puse shterojnë plotësisht . -uji i shfrytëzuar nga puset nuk trajtohet kimikisht edhe bakteriologjike, prandaj edhe shpesh sjelle edhe epidemi të ndryshme.
Outputët / Përfitimet	Implementimi i këtij projekti do të ndikonte qe kjo lagjeje e qytetit të përfitoj elementin kryesor për jetë normale / ujin e pijshëm / i cili për momentin është njëra ndër problemet kryesore ne këtë lagje të qytetit .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	12.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	70,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.06/2009
Vlera e Kontraktuar	145,674.37 €
Emri i Kontraktonit	KNTSH" Teuta"Gjilani
Pagesat	
Vlerat e pagesës	70,000.00 €

Fotot :



Ndërtimi i gypit të ujësjellësit ne rrugën Hasan Remniku në Gjilan

Komuna	Gjilan
Titulli i projektit	"Asfaltimi i rrugës në fshatin Shillove" ne Gjilan
Përshkrimi i Projektit	Problemet kryesore që sot po ballafaqohet qytetari i komunës sonë janë të shumta, por më prioritare janë problemet në infrastrukturë si : asfaltim i rrugëve të komunës sonë . Rrugët e fshatrave më të mëdha të komunës sonë janë të amortizuara tërësisht nga mos investimi dhe mos mirëmbajtja e tyre me dekada të tëra prandaj kjo kërkon një angazhim më të madh në përmirësimin infrastrukturës e bashkë me të do të përmirësohet edhe jeta në për fshatra të komunës se Gjilanit
Outputët / Përfitimet	Kushtet e transportit për automjetet në rrugë të përmirësuara në parametrat normale · Kushtet për kalimin e kalimtareve të përmirësuara si rezultat i ndërtimit të trotuareve · Ndriçimi i rrugës i përmirësuar · Reduktim i aksidenteve si rezultat i kushteve të këqija të rrugës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	15.09/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	115,212.62 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.11/2009
Vlera e Kontraktuar	109,256.00 €
Emri i Kontraktonit	N.N.T "EuroTrans" nga Gjilani
Pagesat	
Vlerat e pagesës	90,556.00 €

Fotot :



Asfaltimi në fshatin Shillov në Gjilan

Komuna	Gjilani
Titulli i projektit	<i>“Ndërtimi i Zyrave të Vendit ne Pasjak,Zheger dhe Pogragje</i>
Përshkrimi i Projektit	Ofrimi racional dhe i shpejtë i shërbimeve administrative sipas kërkesave të qytetareve përmes Zyrave Pritëse deri me tani ne Komuna janë ngritë Zyrat Pritëse nga donatoret dhe buxheti I DAL. Me ngritjen edhe të këtyre 3(tri) Zyrave Pritëse mbulohet nga një regjion me i madhe. Si rrjedhoje e kësaj krijohet një sistem i shërbimeve me efikas për qytetaret- ku shërbimet qeveritare nuk mund t’u lihen individëve apo sektorit privat.
Outputët / Përfitimet	Qytetaret tani jena ne gjendje me të mire për ti kryer shërbimet e veta ne administratën komunale..
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	10.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	105,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	18.08/2009
Vlera e Kontraktuar	112,972.96 €
Emri i Kontraktonit	MABB Konstrukcion Gjilan
Pagesat	
Vlerat e pagesës	105,000.00 €

Fotot :



Ndërtimi i Zyrave të Vendit ne Pasjak, Zhegër dhe Pogragje

Komuna	Gjilan
Titulli i projektit	<i>“Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Makresh të Epërm” në Gjilan</i>
Përshkrimi i Projektit	Makresh i Epëm – shtrihen 15-16 km ne veri të Gjilanit, janë vendbanime kodrinore malor të ndare ne lagje, projekti i rregullimit të kanalizimit do të krijonte kushte të mira jetësore dhe do të zvogëlonte ne mase të madhe s’mundet dhe epidemitë e ndryshme qe vije nga ujërat e ndotura .Që nga themelimi i Kuvendit Komunal të Gjilanit , roli i qeverisë ka qenë dhe është : të punohet në avancimin e gjendjes së sigurisë , promovimin e tolerancës etnike, fetare, racore, politike, dhe sjellja korrekte ndaj qytetarëve dhe plotësimi efikas i nevojave të tyre.
Outputët / Përfitimet	Do të krijohen kushte të mira për banoret e fshatit Makresh i Epërm -Do të zvogëlohen sëmundjet nga epidemitë e ndryshme .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	86,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	04.06/2009
Vlera e Kontraktuar	52,779.69 €
Emri i Kontraktonit	N.N.P” Art Projekt” nga Gjilani
Pagesat	
Vlerat e pagesës	45,632.43 €

Fotot :



Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit ne Makresh të Epërm ne Gjilan

Komuna	Gjilan
Titulli i projektit	<i>“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit ne Partësh” ne Gjilan</i>
Përshkrimi i Projektit	Ky lokalitet që moti ballafaqohet me problemin e ndërtimit të kanalizimit të ujërave të zeza. Vendimi për investime në sistemin e kanalizimit është shumë i arsyeshëm sepse 5432 banorët e Parteshit janë të rrezikuar nga përhapja e ndonjë sëmundje epidemike sepse mos ekzistenca e sistemit të kanalizimit paraqet rrezik permanent për shëndetin publik. Në sistemin e kanalizimit për ujëra të zeza do të kyçen banoret e Parteshit. Projekti parasheh ndërtimin e kanalizimit për grumbullimin e ujerave të zeza. Me këtë projekt ambienti do të kursehej nga ndotja, pastaj pusët do të ishin të pastërta , si dhe popullata do të ishte me e shëndetshme.
Outputët / Përfitimet	Eliminimi i sëmundjeve epidemike infektive, përmirësimi i kushteve jetësore si dhe mbrojtja e ambientit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	185,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	07.11/2009
Vlera e Kontraktuar	170,729.60 €
Emri i Kontraktonit	N.N.T “Maxhistrallja” nga Gjilani
Pagesat	
Vlerat e pagesës	164,609.60 €

Fotot :



Rregullimi i rrjetit të kanalizimit në Partësh në Gjilan

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve ne fshatin Kushtovë
Përshkrimi i Projektit	Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Koshtove i cili është fshati i dytë për nga madhësia dhe i cili ka mbi 400 familje me mbi 2500 banore. Asfaltimi i kësaj rruge është me se i domosdoshëm për banorët e kësaj ane.
Outputët / Përfitimet	Zgjidhja e problemit të udhëtimit për banoret e kësaj ane, kompletim i infrastrukturës si dhe parandalimi i aksidenteve të shumta qe kane ndodhe deri me tani.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	12.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	70,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.09/2009
Vlera e Kontraktuar	75,528.20 €
Emri i Kontraktonit	Sh.pk. “ Bajraktari” Mitrovice
Pagesat	
Vlerat e pagesës	70,000.00 €

Fotot :



Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve ne fshatin Kushtovë

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	<i>"Rehabilitimi i Shtëpive për rastet sociale në Kodrën e Minatorëve" ne Mitrovicë</i>
Përshkrimi i Projektit	Kodra e Minatorëve është vendbanim i vogël multi-etnik. Ky vendbanim është shumë i ndjeshëm sepse këtu jetojnë shqiptarët, serbët, goranët, boshnjakët ,turqit, romët etj. Ky vendbanim i takon pjesës veriore të Mitrovicës. Ky projekt do ti plotëson nevojat e 10 familjeve nevojtare për banim. Këto familje janë të nacionaliteteve të ndryshme. Në këtë projekt përfshihen këto punë:punët e dyshemesë, punët e kulmit, rregullimi i mureve, ndërrimi i dyerve dhe dritareve, rregullimi i banjove në tërësi dhe rregullimi i rrjetit elektrik.
Outputët / Përfitimet	Përfituesit e drejtpërdrejtë banorët me nevoja sociale të kësaj treve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,024.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.10/2009, 08.12/2009
Vlera e Kontraktuar	49,611.10 €
Emri i Kontraktonit	PP "Univerz" Mitrovicë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	49,611.10 €

Fotot :



Rehabilitimi i Shtëpive për rastet sociale në Kodrën e Minatorëve në Mitrovicë

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	<i>“Rehabilitimi i objekteve banesore i cili gjinden ne rrugën Oslobogjenje ne mëhallën e Boshnjakeve” ne Mitrovicë</i>
Përshkrimi i Projektit	Lagja „ Mëhalla e boshnjakëve" është specifike sepse ne të jetojnë 3000 banor të të gjitha nacionaliteteve d.m.th kjo lagje është shumë e ndejshme për arsye se në të jetojnë: shqiptarët, serbët, goranët, boshnjakët, turqit, romët etj. Në këtë ndërtesë jetojnë 8 familje me gjithsej 40 anëtar të gjitha nacionaliteteve . Andaj për të ju ofruar kushte sa me të mira këtyre banoreve duhet të behet rehabilitimi i kësaj ndërtese. Projekti përfshin këto pune: heqja e kulmit të vjetër dhe vendosja e kulmit të ri, ndërrimi i mallterit në ndërtesë, ndërrimi i dritareve dhe dyerve, elektro instalimi, betonimi i trotuarit etj.
Outputët / Përfitimet	Kushte të mira për të gjitha nacionalitetet qe jetojnë këtu.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës-anex kontrata	22.10.2009; 08.12.2009
Vlera e Kontraktuar	43,513.80 €
Emri i Kontraktonit	PGP“Kollashin” Mitrovice
Pagesat	
Vlerat e pagesës	43,513.80 €

Fotot:



Rehabilitimi i objekteve banesore i cili gjinden ne Rrugën Oslobogjenje ne mëhallën e Boshnjakeve ne Mitrovicë

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	"Ujësjetllësi ne fshatin Kodër" në Mitrovicë
Përshkrimi i Projektit	Mungesa e ujit të pijshëm në fshatrat Shupkovce dhe Kodër të banuar me mbi 350 shtëpi dhe afër 4000 banore si dhe mundësia e përhapjes së sëmundjeve epidemike kanë ndikua që qeveria lokale të përcaktohet për këtë projekt që banoret të furnizohen me ujë të pijshëm dhe të pastër për përdorim. Ndërtimi i një rezervuari për grumbullimin e ujit si dhe ndërtimi i gypit shtytës dhe rrjetit të shpërndarjes së ujit si dhe ndërtimi i stacionit të pompave e pastaj shpërndarjen e të njëjtit neper lagje.
Outputët / Përfitimet	Si rezultat i këtij projekti do të kemi furnizimin e popullatës me ujë të pijshëm si dhe zvogëlimin e mundësive të përhapjes së ndonjë sëmundje infektive në këtë fshat si dhe zvogëlimin e migrimit të popullatës fshat qytet.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	08.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	145,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës	07.10/2009
Vlera e Kontraktuar	124,573.80 €
Emri i Kontraktonit	NTP " Ideali" Mitrovicë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	105,887.73 €

Fotot :



Ujësjetllësi në fshatin Kodër në Mitrovicë

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	"Rregullimi i varrezave të qytetit" në Mitrovicë
Përshkrimi i Projektit	Varrezat e qytetit janë ndërtuar pas luftës, aty bëjnë pjesë: varrezat e dëshmorëve, varrezat e njerëzve meritore dhe varrezat e përgjithshme të myslimanëve. Për këtë projekt Kuvendi Komunal ka ndarë mjetë deri sa ka ardhur në nivelin e tanishëm të ndërtimit, por për ta rrumbullakuar këtë projekt madhor nevojiten edhe disa punë shtesë të cilat do të kompletin projektin. Rregullimi definitiv i infrastrukturës, rrethoja e tërësishme, ndërtimi i një vendi ku do të mund të vendosej përkohësisht kufoma, si dhe asfaltimi i rrugës nëpër pjesët ku ato ekzistojnë në varreza, rregullimi i kanalizimit vërshues në rrugët e ndërtuara si dhe vendosja e ndriçimit publik në varreza.
Outputët / Përfitimet	Qytetaret tani kushte më të mira për të kryer ceremonitë mortore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	03.03/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	91,103.38 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	18.05/2009
Vlera e Kontraktuar	90,806.25 €
Emri i Kontraktorit	Sh.p.k. " Avduli " Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	90,806.25 €

Fotot :



Rregullimi i varrezave të qytetit në Mitrovicë

Komuna	Mitrovica
Titulli i projektit	<i>“Ndërtimi i sistemit të Ujësjetës në fshatin Vaganicë” Mitrovicë</i>
Përshkrimi i Projektit	Fshati Vaganicë që ka nevojë për këtë projekt është me numër prej 150 shtëpive dhe me afër 1000 banorë ku mungon uji i pijshëm. Ky projekt ka nevojë për punimet përgatitore, trasimi dhe incizimi gjeodezik, prerja e asfaltit, gërmimi i dheut, mbulimi i kanalit. Montimi i gypave si dhe blerja e rezervarëve.
Outputët / Përfitimet	Zgjedhja e problemit të ujit të pijshëm për banorët e Vaganicës si dhe parandalimi i sëmundjeve dhe epidemive eventuale.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	12.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	52,449.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.10/2009
Vlera e Kontraktuar	69,881.59 €
Emri i Kontraktorit	NN“Haxha com”Skenderaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	49,881.54 €

Fotot :



“Ndërtimi i sistemit të Ujësjetës në fshatin Vaganicë” Mitrovicë

Komuna	Skenderaj
Titulli i projektit	"Ndërtimi i Objektit të Administratës Komunale" në Skenderaj
Përshkrimi i Projektit	Gjendja e Objektit të KK Skenderajt nuk është e mire, pasi që në mungesë të hapësirës së nevojshme janë të shpërndara në disa objekte të cilat nuk i plotësojnë as kushtet minimale për kryerjen e shërbimeve ndaj qytetareve. Projekti duhet të realizohet me të gjitha fazat e nevojshme në të cilat do të parashihet i gjithë funksioni përkatës për kryerjen e shërbimeve sa me efikase
Outputët / Përfitimet	Përmirësimi i kushteve për punë, shërbime efikase për qytetarë e komunës së Skenderajt.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	16.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	200,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.09.2009
Vlera e Kontraktuar	1,840,157.24 €
Emri i Kontraktonit	NN" Valoni" -Skenderaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	200,000.00 €

Fotot :



Ndërtimi i Objektit të Administratës Komunale në Skenderaj

Komuna	Gjilan
Titulli i projektit	<i>“Përfundimi i objektit të shtëpisë e kulturës në Stanishor” ne Gjilan</i>
Përshkrimi i Projektit	Në komunën e Gjilanit janë 16 fshatra ku jetojnë pjesëtarët e bashkësisë etnike Serbe. Kjo është njëra prej bashkësive më të mëdha pasi në këtë komunë jetojnë edhe pjesëtarët e grupeve tjera etnike siç janë Turqit dhe Romët. Serbët jetojnë në 12 fshatra etnikisht të pastra (Pasjani, Budriga e Poshtme, Parteshi, Parallovë, Koretishtë, Stanishori, Strazhë, Makreshi i Epërm, Draganaci, Mozgovë, Kufcë e Epërme dhe Shillovë. Stanishor – shtrihet rreth 4 km ne veri të Gjilanit.
Outputët / Përfitimet	Me realizimin e tij krijohen kushte normale që të rinjtë të kenë mundësi të shprehin talentin e tyre për aktivitetet kulturore dhe për zhvillimin e aktiviteteve të lira. - Gjithashtu do të shfrytëzonin më racionalist kohën e lirë dhe do të shoqëroheshin më të për mes veti.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	63,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.08/2009
Vlera e Kontraktuar	69,697.30 €
Emri i Kontraktonit	N.N.P”Perspektiva” Kamenice
Pagesat	
Vlerat e pagesës	48,758.10 €

Fotot :



Përfundimi i objektit të shtëpisë së kulturës ne Stanishor ne Gjilan

Komuna	Vushtrri
Titulli i projektit	<i>"Asfaltimi i rrugës në fshatin Maxhunaj lagjeja Qelaj" në Vushtrri</i>
Përshkrimi i Projektit	Aktualisht kjo rrugë tani është jo e mirë, janë krijuar gropa të mëdha që pamundësojnë qarkullimin e lirë të automjeteve dhe iu vështirësojnë jetën banorëve të fshatit Maxhunaj .Vështirësi në qarkullim banorët e këtyre pjesëve kanë sidomos gjatë dimrit. Për realizimin e këtij projekti duhet të bëhen: furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e tamponit, gërmimi i kanalit për largimin e ujërave atmosferik, furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit, etj.
Outputët / Përfitimet	Banoret e këtij lokalitetit do ta kenë me të lehtë qarkullimin e tyre.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	30.10/2009
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	5,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës-aneks kontrata	11.12/2009
Vlera e Kontraktuar	4,912.00 €
Emri i Kontraktonit	NTP"Burimi"Kaçanik
Pagesat	
Vlerat e pagesës	4,912.00 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës në fshatin Maxhunaj lagjja Qelaj në Vushtrri

Komuna	Vushtrri
Titulli i projektit	<i>“Asfaltimi i rrugës ne fshatin Druar lagjeja Gecaj” ne Vushtrri</i>
Përshkrimi i Projektit	Gjendja aktuale e kësaj rruge tani është jo e mirë, janë krijuar gropa të mëdha që pamundësojnë qarkullimin e lirë të automjeteve dhe iu vështirësojnë jetën banorëve të fshatit Druar .Vështirësi në qarkullim banorët e këtyre pjesëve kanë sidomos gjatë dimrit. Për realizimin e këtij projekti duhet të bëhen këto pune:Incizimi i terenit, gërmimi me makina planifikimi dhe ngjeshja e trupit të rrugës, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e tamponit, gërmimi i kanalit për largimin e ujërave atmosferik, furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit.
Outputët / Përfitimet	Banoret e këtij lokalitetit do ta kenë me të lehtë qarkullimin e tyre.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	30.10/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	10,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	28.10/2009
Vlera e Kontraktuar	269,524.50 €
Emri i Kontraktonit	NPSH”Bageri”-Ferizaj
Pagesat	
Vlerat e pagesës	10,000.00 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës në fshatin Druar lagjja Gecaj në Vushtrri

Komuna	Vushtrri
Titulli i projektit	<i>“Asfaltimi i rrugës në fshatin Mihaliq” ne Vushtrri</i>
Përshkrimi i Projektit	Është rrugë e pa asfaltuar, ne mase të rënde e shkatërruar. Pas reshjeve atmosferike në këtë rrugë behet baltë e madhe gjë që e pengon shume lëvizjen e nxënëseve, banoreve dhe të automjeteve të asaj ane. Objektiv i këtij projekti është qe të behet asfaltimi i rrugës si dhe të kryhen punimet sipas parallogarisë dhe paramanës.
Outputtë / Përfitimet	Asfaltimi i kësaj rruge do të përmirëson kushtet për qarkullimin e lirë të nxënëseve dhe të banoreve të tjerë,si dhe do të lehtëson qarkullimin e automjeteve me më pak shpenzime dhe prishje.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit	12.05/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit	
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL	100,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.06/2009
Vlera e Kontraktuar	146,004.03 €
Emri i Kontraktonit	NTP” Burimi”Sh.pk. Kaçanik
Pagesat	
Vlerat e pagesës	100,000.00 €

Fotot :



Asfaltimi i rrugës në fshatin Mihaliq në Vushtrri

Komuna	Vushtrri
Titulli i projektit	<i>“Pajisje me mjetë të domosdoshme të punës për drejtorin komunale për mbrojtje dhe shpëtim dhe teknologji informative ” ne Vushtrri</i>
Përshkrimi i Projektit	Komuna e Vushtrrisë ka pasur mungese të pasjeve për shpëtim ne raste emergjentë , dhe është ndie nevojë qe të pajiset me këtë teknologji. Gjithashtu komuna ka pasur mungese edhe të IT për nevoja të zyrtareve komunal.
Outputët / Përfitimet	Në komunën e Vushtrrisë tani janë të siguruar mjetë e domosdoshme të shpëtimit në rast emergjence,zyrtaret e komunës të cilët punojnë në IT,janë në avancimin e teknologjisë informative.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	17.07/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	23,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.10/2009
Vlera e Kontraktuar	18,042.38 €
Emri i Kontraktonit	NPSH”Elting-elektronik”- Prishtinë
Pagesat	
Vlerat e pagesës	18,042.38 €

Fotot :



Pajisje me mjetë të domosdoshme të punës për drejtorinë komunale për mbrojtje dhe shpëtim dhe teknologji informative në Vushtrri.

Lista me Projektet e komunave të financuara nga MAPL per vitin 2009

Nr.	KOMUNA	EMRI I PROJEKTIT	FINANCIMI NGA MAPL	Fondi i financimit	Vlera e kontrates	Zotimi i mjeteve	Pagesat
1	MALISHEVË	Ndërtimi i objektit te shkollës fillore ne Terpeze	139,883.61	Granti i stimulimit	339,726.94	139,883.61	139,883.61
2	PEJË	Ndërtimi i rrugës UÇK me dy korsi	450,000.00	Bashkfinancimi me IPA	1,469,000.00	450,000.00	450,000.00
3	PEJË	Rregullimi i hapësirës gjelbëruese te parkut kalaja dhe karagaqi	100,000.00	Bashkfinancimi me IPA	69,298.60	100,000.00	99,075.60
4	DEÇAN	Asfaltimi i rrugëve ne lagjen Gecaj ne fshatin Llukë e ulet	49,983.00	Rrjeti i MAPL	36,326.20	49,983.00	39,876.20
5	DEÇAN	Rekonstruimi i rrugës Qendra e Deçanit- Carrabreg(faza e I-rë)	100,000.00	Granti i stimulimit	283,803.18	100,000.00	100,000.00
6	DEÇAN	Asfaltimi i rrugës Pozhar-Kodrall-Irznig- Prapaqan-Isniq-Strellc-Lybeniq (Faza e I-rë)	120,000.00	Granti i stimulimit	277,744.00	120,000.00	120,000.00
7	SUHAREKË	Ndërtimi i trotuareve ne rrugën Hajdin Berisha- Skenderbeu	102,000.00	Rrjeti I MAPL	91,575.70	102,000.00	102,000.00
8	SUHAREKË	Rruga Mohlan - Krushicë	150,000.00	Granti i stimulimit	335,834.82	150,000.00	149,999.97
9	SUHAREKË	Rregullimi i rrugës në fshatin Mushtisht	50,000.00	Granti i stimulimit	131,829.22	50,000.00	50,000.00
10	SUHAREKË	Vazhdimi i rrjetit te kanalizimit ne fshatin Doberdolan	34,000.00	Granti i stimulimit	339,999.99	34,000.00	33,999.99

11	SUHAREKË	Rruga Semetisht -Nishor (Faza e II)	166,000.00	Granti i stimulimit	193,932.69	166,000.00	166,000.00
12	ISTOG	Asfaltimi i rruges Surigane -Cerkoles -Kujavc	310,000.00	mjetet me rishikim	310,000.00	310,000.00	310,000.00
13	ISTOG	Kanalizimi fekal në fshatin Vrellë - Studenicë	367,130.00	Bashkfinancimi me IPA	367,130.00	367,130.00	367,130.00
14	ISTOG	Asfaltimi i dhe kubzimi I rruges kopshti i fëmijëve Shkolla - Qendër ne Gurakoc	100,000.00	Granti i stimulimit	99,279.00	100,000.00	99,279.00
15	ISTOG	Asfaltimi i rrugës në qendren urbane Banjë	100,000.00	Granti i stimulimit	114,250.00	100,000.00	100,000.00
16	FUSHË KOSOVË	Asfaltimi i rrugëve lokale në Fushë Kosovë	200,000.00	Granti i stimulimit		200,000.00	200,000.00
			150,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	384,308.50	150,000.00	149,942.55
17	JUNIK	Ndërtimi i objektit të administratës Komunale(faza I-rë)	300,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	268,819.47	300,000.00	161,291.67
18	ZVEQAN	Ndërtimi i rrjetit elektrikë për Lagjen Ukaj-Fshati Lipë	75,000.00	mjetet me rishikim	74,888.00	75,000.00	74,888.00
19	SHTIME	Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekal dhe rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime	450,000.00	Bashkfinancimi me IPA	499,957.09	450,000.00	450,000.00
20	PODUJEVË	Asfaltimi i rrugës Dumnicë-Llaushë	450,000.00	Bashkfinancimi me IPA		469,000.00	469,878.00
			10,000.00	Subvecione dhe transfere	553,334.21	10,000.00	10,000.00
21	PODUJEVË	Ndërtimi - asfaltimi I rrugës Letanc - Bajqinë	246,000.00	Granti i stimulimit	397,873.46	246,000.00	123,000.00
22	PRIZREN	Ndertimi i rruges Jashar Salihu" Prizren	40,000.00	mbetja e mjeteve	70,818.68	40,000.00	40,000.00
23	PRIZREN	Ndertimi i zyres së vendit -Zhur	35,000.00	Zyrat e vendit	33,553.23	35,000.00	13,421.29

24	PRIZREN	Paisja me inventar e qendres së kulturës në Gjonaj	72,599.00	Granti i stimulimit	72,599.00	72,599.00	72,599.00
25	PRIZREN	Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi (1,2,3)4	85,403.45	Bashkfinancimi me IPA	85,403.55	85,403.45	85,403.45
26	RAHOVEC	Kanalizimi fekal në fshatin Çiflak	100,000.00	Granti I stimulimit		100,000.00	99,999.96
			30,000.00	Zyrat e vendit	142,820.19	30,000.00	30,000.00
27	RAHOVEC	Meremetimi I ndertesës së KK.Rahovec	20,000.00	Zyrat e vendit	19,977.83	20,000.00	19,977.83
28	OBILIQ	Ndertimi i kanalizimit fekal në lagjen e re në Milloshevë	37,061.15	Granti i stimulimit	37,061.15	37,061.15	36,412.58
29	OBILIQ	Ndërtimi i rrugës në fshatin Sibofc lagja "Kelmendi"	103,163.58	Granti i stimulimit	105,001.10	106,019.30	103,163.58
30	OBILIQ	Ndertimi i kanalizimit fekal në fshatin Lulgjak	35,667.72	Granti i stimulimit	33,122.39	35,667.72	35,657.72
31	OBILIQ	Sistemi i ujësjellësit në fshatin Sibofc	116,205.00	Granti i stimulimit	116,205.00	116,205.00	114,171.41
32	GLLOGOVC	Kanalizimi në Gllobar	98,000.00	Granti i stimulimit	98,793.01	98,000.00	98,000.00
33	GLLOGOVC	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nekoc".	30,000.00	Subvecione dhe transfere	49,185.77	30,000.00	30,000.00
34	GLLOGOVC	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Tërstenik".	50,000.00	Subvecione dhe transfere	43,075.66	50,000.00	43,075.65
35	LIPJAN - GRAQANICË	Rrjeti i ujësjellësit në fshatin Livagj dhe Dobratin	180,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	178,695.00	180,000.00	178,695.62
36	PRISHTINA	Asfaltimi i rrugeve ne Keqekolle lagja Spahiu dhe Kurtaj	125,489.12	mbetja e mjeteve		125,489.12	125,489.12
			11,907.62	Subvecione dhe transfere	137,304.31	11,907.62	11,907.62

37	PRISHTINA- GRAQANICË	Asfaltimi i rrugës Graqanicë - Llapllasellë	642,218.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	642,281.47	642,218.00	256,887.39
38	PRISHTINA	Kultivimi i gjelberimit ne lagjen Ulpiana	96,581.00	Bashkfinancimi me IPA	99,980.00	96,581.00	96,581.00
39	PRISHTINA	Ndertimi i fushes sportive ne fshatin hajvali	25,000.00	Subvecione dhe transfere	28,967.67	25,000.00	20,333.95
40	SHTËRPECË	Rregullimii i oborrit, nxemjes dhe garazhes se ambulantes se mjeksise familjare ne fshatin Brod	12,000.00	Rrjeti I MAPL	9,711.50	12,000.00	12,000.00
41	FERIZAJ	Asfaltimi dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në lagjen Blinishti - Zaskok	100,000.00	Granti i stimulimit	144,945.12	100,000.00	100,000.00
42	HANI I ELEZIT	Asfaltimi ne rrugen e re prroji i Roxhanes	134,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	208,182.60	134,000.00	134,000.00
43	SHTËRPECË	Ndertim i rruges ne fshatin BROD	299,999.05	Bashkfinancimi me IPA	301,192.97	299,999.05	299,999.04
44	NOVOBËRD Ë	Ndertimi i ujësjellësit në fshatin Tërniqec	19,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	28,220.00	19,000.00	14,110.00
45	KAÇANIK	Ndertimi i katit te trete ne objektin KK Kaqanik	90,000.00	Subvecione dhe transfere	94,580.23	90,000.00	90,000.00
46	VITI	Asfaltimi I rrugës Ramnishtë - Beguncë	250,000.00	Granti i stimulimit	278,728.42	250,000.00	250,000.00
47	SHTËRPECË	Ndërtimi i objektit shëndetësor në fshatin Brod	18,067.45	Granti i stimulimit	18,067.45	18,067.45	18,067.45
48	MAMUSHË	Vazhdimi i ndertimit të murit mbrojtës përgjat lumit Topllua	160,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	154,592.01	160,000.00	159,577.01
49	NOVOBËRD Ë	Asfaltimi i rrugës Sallkaj-Abazaj	88,046.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	88,135.00	88,046.00	88,046.00
50	KAMENICË- RANILLUK	Asfaltimi i rrugës Drenoc	184,195.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	184,195.40	184,195.00	184,195.00

51	NOVOBËRD Ë	Ndertimi i fushës sportive në SH.F. „Minatori"	35,000.00	Fondi kontigjent per komonat e reja	31,971.30	35,000.00	35,000.00
52	KAMENICË- RANILLUK	Shkolla dhe ambulanca në Hodec (nje objekt)	60,000.00	Fondi kontigjent per komonat e reja	54,323.67	60,000.00	60,000.00
53	KAMENICË- RANILLUK	Sistemi i ujësjellësit në Drenoc	100,000.00	Fondi kontigjent per komonat e reja	84,957.74	100,000.00	82,483.23
54	MITROVICË E VERIUT	asfaltimi i rruges ne Vllada Cvetkovic ne kodrene Minatoreve	20,001.00	Fondi kontigjent per komonat e reja	19,945.00	20,001.00	19,945.00
55	MITROVICË E VERIUT	Asfaltimi i rrugeve ne mahallen e boshnjakve	69,973.00	Fondi kontigjent per komonat e reja	68,844.00	69,973.00	68,844.00
56	DRAGASH	Ndërtimi I QMF në fshatin Bresanë	42,504.50	Subvecione dhe transfere	69,977.30	42,504.50	42,504.50
57	DRAGASH	Zyra e vendit në fshatin Brod-Dragash	7,495.50	Zyrat e vendit	31,524.00	7,495.50	4,937.00
58	GJILAN- NOVOBËRD	Rrjeti i pakompletuar i ujësjellësit Kufcë e Epërme	27,000.00	Fondi kontigjent per komonat e reja	31,526.01	27,000.00	26,999.75
59	GJILAN - NOVOBËRD	Hapja dhe ndertimi i rrugës Llabjan-Parllovë	66,000.00	Fondi kontigjent per komonat e reja	60,006.60	66,000.00	60,000.00
60	KLINË	Kanalizimi i ujërave fekale në Gllarevë	196,720.00	Granti i stimulimit	196,720.00	196,720.00	196,720.00
61	KLINË	Meremtimi i pjeses se mbetur teobjektit te kryqit te kuq ne Kline	45,000.00	mjetet me rishikim	38,186.25	45,000.00	42,665.25
62	LEPOSAVIQ	Ndertimi I ujësjellësit për fshatrat Koshtovë, Bistricë dhe Ceraj	35,000.00	Granti i stimulimit	303,877.00	35,000.00	35,000.00
63	GJILAN	Ndërtimi i gypit të ujësjellësit në rrugën Hasan Remniku lagjeja Qarku	70,000.00	Rrjeti i MAPL	145,674.37	70,000.00	70,000.00
64	GJILAN	Asfaltimi i rruges ne fshatin Shillove	115,212.62	Rrjeti I MAPL	109,256.00	115,212.62	90,556.00

65	GJILAN	Ndertimi i zyres së vendit-Zheger	35,000.00	Zyrat e vendit	112,921.96	105,000.00	105,000.00
		Ndertimi i zyres së vendit-Pograxh	35,000.00	Zyrat e vendit			
		Ndertimi i zyres së vendit-Pasjak	35,000.00	Zyrat e vendit			
66	GJILAN - NOVOBËRD	Rrjeti i kanalizimit Makresh I Epërm	86,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	52,000.00	86,000.00	45,632.43
67	GJILAN- PARTESH	Rregullimi i rrjetit të kanalizimit në Partesh	185,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	170,200.00	185,000.00	164,609.60
68	MITROVICË	Ndërtimi dhe asfaltimi I rrugëve për fshatin Kushtovë - Mitrovicë	70,000.00	mjetet me rishikim	70,528.20	70,000.00	70,000.00
69	MITROVICË E VERIUT	rehabilitimi i shtepive per raste sociale ne kodren e Minatoreve	50,024.20	Fondi kontigjent per komunat e reja	45,101.00	50,024.20	49,611.10
70	MITROVICË E VERIUT	Rehabilitimi i objektit banesor ne rrugen oslogogjenje ne mahallen e boshnjakve	50,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	39,558.00	50,000.00	43,513.80
71	MITROVICË E JUGUT	Ujësjiellësi për fshatin Kodër	145,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	125,573.80	145,000.00	105,887.73
72	MITROVICË	Rregullimi i varrezave te qytetit	91,103.38	Bashkfinancimi me IPA	90,806.25	91,103.38	90,806.25
73	MITROVICË	Ndërtimi I sistemit të ujësjiellësit për fshatin Vaganicë	52,449.00	Rrjeti I MAPL	69,881.59	52,449.00	49,881.54
74	SKENDERAJ	Ndërtimi I objektit të administratës Komunale	200,000.00	Granti i stimulimit	1,840,157.24	200,000.00	200,000.00
75	GJILAN - NOVOBËRD	Përfundimi i objektit të shtëpisë së kulturës - Stanishor	63,000.00	Fondi kontigjent per komunat e reja	69,697.30	63,000.00	48,758.10
76	VUSHTRRI	Asfaltimi I rruges ne fshtain Magjunaj lagja Qelaj	5,000.00	Subvecione dhe transfere	4,912.00	5,000.00	4,912.00

77	VUSHTRRI	Asfaltimi I rruges ne fshatin Druar lagja Gecaj	10,000.00	mbetja e mjeteve	269,524.50	10,000.00	10,000.00
78	VUSHTRRI	Asfaltimi I rrugës në fshatin Mihaliq	100,000.00	Subvecione dhe transfere	146,004.03	100,000.00	100,000.00
79	VUSHTRRI	Paisje me mjete te domozdoshme te punes per drejtorin komunale per mbrojte dhe shpetim dhe teknologji informative	18,042.38	Subvecione dhe transfere	18,044.38	18,042.38	18,042.38
80	GJILAN	Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Cerrnicë	68,301.38	Granti i stimulimit		68,301.38	68,301.38
81	GJILAN	Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Koretishte	36,572.50	Granti i stimulimit		36,572.50	36,572.50
82	KAMENICË-RANILLUK	Renovimi i kulmit ne Ranillug	6,874.40	Fondi kontigjent per komunat e reja		6,874.40	6874.4
83	ZUBIN POTOK	Asfaltimi I rruges Çaber - Vinarc I Ulet	35,000.00	Granti i stimulimit	369,560.05	35,000.00	34,945.00
Totali			9,799,607.33			9,799,607.33	8,927,126.00
