



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti për Bashkëpunim dhe Zhvillimit Regjional

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2019**


Mars 2020

Përmbajtja:

SHTËRPCE	4
Rregullimi i kanalit dhe trotuarit ne Brezovicë	4
OBILIQ	5
Rregullimi i rrugëve në Plemetin	5
OBILIQI	6
Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri” - “Obilqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti” - “Kadri Pllana”	6
HANI ELEZIT	7
Ndërtimi (rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të Elezit	7
HANI ELEZIT	8
Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve lokale	8
KAÇANIK	9
Rregullimi I ndriçimit publik	9
KAÇANIK	10
Rregullimi dhe asfaltimi I rrugëve në qytet	10
GLLOGOVC	11
Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavicës	11
GLLOGOVC	12
Asfaltimi I rrugës Gllanasellë - Godanc, Faza e dytë	12
GLLOGOVC	13
Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Verbovc dhe Polluzhë, faza e dytë	13
GJAKOVË	14
Renovimi i Bibliotekës ndër komunale "Ibrahim Rugova"	14
JUNIK	15
Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes	15
DEÇAN	16
Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg	16
RAHOVEC	17
Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit	17
VUSHTRRI	18
Zgjerimi I rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë	18
VUSHTRRI	19
Instalimi i kamerave në qytet	19
PEJË	20
FERIZAJ	21
Rregullimi I parkut dhe këndit të lojërave në zonën rekreativ o - sportive në Komunën e Ferizajt	21
ISTOG	22
Asfaltimi I rrugëve “Bekim Fehmiu” dhe “Arben Januzaj”	22
FUSHË KOSOVË	23
Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të madhe	23
SUHAREKË	24
Ndërtimi i Parqeve në Komunë	24
MALISHEVË	25
Renovimi i objektit të administratës të Komunës	25
LIPJAN	26
Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan	26
LIPJAN	27
Kiosqet në tregun e gjelbër t në Lipjan	27
KLLOKOT	28
Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit	28
KLLOKOT	29
Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit - faza e dytë	29
PARTESH	30
Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe rregullimi i pllatos para ndërtesës	30
PARTESH	31
Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme	31
VITI 32	
Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë	32

VITI 33	
Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së Vitisë	33
KAMENICË	34
Renovimi i objektit shkollor me qëllim për destinimin për objekt parashkollor	34
RANILLUG	35
Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së Ranillugut	35
PRIZREN	36
Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash	36
MAMUSHË	37
Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamushë	37
DRAGASH	38
Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për udhëtarët e linjave urbane dhe ndër urbane, largimi dhe sistemimi i deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Dragashit	38
SHTIME	39
Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit	39
GRAÇANICË	40
Ndërtimi i objekteve për banim social në Graçanicë	40
GJILAN	41
Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave atmosferike në rrugën “28 NËNTORI”	41
GJILAN	42
Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit	42
KLINË	43
Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës	43
KLINË	44
Rehabilitimi i shtratit të lumit Istog	44
MITROVICË E VERIUT	45
Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV	45
MITROVICË E VERIUT	46
Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjesë të parterit – qasjes të objekteve të banimit në rrugën Kralja Petra I 102-108 në Mitrovicë e Veriut	46
MITROVICË E VERIUT	47
Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën “Kralj Petri” dhe “Ivo Lolla Ribar” në Mitrovicën e Veriut	47
MITROVICË E VERIUT	48
Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës së M.V.	48
MITROVICË E VERIUT	49
Pajisje për përkthim simultan	49
ZVEQAN	50
Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv” dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu	50
ZVEQAN	51
Furnizimi i pompave për ujësjellës lagja Zveçan i Vogël	51
ZUBIN POTOK	52
Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës sportive në Zubin Potok	52
ZUBIN POTOK	53
Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve të dheut në aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore “Petar Kocic” në fshatin Bërnjak	53
LEPOSAVIQ	54
Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në Leposaviq	54
PODUJEVË	55
Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap	55
MITROVICË E JUGUT	56
Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushac	56
PRISHTINË	57
Rigjenerimi urban i lagjeve të kryeqytetit	57
SKËNDERAJ	58
Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit	58
NOVOBËRDË	59
Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energjizimi i pikës grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë), Komuna e Novobërdë	59
Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2019	61

Komuna përfituese	SHTËRPCE	
Titulli i projektit	Rregullimi i kanalit dhe trotuarit ne Brezovicë	
Përshkrimi i projektit	Është punuar kanali i hapur për ujëra atmosferik dhe trotuari në dy anët e rrugës në Brezovicë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		27.02.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		29,569.81€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		08.08.2019
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		29,569.81€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		29,569.81€

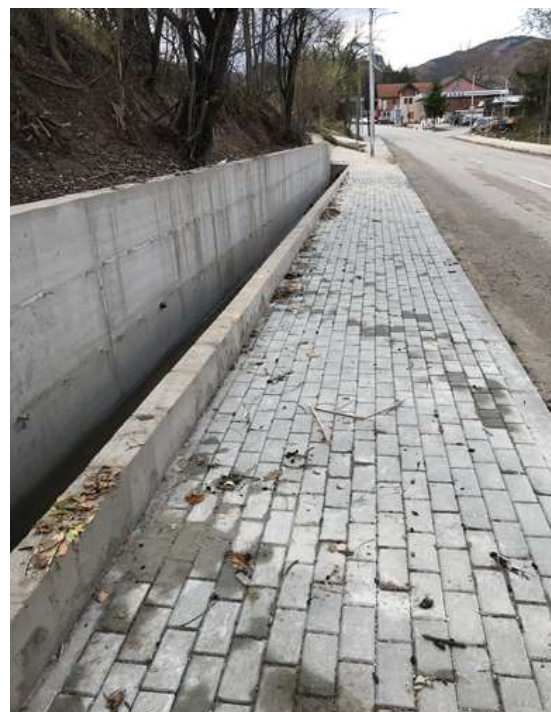



Komuna përfituese	OBILIQ	
Titulli i projektit	Rregullimi i rrugëve në Plemetin	
Përshkrimi i projektit	Është bërë rregullimi i 4 rrugëve me zhavorr dhe një rrugë me asfalt në fshatin Plemetin.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.02.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	45,668.84 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	30.08.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	45,668.84 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	45,668.84 €	



Komuna përfituese	OBILIQI	
Titulli i projektit	Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri”-“Obiliqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti”-“Kadri Pllana”	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Obiliqit është bërë ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik me drita LED dhe punimi i trotuarit me kubëza betoni në segmentin “Pandeli Sotiri”- “Obiliqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti”-“Kadri Pllana”	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	17.02.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	74.354,00 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	61.404,00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	20.08.2019	
Vlera e kontratës /Aneks Kontratës	98.786,40€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	74.354,00 €	




Komuna përfituese	HANI ELEZIT	
Titulli i projektit	Ndërtimi (rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të Elezit	
Përshkrimi i projektit	Është bërë rihapja dhe zgjerimi i dy rrugëve rurale si dhe asfaltimi i tyre në fshatin Pustenik dhe Hani Elezit si dhe zgjerimi i rrugës Ramuk- Paldenicë dhe Paldenicë -Vortomicë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		60,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		6,056.60€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		29.10.2019
vlera e kontratës / Aneks Kon Kontratës		66,056.60€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		60,000.00 €

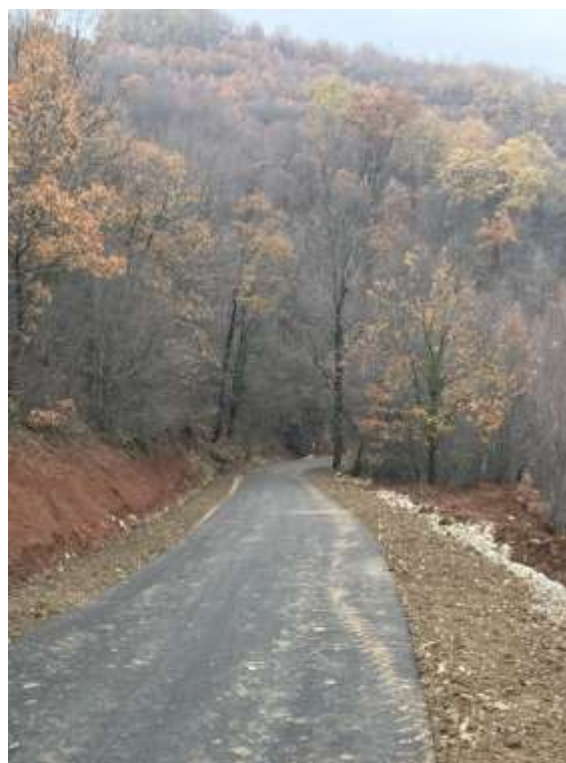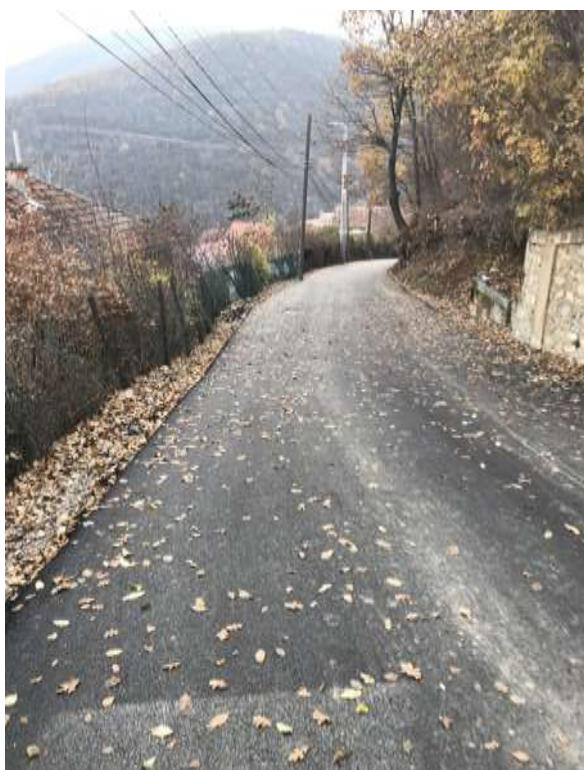

Komuna përfituese	HANI ELEZIT	
Titulli i projektit	Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve lokale	
Përshkrimi i projektit	Është bërë rihapja dhe zgjerimi i rrugës lokale, asfaltimi dhe kanalizimi fekal në Lagjen Ramuk dhe Kashan.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		27.02.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		48,430.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		115,207.71€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		18.06.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		163,637.71€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		48,430.00€



Komuna përfituese	KAÇANIK	
Titulli i projektit	Rregullimi I ndriçimit publik	
Përshkrimi i projektit	Është bërë rregullimi i ndriçimit publik në rrugët: "Besnik Begunca" Runjevë, "Tefik Raka", "Raif Krivanjeva", " Lumnije Raka - Ejup Dushkaja", "Vëllezërit Çaka", " 10 Gushti" Bajnicë, "Komandant Bardhi" Kaçanik i Vjetër dhe "Beteja e 25 Majit" Dubravë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		12.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		34,980.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		29.08.2019
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		84,980.00€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		50,000.00€

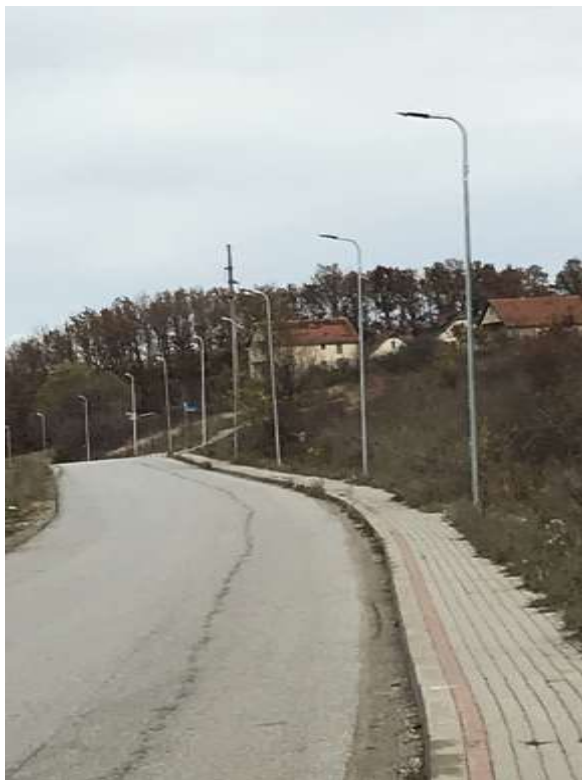

Komuna përfituese	KAÇANIK	
Titulli i projektit	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet	
Përshkrimi i projektit	Është bërë riasfaltimi i rrugëve në qytet, kanalizimi atmosferik i një rruge dhe rregullimi i ujësjellësit nga Kalaja deri te Ura e Konakut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.02.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	127,643.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	102,148.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	31.05.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	229,791.00€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	127,643.00 €	



Komuna përfituese	GLLOGOVC	
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavicës	
Përshkrimi i projektit	Është bërë hapja e trasesë së re për ndërtimin e rrugës Bregut të Qyqavicës e cila i lidhë komunat Gllogoc – Skenderaj- Vushtrri.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		31.05.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		300.000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		30.09.2019
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		187,000.00€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		140,295.00€



Komuna përfituese	GLLOGOC	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Gllanasellë - Godanc, Faza e dytë	
Përshkrimi i projektit	Është bërë asfaltimi i IV segmenteve ekzistuese dhe hapja e një segmenti të ri që lidhë fshatin Gllanasellë dhe Godancë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	11.06.2019-05.07.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	60,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	37,588.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	30.09.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	97,588.00€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	60,000.00€	



Komuna përfituese	GLLOGOVC	
Titulli i projektit	Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Verboc dhe Polluzhë, faza e dytë	
Përshkrimi i projektit	Është bërë asfaltimi i II segmenteve ekzistuese që lidhin fshatrat Shtuticë - Verboc - Polluzhë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	11.06.2019-05.07.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	20,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	16,180.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	30.09.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	36,180.00€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	36,180.00€	



Komuna përfituese	GJAKOVË	
Titulli i projektit	Renovimi i Bibliotekës ndër komunale "Ibrahim Rugova"	
Përshkrimi i projektit	Është bërë renovimi i Bibliotekës ndër komunale " Ibrahim Rugova" në dysHEME, SUVATIM dhe INVENTAR.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		30,000.00 €
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		28.08.2019
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		22,744.00€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		21,644.00 €



Komuna përfituese	JUNIK	
Titulli i projektit	Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes	
Përshkrimi i projektit	Projekti është projekt tre vjeçar ku në vitin 2019 janë bërë punimet fillestare.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	14.06.2019-06.09.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	65,000.00€	
Vlera e bashkë financimit për vitin 2019/ nëse ka	100,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	01.11.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	777,777.77€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	65,000.00€	



Komuna përfituese	DEÇAN	
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg	
Përshkrimi i projektit	Janë punuar 1,140 m' trotuare dhe 1,560 m' kanale të hapura për ujitje nga fshati Carrabreg deri në Beleg.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		60,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		14.08.2019
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		54,158.44€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		54,158.37€



Komuna përfituese	RAHOVEC	
Titulli i projektit	Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit	
Përshkrimi i projektit	Projekti është tre vjeçar ku në vitin 2019 është punuar segmenti III komplet dhe një pjesë e segmentit II në fshatin Kramovik.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	11.06.2019-13.09.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	20,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka për vitin 2019	45,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	31.10.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	438,668.29€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	20,000.00€	



Komuna përfituese	VUSHTRRI	
Titulli i projektit	Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë	
Përshkrimi i projektit	Është bërë instalimi i ndriçimit në rrjetin ekzistues publik në 13 rrugë të fshatra dhe në Vushtrri .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		45,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		4,826.10€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		18.10.2019
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		49,826.10€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		45,000.00€



Komuna përfituese	VUSHTRRI	
Titulli i projektit	Instalimi i kamerave në qytet	
Përshkrimi i projektit	Janë vendosur 13 kamera në rrugët e Vushtrrisë me rrjet të ri për siguri të qytetarëve.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		15,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		29.11.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		13,940.00€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		13,940.00€



Komuna përfituese	PEJË	
Titulli i projektit	Ndriçimi publik prej rrethit të Dulija deri tek rrethi i bulevardit të gjelbër	
Përshkrimi i projektit	Është bërë rregullimi i ri i rrjetit të ndriçimit publik në rrugën prej rrethit të Dulija deri te rrethi i bulevardit të gjelbër.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		19.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		38,485.00€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		38,485.00€



Komuna përfituese	FERIZAJ	
Titulli i projektit	Rregullimi i parkut dhe këndit të lojërave në zonën rekreative o - sportive në Komunën e Ferizajt.	
Përshkrimi i projektit	Është bërë rregullimi i parkut të ri dhe këndit të lojërave për fëmijë dhe gjelbërim i ri i parkut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	11.06.2019-18.07.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	55,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	12,111.15€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	08.10.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	67,111.15€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,094.90€	



Komuna përfituese	ISTOG	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve “Bekim Fehmiu” dhe “Arben Januzaj”	
Përshkrimi i projektit	Është bërë asfaltimi i dy rrugëve ekzistuese, rruga “Bekim Fehmiu” në gjatësi prej 570m dhe rruga “Arben Januzaj” në gjatësi prej 700m.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		55,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		8,459.50€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		23.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		63,459.50€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		55,000.00€




Komuna përfituese	FUSHË KOSOVË	
Titulli i projektit	Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të Madhe	
Përshkrimi i projektit	Është bërë zgjerimi i rrugës ekzistuese nga 3m në 5 m dhe asfaltimi i saj në gjatësi prej 816m.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	13.06.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	55,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	5,879.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	05.09.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	60,879.00€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	55,000.00€	



Komuna përfituese	SUHAREKË	
Titulli i projektit	Ndërtimi i Parqeve në Komunë	
Përshkrimi i projektit	Janë punuar Parqet e reja me këndin e lojërave për fëmijë në fshatrat Sallagrazhdë, Grejkoc, Tërrnje, Njëpërbisht dhe Muhlan , në komunën e Suharekës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		17,606.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		20.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		67,660.00€
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL		50,000.00€



Komuna përfituese	MALISHEVË	
Titulli i projektit	Renovimi i objektit të administratës të Komunës	
Përshkrimi i projektit	Është bërë renovimi i dy kateve të objektit ekzistues të komunës në Malishevë me instalime të reja , dysheme dhe suvatim.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	11.06.2019-15.10.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	37,479.53€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	2.10.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	87,479.53€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,000.00€	



Komuna përfituese.	LIPJAN	
Titulli i projektit	Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan	
Përshkrimi i projektit	Punimi i shtigjeve për ecje dhe shtruarja me kubëza, punimi i shtigjeve për biçikleta dhe asfaltimi, shtruarja e kanalizimit atmosferik dhe vendosja e ndriçimit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		27.02.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		231,925.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		90,474.47 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		05.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		317,980.80 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		227,834.24 €



Komuna përfituese	LIPJAN	
Titulli i projektit	Kiosqet në tregun e gjelbër t në Lipjan	
Përshkrimi i projektit	Punimi dhe vendosja e kiosqeve dhe të ndriçimit në tregun e gjelbër t në Lipjan.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		20,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		20.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		44,606.90 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		44,606.90 €



Komuna përfituese	KLLOKOT	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit	
Përshkrimi i projektit	Shtruarja dhe asfaltimi i rrugëve lokale në Kllokot.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	03.06.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	-	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit	29.08.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	45,868.10 €	
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL	45,868.10 €	



Komuna përfituese	KLLOKOT	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit - faza e dytë	
Përshkrimi i projektit	Shtruarja dhe asfaltimi i rrugëve lokale – faza e dytë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		30.08.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		-
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		25.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		36,816.70 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		36,816.70 €



Komuna përfituese	PARTESH	
Titulli i projektit	Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe rregullimi i pllatos para ndërtesës	
Përshkrimi i projektit	Punimi i konstruksionit të kulmit, asfaltimi i pllatos para ndërtesës dhe punimi i murit ndarës në sallë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	03.06.2019/30.08.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	14,244.10 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit	23.08.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	44,244.10 €	
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL	30,000.00 €	



Komuna përfituese	PARTESH	
Titulli i projektit	Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme.	
Përshkrimi i projektit	Punimi i stazës së këmbësorëve dhe vendosja e shtyllave për ndriçim.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		30.08.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		4,864.91 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		14.11.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		54,864.91 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		50,000.00 €




Komuna përfituese	VITI	
Titulli i projektit	Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë	
Përshkrimi i projektit	Punime dhe furnizim me inventar në hapësirat e kuvendit dhe me pajisje të It-isë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		-
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		17.07.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		35,080.00 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		35,080.00 €



Komuna përfituese	VITI	
Titulli i projektit	Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së Vitisë	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Vitisë është bërë rivitalizimi i Objektivit të Presidencës; Ndërtesës së Komunës si dhe sallës së Kuvendit Komunal.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		27.02.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		129,521.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		108,000.80€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		01.07.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		237,521.80€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		129,521.00€



Komuna përfituese	KAMENICË	
Titulli i projektit	Renovimi i objektit shkollor me qëllim për destinimin për objekt parashkollor	
Përshkrimi i projektit	Suvatimi dhe ngjyrosja e mureve, punimi i dyshemesë dhe inventarizimi.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		30,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		-
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		14.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		25,381.00 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		22,476.66 €

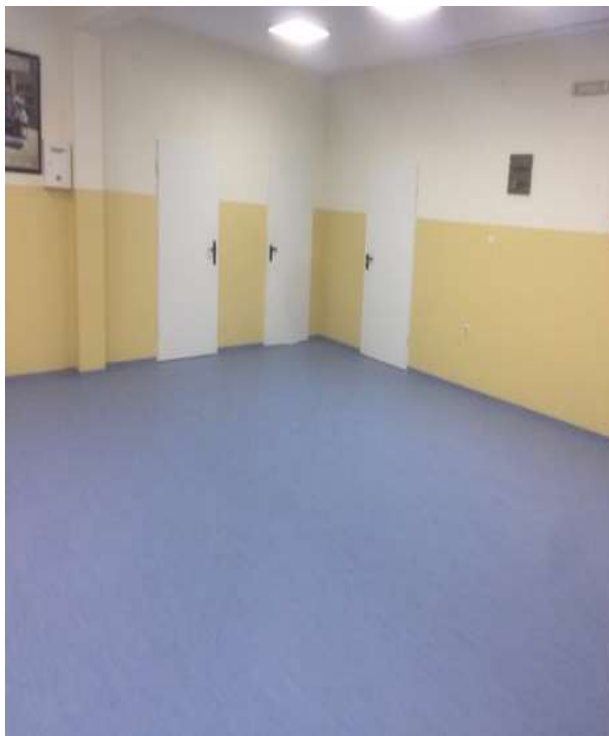


Komuna përfituese	RANILLUG	
Titulli i projektit	Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së Ranillugut	
Përshkrimi i projektit	Hapja e sipërfaqes për parking, punimi i murit mbrojtës, shtruarja dhe asfaltimi.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	06.06.2019/17.07.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	18,052.22 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit	05.09.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	48,052.22 €	
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL	30,000.00 €	



Komuna përfituese	PRIZREN	
Titulli i projektit	Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash	
Përshkrimi i projektit	Vendosja e trafos dhe vendosja e shtyllave për ndriçim.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		02.05.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		50,000.00 €
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		16.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		104,941.75 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		28,170.00 €



Komuna përfituese	MAMUSHË	
Titulli i projektit	Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamushë	
Përshkrimi i projektit	Punimi me pllaka i shtigjeve për ecje, vendosja e ndriçimit dhe vendosja e ulëseve.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	03.06.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	-	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit	10.10.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	39,895.13 €	
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL	39,895.13 €	

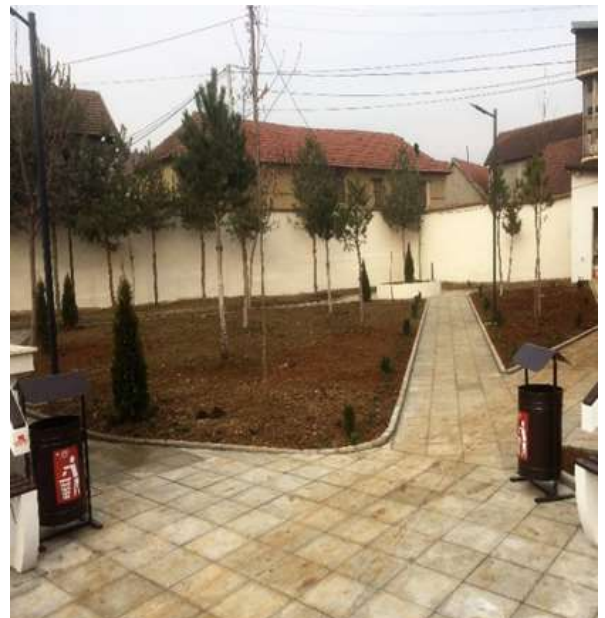

Komuna përfituese	DRAGASH	
Titulli i projektit	Ndërtimi i pritoreve - ministacioneve për udhëtarët e linjave urbane dhe nder urbane, largimi dhe sistemimi i deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Dragashit	
Përshkrimi i projektit	Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për autobus për banorët, largimi dhe pastrimi i deponive ilegale në komunën e Dragashit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		55,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		-
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		20.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		42,654.00 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		42,654.00 €



Komuna përfituese	SHTIME	
Titulli i projektit	Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit	
Përshkrimi i projektit	Rindërtimi i urës së vogël dhe riparimi i urës së madhe në qendër të qytetit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		-
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit		29.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		45,320.50 €
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL		42,705.50€




Komuna përfituese	GRAÇANICË	
Titulli i projektit	Ndërtimi i objekteve për banim social në Graçanicë	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Graçanicës është ndërtuar objekti i banimit P+1K+K me karakter social me gjithsejtë 32 banesa në Graçanicë. Kryesisht janë kryer punimet në fazën e I-rë të ndërtimit punimet të vrazhda të objektit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		04.03.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		280,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		280,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		29.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		489,535.00€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		280,000.00€



Komuna përfituese	GJILAN	
Titulli i projektit	Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave atmosferike në rrugën "28 NËNTORI"	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Gjilanit është ndërtuar rrjeti i kanalizimit me gypa PE në lagjen "28 Nëntori" afër tregut të veturave në rrugën Januz Tërstena në qytetin e Gjilanit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		55,000.00 €
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		15,783,75€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		01.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		70,783.75€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		55,000.00 €



Komuna përfituese	GJILAN	
Titulli i projektit	Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Gjilanit është ndërtuar rrjeti i kanalizimit të ujërave të zeza dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e porodinit në qytetin e Gjilanit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		27.02.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		299,166.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		288,191.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		01.07.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		570,521.053€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		299,166.00€

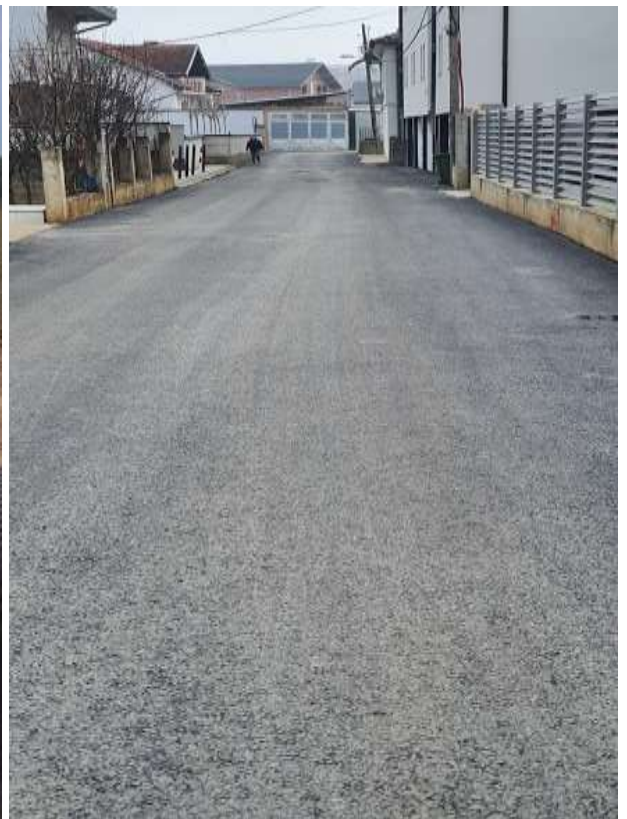

Komuna përfituese	KLINË	
Titulli i projektit	Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Klinës është bërë zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatrat e komunës së Klinës (Jashanicë, Siqevë ,Poterq, Gjurgjevik, Perqevë, Gjurgjevik i vogël, Rigjevë, lagjia Perlina)	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		45,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		2,820.40€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		12.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		47,820.40€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		45,000.00€



Komuna përfituese	KLINË	
Titulli i projektit	Rehabilitimi i shtratit te lumit Istog	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së nga fondet e bashkëpunimit ndër komunal është bërë rehabilitimi i shtratit të lumit “Istog” pjesa e trasesë që kalon në territorin e Komunës se Istogut dhe një pjesë e trasesë që kalon në territorin Komunës së Klinës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		31.05.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		246,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		21.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		149,447.00€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		149,447.00€




Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së nga është bërë rikonstruimi i fasadës , kulmit të objektit të banimit si dhe rregullimi i parterit para objektit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		100,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		13.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		99,742.50€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		99,742.50€



Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjese të parterit – qasjes të objekteve të banimit në rrugën Kralja Petra I 102-108 në Mitrovicën e Veriut	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi, sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugës si dhe shtrimi i parterit me elemente të betonit-kubëza.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	03.06.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	104,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	25.07.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	103,767.23€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	103,766.59€	



Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën “Kralj Petri” dhe “Ivo Lolla Ribar” në Mitrovicën e Veriut	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë renovimi i këndit të lodrave si dhe fushës së sportit në Mitrovicën e Veriut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		35,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		25.11.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		34,987.94€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		34,986.62€

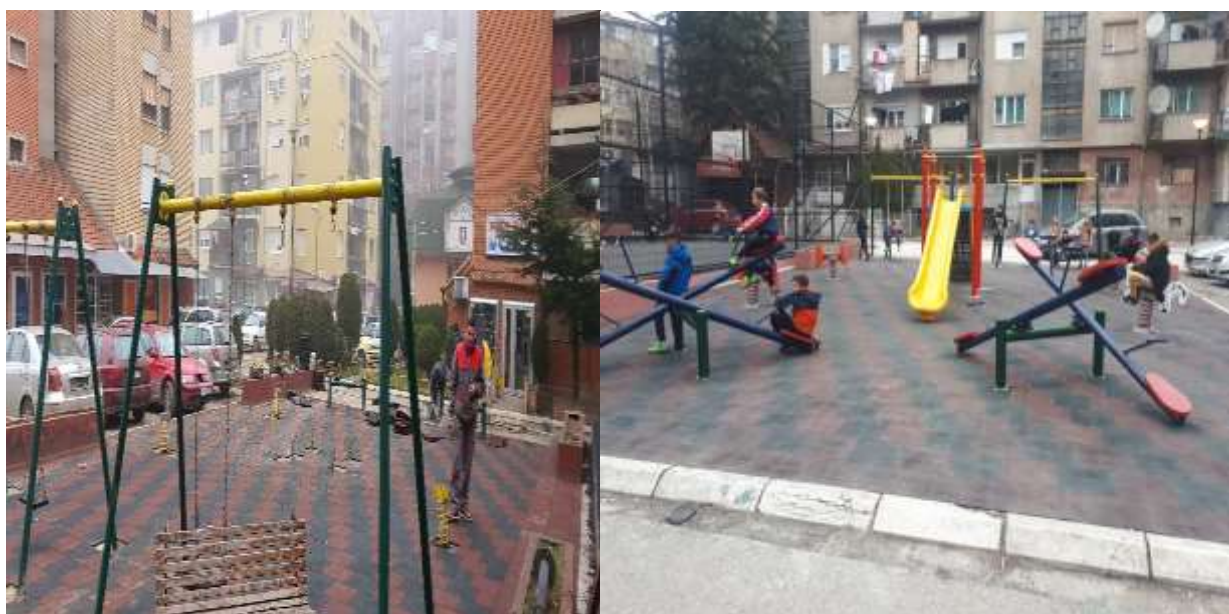


Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Pajisje të IT për nevoja të administratës së Komunës së M.V.	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë furnizimi me Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës së Mitrovicës së Veriut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		16.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		4,060.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		29.11.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		3,996.00€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		3,996.00€



Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Pajisje për përkthim simultant	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë furnizimi me Pajisje për përkthim simultant për nevoja të sallës së kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		20,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		18.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		15,937.86€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		15,937.86€



Komuna përfituese	ZVEQAN	
Titulli i projektit	Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv” dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Zveçanit është bërë asfaltimi i një pjese të rrugës afër kompleksit si dhe rregullimi i këndit të lodrave dhe fushës së sportit në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		13.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		25.552,80€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		19.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		65,545.30€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		39,996.50€

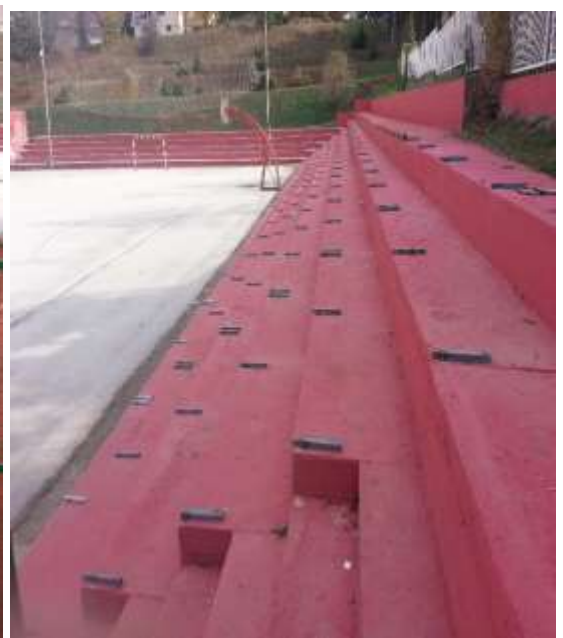

Komuna përfituese	ZVEÇAN	
Titulli i projektit	Furnizimi i pompës për ujësjellës lagjja Zveçan i Vogël	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Zveçanit është bërë furnizimi i pompës për nevoja të rrjetit të ujësjellësit për komunën e Zveçanit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		21.11.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		10,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		5,000.00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		23.12.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		14,990.00€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		10,000.00€



Komuna përfituese	ZUBIN POTOK	
Titulli i projektit	Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës sportive në Zubin Potok	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë rregullimi i një pjese të shtratit -argjinatura e lumit "Ibër" pjesa nga ana e qendrës sportive gjithashtu trotuari me elemente betoni-kubëza si dhe ndriçimi publik me drita LED .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		26.07.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		49,518.55€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		49,518.55€



Komuna përfituese	ZUBIN POTOK	
Titulli i projektit	Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve të dheut në aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore "Petar Kocic" në fshatin Bërnjak	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi i rrugës dhe sanimi i rrëshqitjeve të dheut në aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore "Petar Kocic" në fshatin Bërnjak Komuna e Zubin Potokut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		31.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		39,922.94€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		39,922.94€



Komuna përfituese	LEPOSAVIQ	
Titulli i projektit	Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në Leposaviq	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi i platos afër komunës, rrugës nga Posta deri te Shtëpia e Mallrave, murit mbrojtës nga betonarme a, rrethoja metalike, Ndriçimi publik me drita LED si dhe vendosja e shtyllëzave te parkingu.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		21.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		49,779.00€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		49,779.00€



Komuna përfituese	PODUJEVË	
Titulli i projektit	Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Podujevës është bërë rregullimi i një pjese të shtratit të lumit me konstruksion betoni dhe m veshja me pllaka guri.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		30,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		13,333.73€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		30.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		43,333.73€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		30,000.00€




Komuna përfituese	MITROVICË E JUGUT	
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushac	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut është bërë rregullimi i një pjese trasesë së rrugës në fshatin Gushac kryesisht nën struktura e rrugës dhe kanalet e ujërave atmosferike.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		21.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		60,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		736,796.80€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		15.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		796,796.80€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		60,000.00€



Komuna përfituese	PRISHTINË	
Titulli i projektit	Rigjenerimi urban i lagjeve te kryeqytetit	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Prishtinës është bërë rigjenerimi urban i parkut "Bllok pas Blloku" ne lagjen "Bregu i Diellit" dhe rrugës "Xhemajl Mustafa".	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		14.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		27,707.45€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		25.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		77,777.91€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		40,000.00€



Komuna përfituese	SKËNDERAJ	
Titulli i projektit	Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit	
Përshkrimi projektit	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Skenderajt është bërë shtrimi me kubëza betoni i rrugëve në lagje të qytetit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		10,000,00€
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		03.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		56,447.00€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		50,000.00€

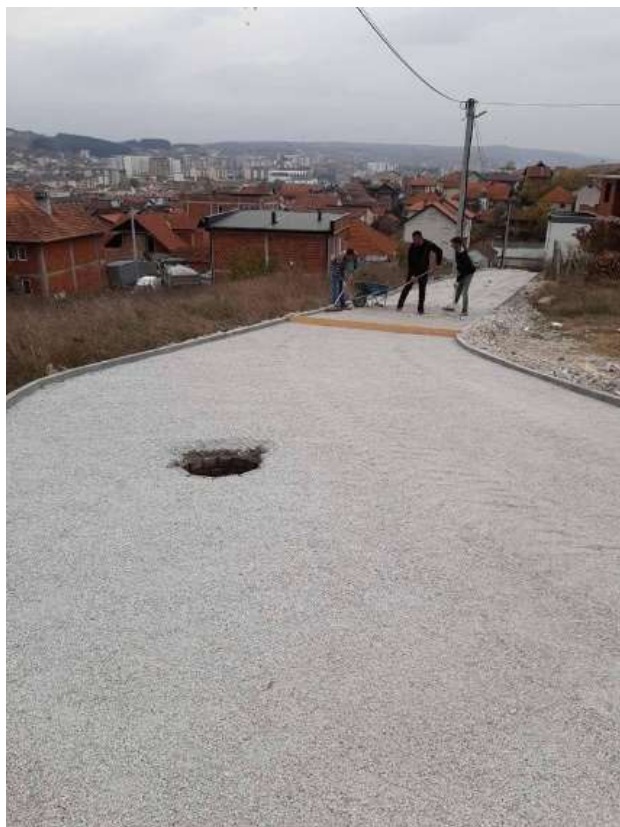

Komuna përfituese	NOVOBËRDË	
Titulli i projektit	Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energji imi i pikës grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë), Komuna e Novobërdë	
Përshkrimi projektit	Me financimin e MAPL-së është bërë vendosja e trafo stacionit , rrjeti i tensionit të lartë , rrjeti i tensionit të ulët si dhe ndriçimi publik me drita LED.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		46,114.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		24.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		39,440.44€
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL		39,440.44€



Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2019

Komuna	Nr. I proj.	Emri i projektit	Fondi	Financimi	Vlera e kontratës	Procedurat e prokurimit	Pagesat
Shtërpce	1	Rregullimi i kanalit dhe trotuarit në Brezovicë	MAPL/D	37,516.00	29,569.81	Komuna	29,569.81
Obiliq	2	Rregullimi i rrugëve në Plemetin	GP	50,000.00	45,668.84	Komuna	45,668.84
Obiliq	3	Ndriçimi prej shkollës "Pandeli Sotiri" Obiliqi I Vjetër deri në kryqëzimin e rrugës "Zahir Pajaziti-Kadri Pllana"	MAPL/D	74,353.9	98,786.40	Komuna	74,353.90
Hani Elezit	4	Ndërtimi (rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të Elezit	GP	60,000.00	66,056.60	Komuna	60,000.00
Hani Elezit	5	Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve lokale	MAPL/D	48,430.00	163,637.71	Komuna	48,430.00
Kaçanik	6	Rregullimi I ndriçimit publik	GP	50,000.00	84,980.00	Komuna	50,000.00
Kaçanik	7	Rregullimi dhe asfaltimi I rrugëve në qytet	MAPL/D	127,643.00	229,791.00	Komuna	127,643.00
Gllgoc	8	Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavices	BNK	300,000.00	187,000.00	Komuna	140,295.00
Gllgoc	9	Asfaltimi I rruges Gllanasell - Godanc, Faza e dytë	GP	60,000.00	97,588.00	Komuna	60,000.00
Gllgoc	10	Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Vërbovc dhe Polluzhë, faza e dytë	GP	20,000.00	36,180.00	Komuna	20,000.00
Gjakovë	11	Renovimi i Bibliotekës ndërkomunale "Ibrahim Rugova"		30,000.00	22,744.00	Komuna	21,644.00
Junik	12	Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes	GP	65,000.00	777,777.77	Komuna	65,000.00
Deçan	13	Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg	GP	60,000.00	54,158.37	Komuna	54,158.37
Rahovec	14	Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit	GP	20,000.00	438,000.00	Komuna	20,000.00
Vushtrri	15	Zgjerimi I rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë	GP	45,000.00	49,826.10	Komuna	45,000.00
Vushtrri	16	Instalimi i kamerave në qytet	GP	15,000.00	13,940.00	Komuna	13,940.00

Pejë	17	Ndriçimi publik prej rrethit të Dulija deri tek rrethi i bulevardit të gjelbër	GP	55,000.00	38,482.00	Komuna	38,482.00
Ferizaj	18	Rregullimi I parkut dhe këndit të lojërave në zonën rekreative - sportive në Komunën e Ferizajt	GP	55,000.00	67,111.15	Komuna	50,094.00
Istog	19	Asfaltimi I rrugëve Bekim Fehmiu dhe Arben Januzaj	GP	55,000.00	63,459.50	Komuna	55,000.00
Fushë Kosovë	20	Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të madhe	GP	55,000.00	60,870.00	Komuna	55,000.00
Suharekë	21	Ndërtimi i Parqeve në Komunë	GP	50,000.00	67,660.00	Komuna	50,000.00
Malishevë	22	Renovimi i objektit të administratës të Komunës	GP	50,000.00	87,479.53	Komuna	50,000.00
Lipjan	23	Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan	MAPL/demos	231,925.00	317,980.80	Komuna	227,834.24
Lipjan	24	Kiosqet në tregun e gjelbërt në Lipjan	GP	50,000.00	44,606.90	Komuna	44,606.90
Klllokot	25	Asfaltimi i rrugëve në territorin e Klllokotit	MAPL	50,000.00	45,868.10	Komuna	45,868.10
Klllokot	26	Asfaltimi i rrugëve në territorin e Klllokotit - faza e dytë	MAPL	40,000.00	36,816.70	Komuna	36,816.70
Partesh	27	Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe rregullimi i pllatos para ndërtesës	MAPL	30,000.00	44,244.10	Komuna	30,000.00
Partesh	28	Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme	MAPL	50,000.00	54,864.91	Komuna	50,000.00
Viti	29	Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë	MAPL	40,000.00	35,087.00	Komuna	35,080.00
Viti	30	Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së Vitisë	MAPL	129,521.00	273,521.80	Komuna	129,521.00
Kamenicë	31	Renovimi i objektit shkollor me qëllim për de stinimin për objekt parashkollor	MAPL	30,000.00	25,381.00	Komuna	22,476.66
Ranillugë	32	Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së Ranillugut	MAPL	30,000.00	48,052.22	Komuna	30,000.00

Prizren	33	Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash	LB	60,000.00	104,941.75	Komuna	28,170.00
Mamushë	34	Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamush	MAPL	50,000.00	39,895.13	Komuna	39,895.13
Dragash	35	Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për udhëtarët e linjave urbane dhe ndër urbane, largimi dhe sistemimi i deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Dragashit	GP	55,000.00	42,654.00	Komuna	42,654.00
Shtime	36	Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit	GP	50,000.00	45,320.50	Komuna	42,705.00
Graçanicë	37	Ndërtimi i objekteve për banim social në Graçanicë	MAPL	280,000.00	489,535.00	Komuna	280,000.00
Gjilan	38	Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave atmosferike në rrugën "28 NËNTORI"	GP	55,000.00	70,785.75	Komuna	55,000.00
Gjilan	39	Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit	MAPL/Demos	299,166.00	570,521.053	Komuna	299,166.00
Klinë	40	Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës	GP	45,000.00	47,820.40	Komuna	45,000.00
Klinë	41	Rehabilitimi i shtratit të lumit Istog	MAPL	246,000.00	149,447.00	Komuna	149,447.00
Mitrovicë e Veriut	42	Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV	MAPL	100,000.00	99,742.50	Komuna	99,742.50
Mitrovicë e Veriut	43	Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjesë të parterit - qasjes të objekteve të banimit në rrugën Kralja Petra I 102-108 në Mitrovicë e Veriut	MAPL	104,000.00	103,767.23	Komuna	103,766.59
Mitrovicë e Veriut	44	Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën "Kralj Petri" dhe "Ivo Lllolla Ribar" në Mitrovicën e Veriut	MAPL	35,000.00	34,987.94	Komuna	34,986.62
Mitrovicë e Veriut	45	Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës së M.V.	MAPL	4,060.00	3,996.00	Komuna	3,996.00

Mitrovicë e Veriut	46	Pajisje për përkthim simultant	MAPL	20,000.00	15,937.86	Komuna	15,937.86
Zveçan	47	Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv" dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu	MAPL	40,000.00	65,545.30	Komuna	39,996.50
Zveçan	48	Furnizimi i pompave për ujësjellës lagjja Zveçan i Vogël	MAPL	10,000.00	14,990.00	Komuna	10,000.00
Zubin Potok	49	Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës sportive në Zubin Potok	MAPL	50,000.00	49,518.55	Komuna	49,518.55
Zubin Potok	50	Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve te dheut ne aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore "Petar Kocic" në fshatin Bërnjak	MAPL	40,000.00	39,922.94	Komuna	39,922.94
Leposaviq	51	Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në Leposaviq	MAPL	50,000.00	49,779.00	Komuna	49,779.00
Podujevë	52	Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap	MAPL	30,000.00	43,333.73	Komuna	30,000.00
Mitrovicë e Jugut	53	Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushac	GP	60,000.00	796,796.80	Komuna	60,000.00
Prishtinë	54	Rigjenerimi urban i lagjeve të kryeqytetit	GP	50,000.00	77.777.91	Komuna	40,000.00
Skenderaj	55	Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit	GP	50,000.00	56,447.00	Komuna	50,000.00
Novobërda	56	Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energjizimi i pikës grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë), Komuna e Novobërdë	GP	46,114.00	39,440.44	Komuna	39,440.44
						TOTAL	3,475,550.74
