



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave  
Ministry of Local Government Administration

**Departamenti për Bashkëpunim dhe Zhvillimit Regjional**

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në  
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2019**


**Mars 2020**

**Përmbajtja:**

SHTËRPCE.....	4
Rregullimi i kanalit dhe trotuarit ne Brezovicë .....	4
OBILIQ .....	5
Rregullimi i rrugëve në Plemetin.....	5
OBILIQI .....	6
Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri” -“Obilqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti” -“Kadri Pllana” .....	6
HANI ELEZIT .....	7
Ndërtimi ( rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të Elezit .....	7
HANI ELEZIT .....	8
Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve lokale .....	8
KAÇANIK.....	9
Rregullimi I ndriçimit publik .....	9
KAÇANIK.....	10
Rregullimi dhe asfaltimi I rrugëve në qytet .....	10
GLLOGOVC .....	11
Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavicës .....	11
GLLOGOVC .....	12
Asfaltimi I rrugës Gllanasellë - Godanc, Faza e dytë.....	12
GLLOGOVC .....	13
Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Verbovc dhe Polluzhë, faza e dytë.....	13
GJAKOVË .....	14
Renovimi i Bibliotekës ndër komunale "Ibrahim Rugova" .....	14
JUNIK .....	15
Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes.....	15
DEÇAN .....	16
Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg .....	16
RAHOVEC.....	17
Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit.....	17
VUSHTRRI.....	18
Zgjerimi I rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë .....	18
VUSHTRRI.....	19
Instalimi i kamerave në qytet .....	19
PEJË.....	20
FERIZAJ .....	21
Rregullimi I parkut dhe këndit të lojërave në zonën rekreativ o - sportive në Komunën e Ferizajt .....	21
ISTOG .....	22
Asfaltimi I rrugëve “Bekim Fehmiu” dhe “ Arben Januzaj” .....	22
FUSHË KOSOVË.....	23
Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të madhe.....	23
SUHAREKË .....	24
Ndërtimi i Parqeve në Komunë .....	24
MALISHEVË .....	25
Renovimi i objektit të administratës të Komunës.....	25
LIPJAN .....	26
Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan .....	26
LIPJAN .....	27
Kiosqet në tregun e gjelbër t në Lipjan.....	27
KLLOKOT .....	28
Asfaltimi i rrugëve në territorin e Klokotit .....	28
KLLOKOT .....	29
Asfaltimi i rrugëve në territorin e Klokotit - faza e dytë .....	29
PARTESH.....	30
Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe rregullimi i pllatos para ndërtesës .....	30
<b>PARTESH</b> .....	31
<b>Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme</b> .....	31
VITI .....	32
Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë.....	32

VITI.....	33
Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së Vitisë.....	33
KAMENICË.....	34
Renovimi i objektit shkollor me qëllim për destinimin për objekt parashkollor.....	34
RANILLUG.....	35
Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së Ranillugut.....	35
PRIZREN.....	36
Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash.....	36
MAMUSHË.....	37
Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamushë.....	37
DRAGASH.....	38
Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për udhëtarët e linjave urbane dhe ndër urbane, largimi dhe sistemimi i deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Dragashit.....	38
SHTIME.....	39
Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit.....	39
GRAÇANICË.....	40
Ndërtimi i objekteve për banim social në Graçanicë.....	40
GJILAN.....	41
Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave atmosferike në rrugën “28 NËNTORI”.....	41
GJILAN.....	42
Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit.....	42
KLINË.....	43
Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës.....	43
KLINË.....	44
Rehabilitimi i shtratit të lumit Istog.....	44
MITROVICË E VERIUT.....	45
Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV.....	45
MITROVICË E VERIUT.....	46
Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjesë të parterit – qasjes të objekteve të banimit në rrugën Kralja Petra I 102-108 në Mitrovicë e Veriut.....	46
MITROVICË E VERIUT.....	47
Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën “Kralj Petri” dhe “Ivo Lolla Ribar” në Mitrovicën e Veriut.....	47
MITROVICË E VERIUT.....	48
Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës së M.V.....	48
MITROVICË E VERIUT.....	49
Pajisje për përkthim simultan.....	49
ZVEQAN.....	50
Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv” dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu50 ZVEQAN.....	51
Furnizimi i pompave për ujësjellës lagjja Zveçan i Vogël.....	51
ZUBIN POTOK.....	52
Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës sportive në Zubin Potok.....	52
ZUBIN POTOK.....	53
Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve të dheut në aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore “Petar Kocić” në fshatin Bërnjak.....	53
LEPOSAVIQ.....	54
Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në Leposaviq.....	54
PODUJEVË.....	55
Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap.....	55
MITROVICË E JUGUT.....	56
Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushac.....	56
PRISHTINË.....	57
Rigjenerimi urban i lagjeve të kryeqytetit.....	57
SKËNDERAJ.....	58
Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit.....	58
NOVOBËRDË.....	59
Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energjizimi i pikës grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë), Komuna e Novobërdë.....	59
<b>Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2019.....</b>	<b>62</b>

<b>Komuna përfituese</b>	<b>SHTËRPCE</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i kanalit dhe trotuarit ne Brezovicë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është punuar kanali i hapur për ujëra atmosferik dhe trotuari në dy anët e rrugës në Brezovicë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>27.02.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>29,569.81€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>08.08.2019</b>
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>29,569.81€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>29,569.81€</b>

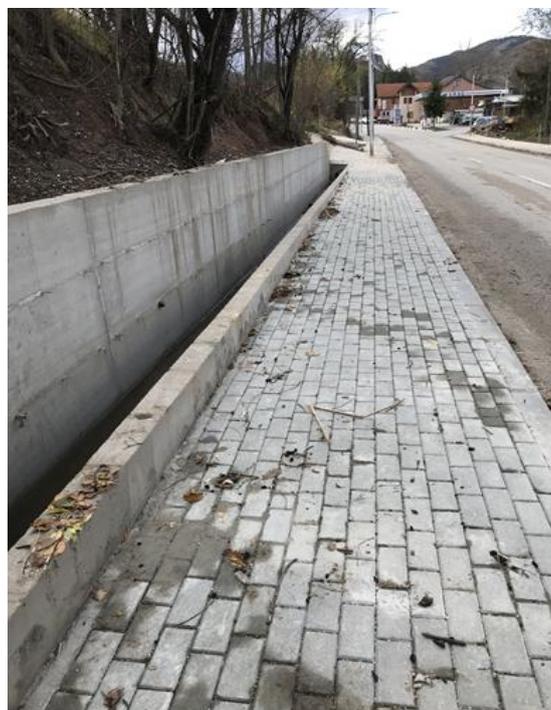


<b>Komuna përfituese</b>	<b>OBILIQ</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i rrugëve në Plemetin</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë rregullimi i 4 rrugëve me zhavorr dhe një rrugë me asfalt në fshatin Plemetin.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.02.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	45,668.84 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	€	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	30.08.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	45,668.84 €	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	45,668.84 €	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>OBILIQI</b>
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri”-“Obiliqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti”-“Kadri Pllana”</b>
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Obiliqit është bërë ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik me drita LED dhe punimi i trotuarit me kubëza betoni në segmentin “Pandeli Sotiri”- “Obiliqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti”-“Kadri Pllana”
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	17.02.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>74.354,00 €</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	<b>61.404,00€</b>
<b>Kontrata</b>	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	20.08.2019
Vlera e kontratës /Aneks Kontratës	<b>98.786,40€</b>
<b>Pagesat</b>	
Shuma e pagesave nga MAPL	<b>74.354,00 €</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>HANI ELEZIT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi ( rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të Elezit</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë rihapja dhe zgjerimi i dy rrugëve rurale si dhe asfaltimi i tyre në fshatin Pustenik dhe Hani Elezit si dhe zgjerimi i rrugës Ramuk- Paldenicë dhe Paldenicë -Vortomicë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>60,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>6,056.60€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>29.10.2019</b>
vlera e kontratës / Aneks Kon Kontratës		<b>66,056.60€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>60,000.00 €</b>

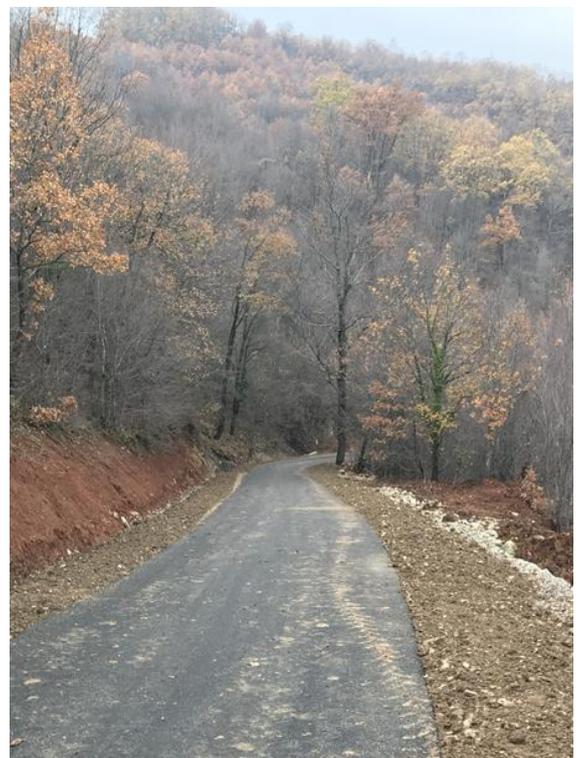


<b>Komuna përfituese</b>	<b>HANI ELEZIT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve lokale</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë rihapja dhe zgjerimi i rrugës lokale, asfaltimi dhe kanalizimi fekal në Lagjen Ramuk dhe Kashan.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>27.02.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>48,430.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>115,207.71€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>18.06.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>163,637.71€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>48,430.00€</b>





<b>Komuna përfituese</b>	<b>KAÇANIK</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi I ndriçimit publik</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë rregullimi i ndriçimit publik në rrugët: "Besnik Begunca" Runjevë, "Tefik Raka", "Raif Krivanjeva", " Lumnije Raka - Ejup Dushkaja", "Vëllezërit Çaka", " 10 Gushti" Bajnicë, "Komandant Bardhi" Kaçanik i Vjetër dhe "Beteja e 25 Majit" Dubravë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>12.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>50,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>34,980.00€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>29.08.2019</b>
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>84,980.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>50,000.00€</b>

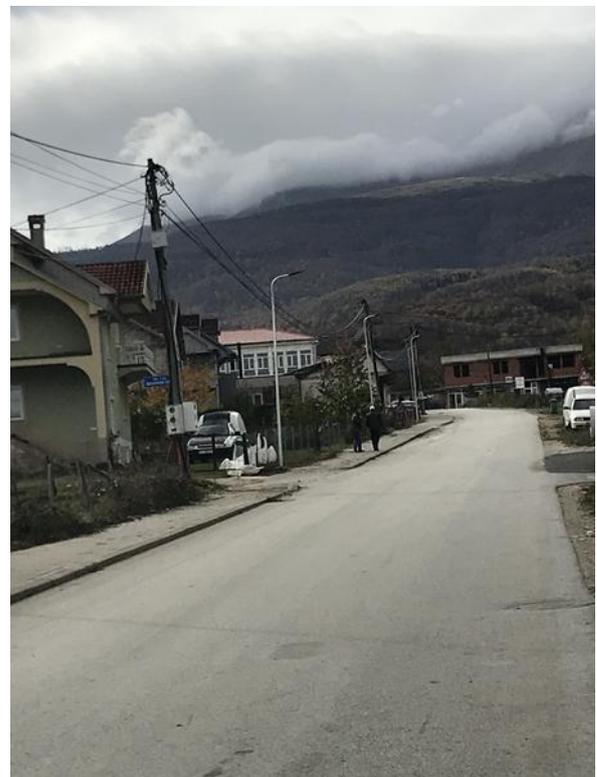


<b>Komuna përfituese</b>	<b>KAÇANIK</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë riasfaltimi i rrugëve në qytet, kanalizimi atmosferik i një rruge dhe rregullimi i ujësjes nga Kalaja deri te Ura e Konakut.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.02.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	127,643.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	102,148.00€	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	31.05.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	229,791.00€	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	127,643.00 €	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>GLLOGOVC</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavicës</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë hapja e trasesë së re për ndërtimin e rrugës Bregut të Qyqavicës e cila i lidhë komunat Gllogoc – Skenderaj- Vushtrri.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>31.05.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>300.000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>30.09.2019</b>
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>187,000.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>140,295.00€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>GLLOGOVC</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Asfaltimi i rrugës Gllanasellë - Godanc, Faza e dytë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë asfaltimi i IV segmenteve ekzistuese dhe hapja e një segmenti të ri që lidhë fshatin Gllanasellë dhe Godancë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	11.06.2019-05.07.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	60,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	37,588.00€	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	30.09.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	97,588.00€	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	60,000.00€	

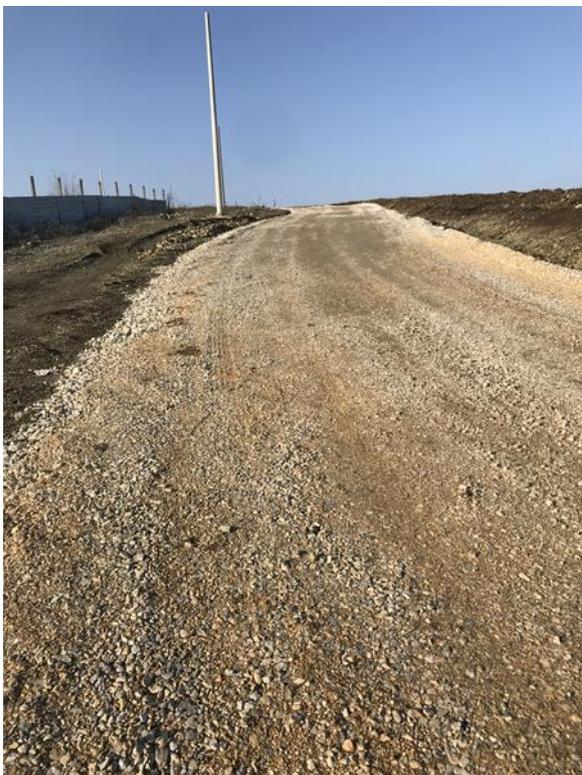

<b>Komuna përfituese</b>	<b>GLLOGOVC</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Verboc dhe Polluzhë, faza e dytë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë asfaltimi i II segmenteve ekzistuese që lidhin fshatrat Shtuticë - Verboc - Polluzhë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	<b>11.06.2019-05.07.2019</b>	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>20,000.00€</b>	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	<b>16,180.00€</b>	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	<b>30.09.2019</b>	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>36,180.00€</b>	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	<b>36,180.00€</b>	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>GJAKOVË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Renovimi i Bibliotekës ndër komunale "Ibrahim Rugova"</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë renovimi i Bibliotekës ndër komunale " Ibrahim Rugova" në dysHEME, SUVATIM dhe INVENTAR.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>03.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>30,000.00 €</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>28.08.2019</b>
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>22,744.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>21,644.00 €</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>JUNIK</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Projekti është projekt tre vjeçar ku në vitin 2019 janë bërë punimet fillestare.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	<b>14.06.2019-06.09.2019</b>	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>65,000.00€</b>	
Vlera e bashkë financimit për vitin 2019/ nëse ka	<b>100,000.00€</b>	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	<b>01.11.2019</b>	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>777,777.77€</b>	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	<b>65,000.00€</b>	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>DEÇAN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Janë punuar 1,140 m' trotuare dhe 1,560 m' kanale të hapura për ujitje nga fshati Carrabreg deri në Beleg.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>60,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>14.08.2019</b>
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>54,158.44€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>54,158.37€</b>





<b>Komuna përfituese</b>	<b>RAHOVEC</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Projekti është tre vjeçar ku në vitin 2019 është punuar segmenti III komplet dhe një pjesë e segmentit II në fshatin Kramovik.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	<b>11.06.2019-13.09.2019</b>	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>20,000.00€</b>	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka për vitin 2019	<b>45,000.00€</b>	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	<b>31.10.2019</b>	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>438,668.29€</b>	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	<b>20,000.00€</b>	




<b>Komuna përfituese</b>	<b>VUSHTRRI</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë instalimi i ndriçimit në rrjetin ekzistues publik në 13 rrugë të fshatra dhe në Vushtrri .	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>45,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>4,826.10€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>18.10.2019</b>
vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>49,826.10€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>45,000.00€</b>




<b>Komuna përfituese</b>	<b>VUSHTRRI</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Instalimi i kamerave në qytet</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Janë vendosur 13 kamera në rrugët e Vushtrrisë me rrjet të ri për siguri të qytetarëve.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>15,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>29.11.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>13,940.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>13,940.00€</b>





<b>Komuna përfituese</b>	<b>PEJË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	Ndriçimi publik prej rrethit të Dulija deri tek rrethi i bulevardit të gjelbër	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë rregullimi i ri i rrjetit të ndriçimit publik në rrugën prej rrethit të Dulija deri te rrethi i bulevardit të gjelbër.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>50,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>19.08.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>38,485.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>38,485.00€</b>

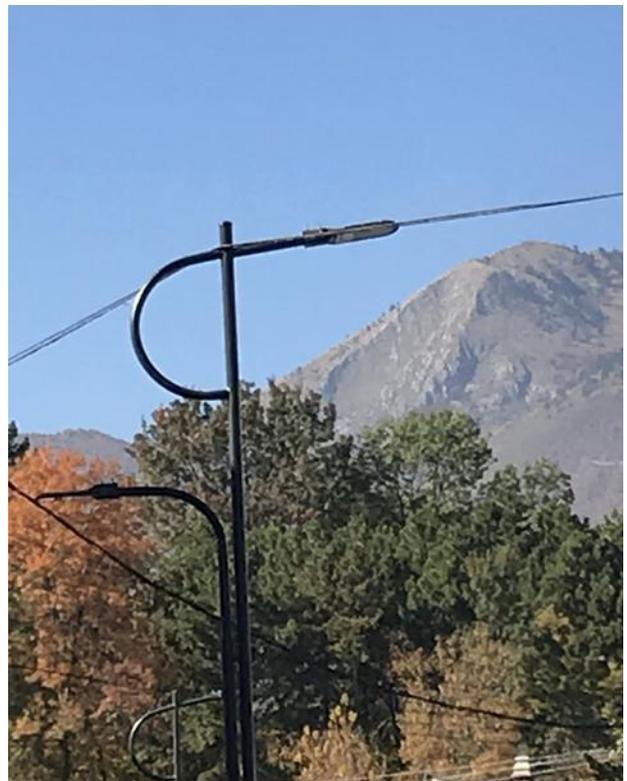

<b>Komuna përfituese</b>	<b>FERIZAJ</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i parkut dhe këndit të lojërave në zonën rekreativ o - sportive në Komunën e Ferizajt.</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë rregullimi i parkut të ri dhe këndit të lojërave për fëmijë dhe gjelbërim i ri i parkut.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	11.06.2019-18.07.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	55,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	12,111.15€	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	08.10.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	67,111.15€	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,094.90€	

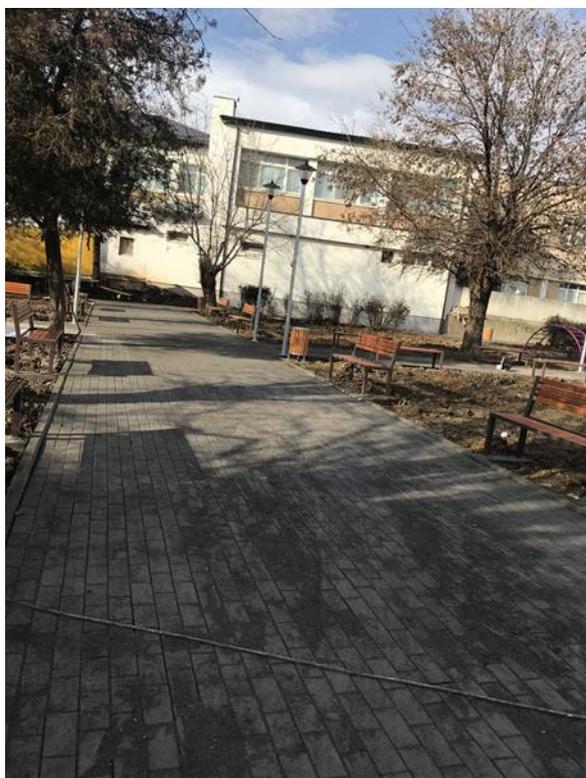

<b>Komuna përfituese</b>	<b>ISTOG</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Asfaltimi i rrugëve “Bekim Fehmiu” dhe “Arben Januzaj”</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë asfaltimi i dy rrugëve ekzistuese, rruga “Bekim Fehmiu” në gjatësi prej 570m dhe rruga “Arben Januzaj” në gjatësi prej 700m.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>55,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>8,459.50€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>23.09.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>63,459.50€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>55,000.00€</b>

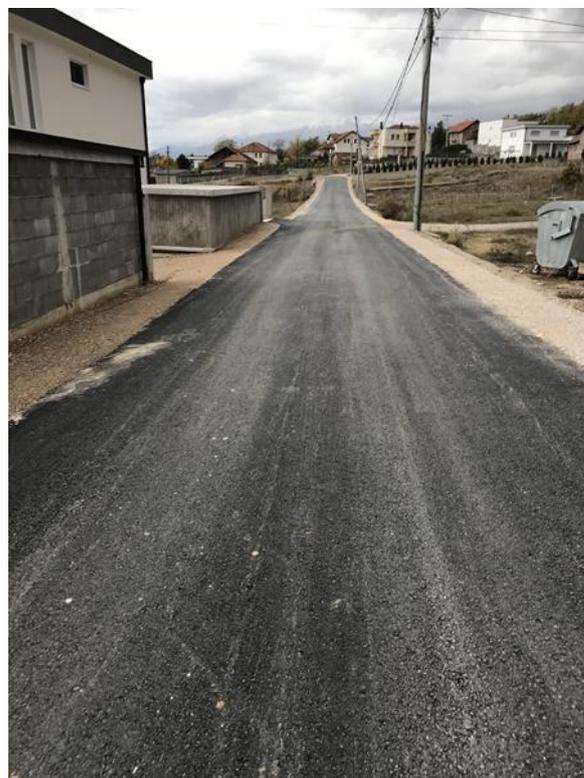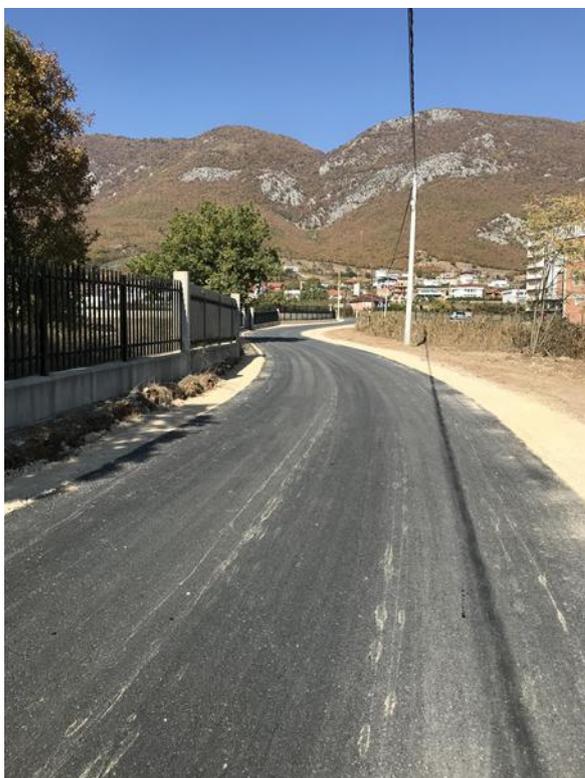

<b>Komuna përfituese</b>	<b>FUSHË KOSOVË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të Madhe</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë zgjerimi i rrugës ekzistuese nga 3m në 5 m dhe asfaltimi i saj në gjatësi prej 816m.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>13.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>55,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>5,879.00€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>05.09.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>60,879.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>55,000.00€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>SUHAREKË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i Parqeve në Komunë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Janë punuar Parqet e reja me këndin e lojërave për fëmijë në fshatrat Sallagrazhdë, Grejkoc, Tërrnje, Njëpërbisht dhe Muhlan , në komunën e Suharekës.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>50,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>17,606.00€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës		<b>20.09.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>67,660.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL		<b>50,000.00€</b>





<b>Komuna përfituese</b>	<b>MALISHEVË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Renovimi i objektit të administratës të Komunës</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Është bërë renovimi i dy kateve të objektit ekzistues të komunës në Malishevë me instalime të reja , dysheme dhe suvatim.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	<b>11.06.2019-15.10.2019</b>	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>50,000.00€</b>	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	<b>37,479.53€</b>	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës	<b>2.10.2019</b>	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>87,479.53€</b>	
<b>Pagesat</b>		
Vlerat e pagesës nga MAPL	<b>50,000.00€</b>	



<b>Komuna përfituese.</b>	<b>LIPJAN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Punimi i shtigjeve për ecje dhe shtruarja me kubëza, punimi i shtigjeve për biçikleta dhe asfaltimi, shtruarja e kanalizimit atmosferik dhe vendosja e ndriçimit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>27.02.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>231,925.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		<b>90,474.47 €</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>05.08.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>317,980.80 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>227,834.24 €</b>




<b>Komuna përfituese</b>	<b>LIPJAN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Kiosqet në tregun e gjelbër t në Lipjan</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Punimi dhe vendosja e kiosqeve dhe të ndriçimit në tregun e gjelbër t në Lipjan.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>50,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		<b>20,000.00€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>20.08.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>44,606.90 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>44,606.90 €</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>KLLOKOT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Shtruarja dhe asfaltimi i rrugëve lokale në Kllokot.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	<b>03.06.2019</b>	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>50,000.00 €</b>	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	-	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit	<b>29.08.2019</b>	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>45,868.10 €</b>	
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL	<b>45,868.10 €</b>	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>KLLOKOT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit - faza e dytë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Shtruarja dhe asfaltimi i rrugëve lokale – faza e dytë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>30.08.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>40,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		<b>-</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>25.10.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>36,816.70 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>36,816.70 €</b>

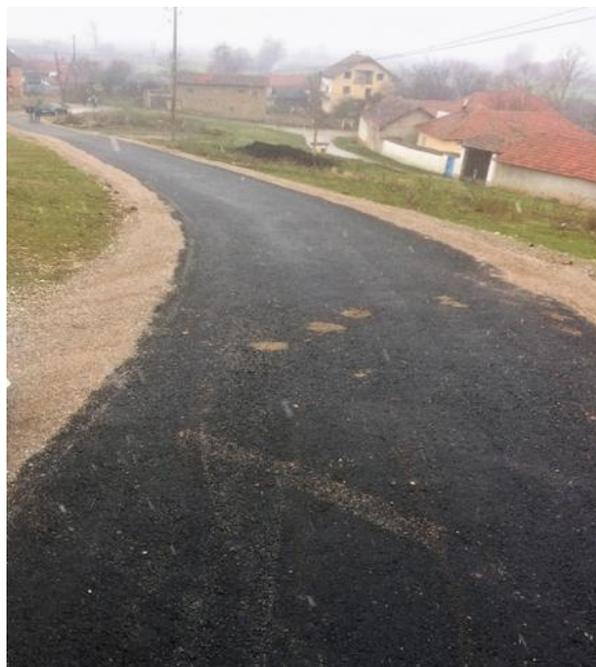

<b>Komuna përfituese</b>	<b>PARTESH</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe rregullimi i pllatos para ndërtesës</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Punimi i konstruksionit të kulmit, asfaltimi i pllatos para ndërtesës dhe punimi i murit ndarës në sallë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	<b>03.06.2019/30.08.2019</b>	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>30,000.00 €</b>	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	<b>14,244.10 €</b>	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit	<b>23.08.2019</b>	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>44,244.10 €</b>	
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL	<b>30,000.00 €</b>	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>PARTESH</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme.</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Punimi i stazës së këmbësorëve dhe vendosja e shtyllave për ndriçim.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>30.08.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>50,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		<b>4,864.91 €</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>14.11.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>54,864.91 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>50,000.00 €</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>VITI</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Punime dhe furnizim me inventar në hapësirat e kuvendit dhe me pajisje të It-isë.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>03.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>40,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		-
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>17.07.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>35,080.00 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>35,080.00 €</b>






<b>Komuna përfituese</b>	<b>VITI</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së Vitisë</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Vitisë është bërë rivitalizimi i Objektivit të Presidencës; Ndërtesës së Komunës si dhe sallës së Kuvendit Komunal.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>27.02.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>129,521.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>108,000.80€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>01.07.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>237,521.80€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>129,521.00€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>KAMENICË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Renovimi i objektit shkollor me qëllim për destinimin për objekt parashkollor</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Suvatimi dhe ngjyrosja e mureve, punimi i dyshemesë dhe inventarizimi.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>30,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		<b>-</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>14.10.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>25,381.00 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>22,476.66 €</b>

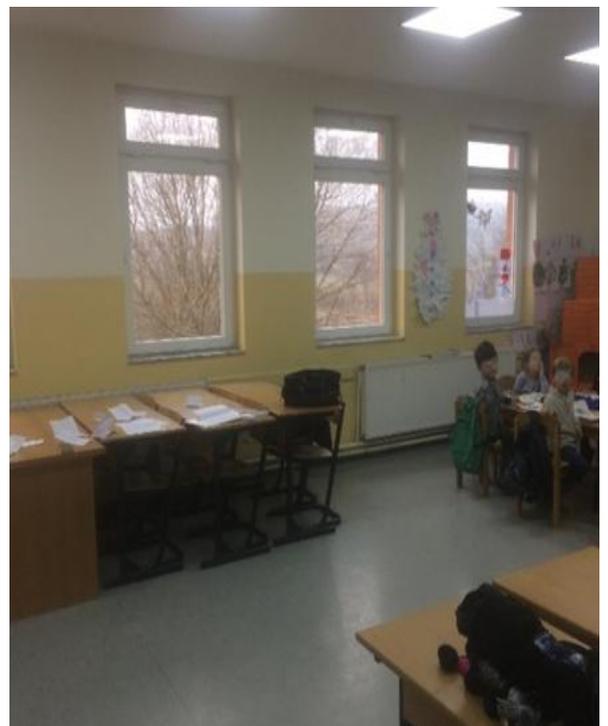


<b>Komuna përfituese</b>	<b>RANILLUG</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së Ranillugut</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Hapja e sipërfaqes për parking, punimi i murit mbrojtës, shtruarja dhe asfaltimi.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	06.06.2019/17.07.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	18,052.22 €	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit	05.09.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	48,052.22 €	
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL	30,000.00 €	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>PRIZREN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Vendosja e trafos dhe vendosja e shtyllave për ndriçim.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>02.05.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>60,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		<b>50,000.00 €</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>16.10.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>104,941.75 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>28,170.00 €</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>MAMUSHË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamushë</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Punimi me pllaka i shtigjeve për ecje, vendosja e ndriçimit dhe vendosja e ulëseve.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	<b>03.06.2019</b>	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>50,000.00 €</b>	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	-	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit	<b>10.10.2019</b>	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>39,895.13 €</b>	
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL	<b>39,895.13 €</b>	

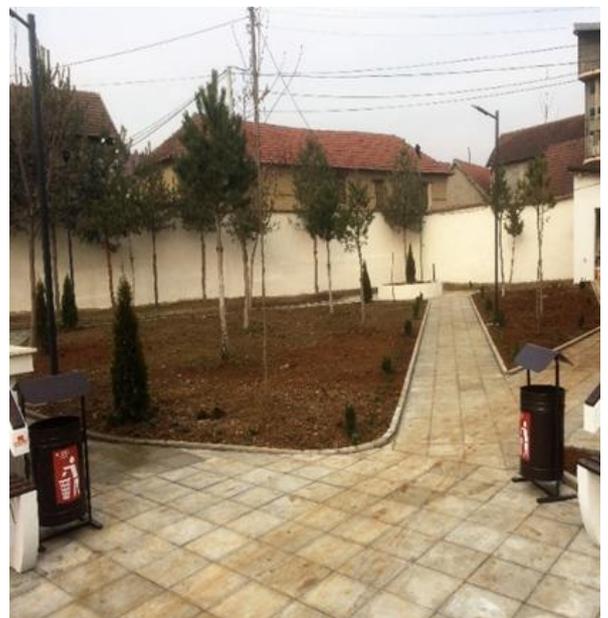

<b>Komuna përfituese</b>	<b>DRAGASH</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i pritoreve - ministacioneve për udhëtarët e linjave urbane dhe nder urbane, largimi dhe sistemimi i deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Dragashit</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për autobus për banorët, largimi dhe pastrimi i deponive ilegale në komunën e Dragashit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>55,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		-
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>20.09.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>42,654.00 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>42,654.00 €</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>SHTIME</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit</b>	
<b>Përshkrimi i projektit</b>	Rindërtimi i urës së vogël dhe riparimi i urës së madhe në qendër të qytetit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		<b>11.06.2019</b>
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>50,000.00 €</b>
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka		<b>-</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit		<b>29.08.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>45,320.50 €</b>
<b>Pagesat</b>		
Vlera e pagesës nga MAPL		<b>42,705.50€</b>




<b>Komuna përfituese</b>	<b>GRAÇANICË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i objekteve për banim social në Graçanicë</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Graçanicës është ndërtuar objekti i banimit P+1K+K me karakter social me gjithsejtë 32 banesa në Graçanicë. Kryesisht janë kryer punimet në fazën e I-rë të ndërtimit punimet të vrazhda të objektit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		04.03.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		280,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		280,000.00€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>29.08.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>489,535.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>280,000.00€</b>






<b>Komuna përfituese</b>	<b>GJILAN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave atmosferike në rrugën "28 NËNTORI"</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Gjilanit është ndërtuar rrjeti i kanalizimit me gypa PE në lagjen "28 Nëntori" afër tregut të veturave në rrugën Januz Tërstena në qytetin e Gjilanit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		55,000.00 €
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		15,783,75€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		01.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		70,783.75€
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		55,000.00 €

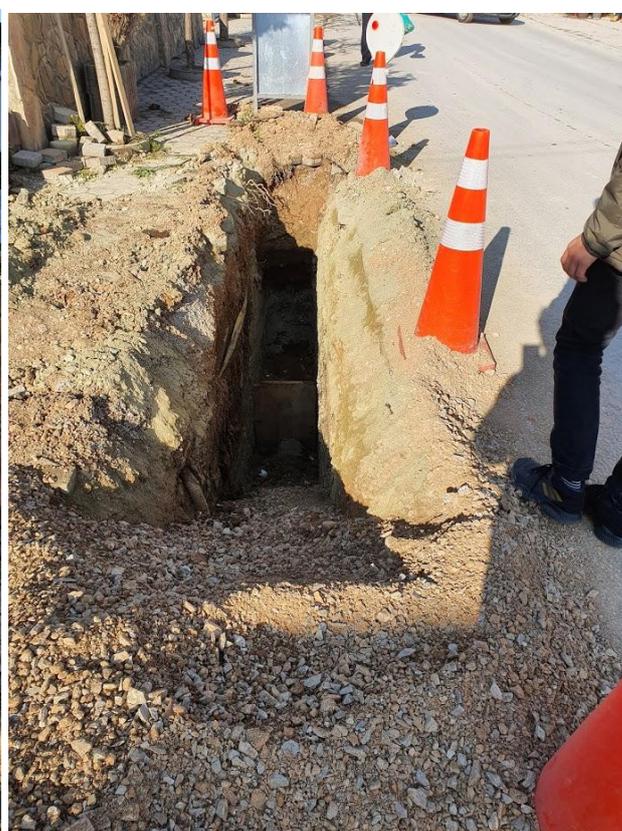


<b>Komuna përfituese</b>	<b>GJILAN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Gjilanit është ndërtuar rrjeti i kanalizimit të ujërave të zeza dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e porodinit në qytetin e Gjilanit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		27.02.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>299,166.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		<b>288,191.00€</b>
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>01.07.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>570,521.053€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>299,166.00€</b>

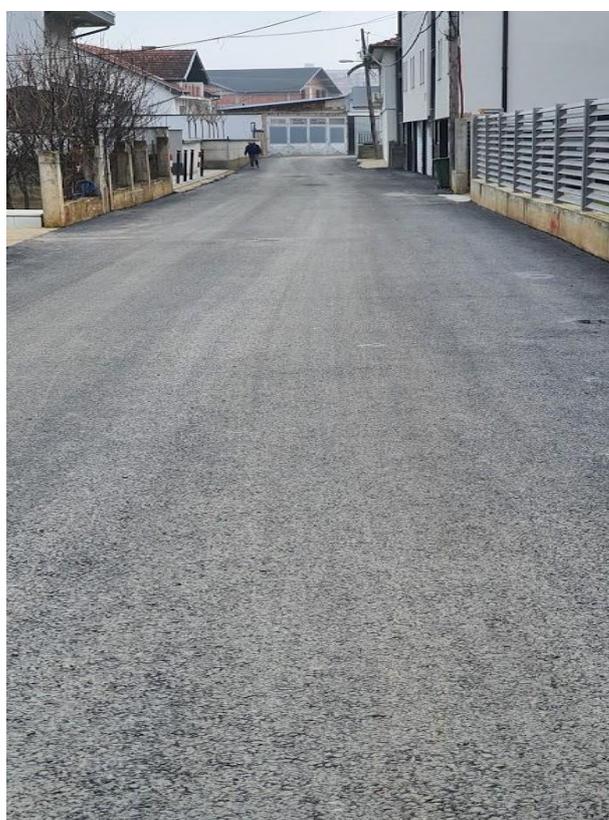

<b>Komuna përfituese</b>	<b>KLINË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Klinës është bërë zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatrat e komunës së Klinës ( Jashanicë, Siqevë ,Poterq, Gjurgjevik, Perqevë, Gjurgjevik i vogël, Rigjevë, lagjia Perlina)	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		45,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		2,820.40€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		12.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		47,820.40€
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		45,000.00€



<b>Komuna përfituese</b>	<b>KLINË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rehabilitimi i shtratit te lumit Istog</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së nga fondet e bashkëpunimit ndër komunal është bërë rehabilitimi i shtratit të lumit “Istog” pjesa e trasesë që kalon në territorin e Komunës se Istogut dhe një pjesë e trasesë që kalon në territorin Komunës së Klinës.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		31.05.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>246,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>21.08.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>149,447.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>149,447.00€</b>

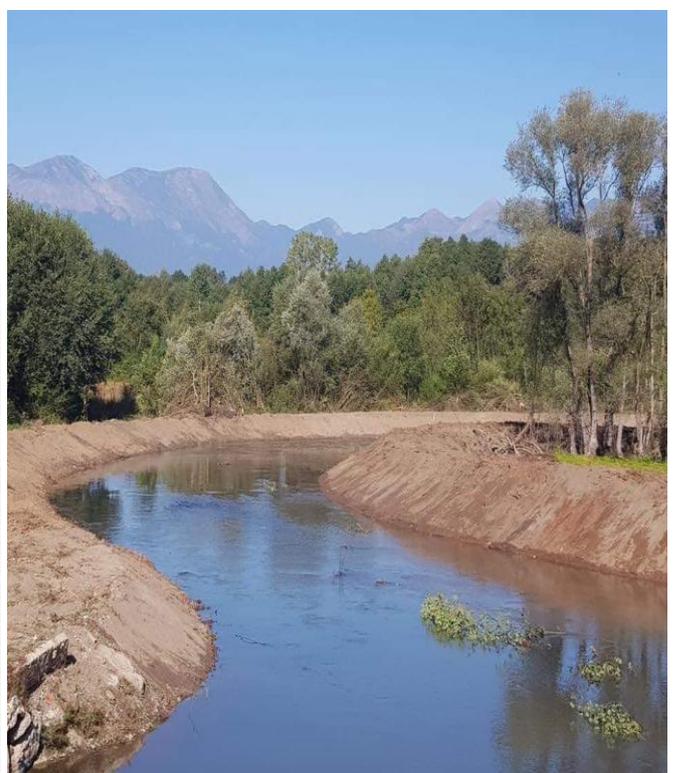

<b>Komuna përfituese</b>	<b>MITROVICË E VERIUT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së nga është bërë rikonstruimi i fasadës , kulmit të objektit të banimit si dhe rregullimi i parterit para objektit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	03.06.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	13.08.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	99,742.50€	
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL	99,742.50€	




<b>Komuna përfituese</b>	<b>MITROVICË E VERIUT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjese të parterit – qasjes të objekteve të banimit në rrugën Kralja Petra I 102-108 në Mitrovicën e Veriut</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi, sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugës si dhe shtrimi i parterit me elemente të betonit-kubëza.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	03.06.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	<b>104,000.00€</b>	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	<b>25.07.2019</b>	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>103,767.23€</b>	
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL	<b>103,766.59€</b>	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>MITROVICË E VERIUT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën “Kralj Petri” dhe “Ivo Lolla Ribar” në Mitrovicën e Veriut</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë renovimi i këndit të lodrave si dhe fushës së sportit në Mitrovicën e Veriut.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		35,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>25.11.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>34,987.94€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>34,986.62€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>MITROVICË E VERIUT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Pajisje të IT për nevoja të administratës së Komunës së M.V.</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë furnizimi me Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës së Mitrovicës së Veriut.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	16.10.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	4,060.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	<b>29.11.2019</b>	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	<b>3,996.00€</b>	
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL	<b>3,996.00€</b>	

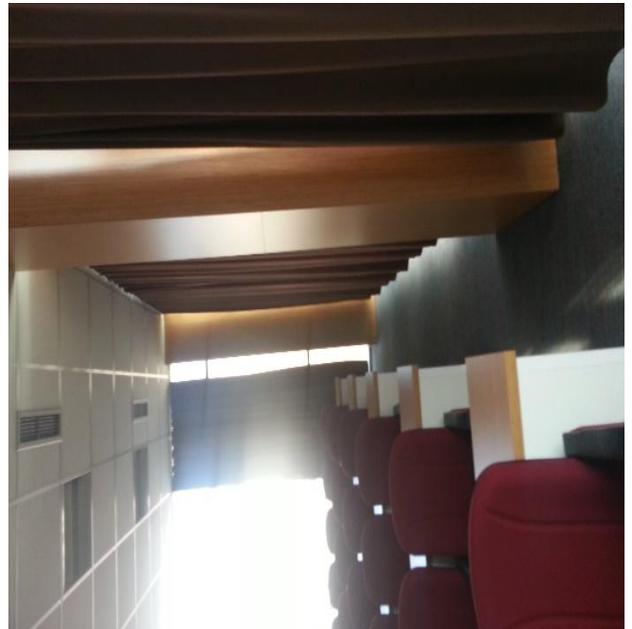





<b>Komuna përfituese</b>	<b>MITROVICË E VERIUT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Pajisje për përkthim simultant</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë furnizimi me Pajisje për përkthim simultant për nevoja të sallës së kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		20,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>18.09.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>15,937.86€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>15,937.86€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>ZVEQAN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv” dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Zveçanit është bërë asfaltimi i një pjese të rrugës afër kompleksit si dhe rregullimi i këndit të lodrave dhe fushës së sportit në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		13.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		25.552,80€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		19.08.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		65,545.30€
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		39,996.50€

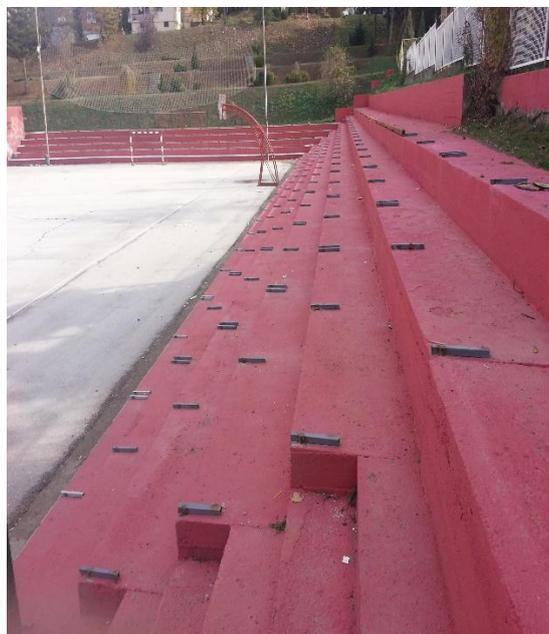

<b>Komuna përfituese</b>	<b>ZVEÇAN</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Furnizimi i pompave për ujësjellës lagjja Zveçan i Vogël</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Zveçanit është bërë furnizimi me dy pompa për nevoja të rrjetit të ujësjellësit për komunën e Zveçanit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		21.11.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		10,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		5,000.00€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>23.12.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>14,990.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>10,000.00€</b>

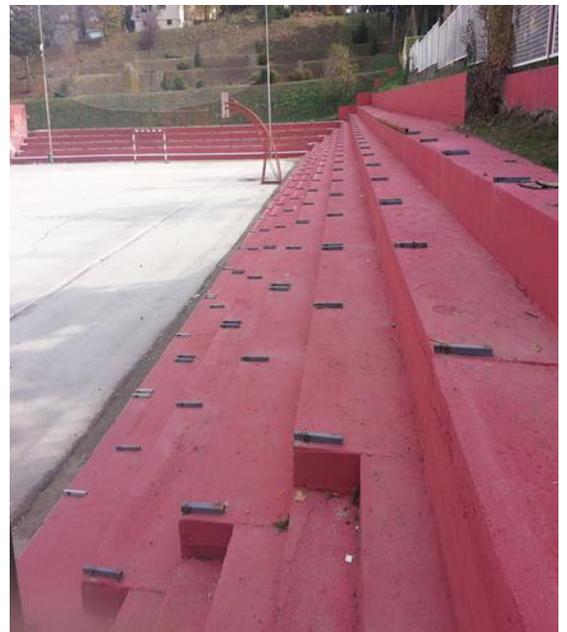

<b>Komuna përfituese</b>	<b>ZUBIN POTOK</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës sportive në Zubin Potok</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë rregullimi i një pjese të shtratit -argjinatura e lumit "Ibër" pjesa nga ana e qendrës sportive gjithashtu trotuari me elemente betoni-kubëza si dhe ndriçimi publik me drita LED .	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>50,000.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>26.07.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>49,518.55€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>49,518.55€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>ZUBIN POTOK</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve të dheut në aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore "Petar Kocic" në fshatin Bërnjak</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi i rrugës dhe sanimi i rrëshqitjeve të dheut në aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore "Petar Kocic" në fshatin Bërnjak Komuna e Zubin Potokut.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		40,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>31.10.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>39,922.94€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>39,922.94€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>LEPOSAVIQ</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në Leposaviq</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi i platos afër komunës, rrugës nga Posta deri te Shtëpia e Mallrave, murit mbrojtës nga betonarme a, rrethoja metalike, Ndriçimi publik me drita LED si dhe vendosja e shtyllëzave të parkingut.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		03.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>21.08.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>49,779.00€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>49,779.00€</b>



<b>Komuna përfituese</b>	<b>PODUJEVË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Podujevës është bërë rregullimi i një pjese të shtratit të lumit me konstruksion betoni dhe m veshja me pllaka guri.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	03.06.2019	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	13,333.73€	
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	<b>Komuna</b>	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	30.10.2019	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	43,333.73€	
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL	30,000.00€	



<b>Komuna përfituese</b>	<b>MITROVICË E JUGUT</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushac</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut është bërë rregullimi i një pjese trasesë së rrugës në fshatin Gushac kryesisht nën struktura e rrugës dhe kanalet e ujërave atmosferike.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		21.10.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		60,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		736,796.80€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>15.10.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>796,796.80€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>60,000.00€</b>






<b>Komuna përfituese</b>	<b>PRISHTINË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Rigjenerimi urban i lagjeve te kryeqytetit</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Prishtinës është bërë rigjenerimi urban i parkut "Bllok pas Blloku" ne lagjen "Bregu i Diellit" dhe rrugës "Xhemajl Mustafa".	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		14.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		27,707.45€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		25.09.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		77,777.91€
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		40,000.00€



<b>Komuna përfituese</b>	<b>SKËNDERAJ</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së Skenderajt është bërë shtrimi me kubëza betoni i rrugëve në lagje të qytetit.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		50,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		10.000,00€
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		03.10.2019
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		56,447.00€
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		50,000.00€

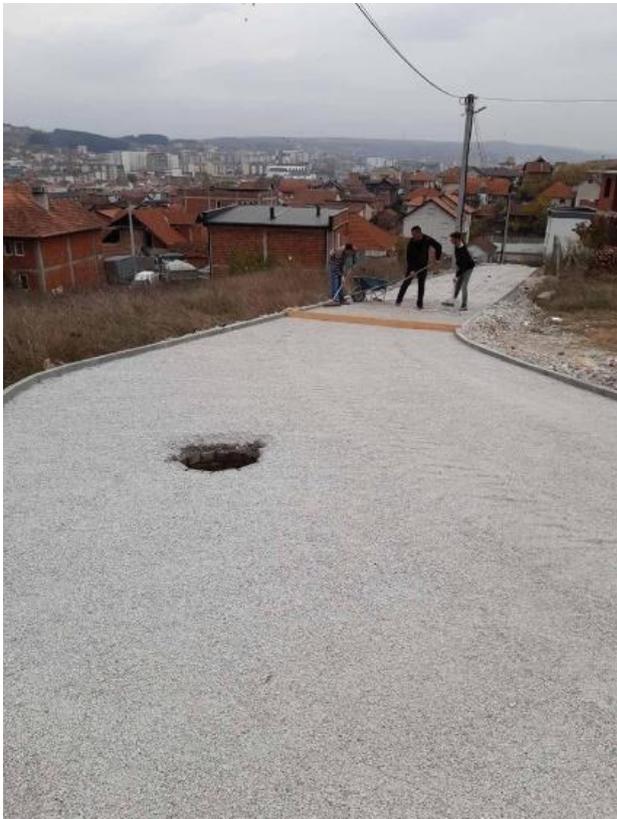

<b>Komuna përfituese</b>	<b>NOVOBËRDË</b>	
<b>Titulli i projektit</b>	<b>Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energji imi i pikës grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë), Komuna e Novobërdë</b>	
<b>Përshkrimi projektit</b>	Me financimin e MAPL-së është bërë vendosja e trafo stacionit , rrjeti i tensionit të lartë , rrjeti i tensionit të ulët si dhe ndriçimi publik me drita LED.	
<b>Përgatitja dhe Faza e Aprovimit</b>		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM		11.06.2019
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL		<b>46,114.00€</b>
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
<b>Kontrata</b>		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga		<b>Komuna</b>
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës		<b>24.09.2019</b>
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës		<b>39,440.44€</b>
<b>Pagesat</b>		
Shuma e pagesave nga MAPL		<b>39,440.44€</b>







**Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2019**

<b>Komuna</b>	<b>Nr. I proj.</b>	<b>Emri i projektit</b>	<b>Fondi</b>	<b>Financimi</b>	<b>Vlera e kontratës</b>	<b>Procedurat e prokurimit</b>	<b>Pagesat</b>
Shtërpce	1	Rregullimi i kanalit dhe trotuarit në Brezovicë	MAPL/D	37,516.00	29,569.81	Komuna	29,569.81
Obiliq	2	Rregullimi i rrugëve në Plemetin	GP	50,000.00	45,668.84	Komuna	45,668.84
Obiliq	3	Ndriçimi prej shkollës "Pandeli Sotiri" Obiliqi I Vjetër deri në kryqëzimin e rrugës "Zahir Pajaziti-Kadri Pllana"	MAPL/D	74,353.9	98,786.40	Komuna	74,353.90
Hani Elezit	4	Ndërtimi ( rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të Elezit	GP	60,000.00	66,056.60	Komuna	60,000.00
Hani Elezit	5	Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve lokale	MAPL/D	48,430.00	163,637.71	Komuna	48,430.00
Kaçanik	6	Rregullimi I ndriçimit publik	GP	50,000.00	84,980.00	Komuna	50,000.00
Kaçanik	7	Rregullimi dhe asfaltimi I rrugëve në qytet	MAPL/D	127,643.00	229,791.00	Komuna	127,643.00
Gllgoc	8	Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavices	BNK	300,000.00	187,000.00	Komuna	140,295.00
Gllgoc	9	Asfaltimi I rruges Gllanasell - Godanc, Faza e dytë	GP	60,000.00	97,588.00	Komuna	60,000.00
Gllgoc	10	Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Vërbovc dhe Polluzhë, faza e dytë	GP	20,000.00	36,180.00	Komuna	20,000.00
Gjakovë	11	Renovimi i Bibliotekës ndërkomunale "Ibrahim Rugova"		30,000.00	22,744.00	Komuna	21,644.00
Junik	12	Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes	GP	65,000.00	777,777.77	Komuna	65,000.00
Deçan	13	Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg	GP	60,000.00	54,158.37	Komuna	54,158.37
Rahovec	14	Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit	GP	20,000.00	438,000.00	Komuna	20,000.00
Vushtrri	15	Zgjerimi I rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë	GP	45,000.00	49,826.10	Komuna	45,000.00
Vushtrri	16	Instalimi i kamerave në qytet	GP	15,000.00	13,940.00	Komuna	13,940.00

Pejë	17	Ndriçimi publik prej rrethit të Dulija deri tek rrethi i bulevardit të gjelbër	GP	55,000.00	38,482.00	Komuna	38,482.00
Ferizaj	18	Rregullimi I parkut dhe këndit të lojërave në zonën rekreative - sportive në Komunën e Ferizajt	GP	55,000.00	67,111.15	Komuna	50,094.00
Istog	19	Asfaltimi I rrugëve Bekim Fehmiu dhe Arben Januzaj	GP	55,000.00	63,459.50	Komuna	55,000.00
Fushë Kosovë	20	Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të madhe	GP	55,000.00	60,870.00	Komuna	55,000.00
Suharekë	21	Ndërtimi i Parqeve në Komunë	GP	50,000.00	67,660.00	Komuna	50,000.00
Malishevë	22	Renovimi i objektit të administratës të Komunës	GP	50,000.00	87,479.53	Komuna	50,000.00
Lipjan	23	Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan	MAPL/demos	231,925.00	317,980.80	Komuna	227,834.24
Lipjan	24	Kiosqet në tregun e gjelbërt në Lipjan	GP	50,000.00	44,606.90	Komuna	44,606.90
Klllokot	25	Asfaltimi i rrugëve në territorin e Klllokotit	MAPL	50,000.00	45,868.10	Komuna	45,868.10
Klllokot	26	Asfaltimi i rrugëve në territorin e Klllokotit - faza e dytë	MAPL	40,000.00	36,816.70	Komuna	36,816.70
Partesh	27	Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe rregullimi i pllatos para ndërtesës	MAPL	30,000.00	44,244.10	Komuna	30,000.00
Partesh	28	Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme	MAPL	50,000.00	54,864.91	Komuna	50,000.00
Viti	29	Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë	MAPL	40,000.00	35,087.00	Komuna	35,080.00
Viti	30	Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së Vitisë	MAPL	129,521.00	273,521.80	Komuna	129,521.00
Kamenicë	31	Renovimi i objektit shkollor me qëllim për de stinimin për objekt parashkollor	MAPL	30,000.00	25,381.00	Komuna	22,476.66
Ranillugë	32	Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së Ranillugut	MAPL	30,000.00	48,052.22	Komuna	30,000.00

Prizren	33	Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash	LB	60,000.00	104,941.75	Komuna	28,170.00
Mamushë	34	Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamush	MAPL	50,000.00	39,895.13	Komuna	39,895.13
Dragash	35	Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për udhëtarët e linjave urbane dhe ndër urbane, largimi dhe sistemimi i deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Dragashit	GP	55,000.00	42,654.00	Komuna	42,654.00
Shtime	36	Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit	GP	50,000.00	45,320.50	Komuna	42,705.00
Graçanicë	37	Ndërtimi i objekteve për banim social në Graçanicë	MAPL	280,000.00	489,535.00	Komuna	280,000.00
Gjilan	38	Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave atmosferike në rrugën “28 NËNTORI”	GP	55,000.00	70,785.75	Komuna	55,000.00
Gjilan	39	Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit	MAPL/Demos	299,166.00	570,521.053	Komuna	299,166.00
Klinë	40	Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës	GP	45,000.00	47,820.40	Komuna	45,000.00
Klinë	41	Rehabilitimi i shtratit të lumit Istog	MAPL	246,000.00	149,447.00	Komuna	149,447.00
Mitrovicë e Veriut	42	Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV	MAPL	100,000.00	99,742.50	Komuna	99,742.50
Mitrovicë e Veriut	43	Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjesë të parterit - qasjes të objekteve të banimit në rrugën Kralja Petra I 102-108 në Mitrovicë e Veriut	MAPL	104,000.00	103,767.23	Komuna	103,766.59
Mitrovicë e Veriut	44	Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën “Kralj Petri” dhe “Ivo Lllolla Ribar” në Mitrovicën e Veriut	MAPL	35,000.00	34,987.94	Komuna	34,986.62
Mitrovicë e Veriut	45	Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës së M.V.	MAPL	4,060.00	3,996.00	Komuna	3,996.00



Mitrovicë e Veriut	46	Pajisje për përkthim simultant	MAPL	20,000.00	15,937.86	Komuna	15,937.86
Zveçan	47	Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv" dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu	MAPL	40,000.00	65,545.30	Komuna	39,996.50
Zveçan	48	Furnizimi i pompave për ujësjellës lagjja Zveçan i Vogël	MAPL	10,000.00	14,990.00	Komuna	10,000.00
Zubin Potok	49	Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës sportive në Zubin Potok	MAPL	50,000.00	49,518.55	Komuna	49,518.55
Zubin Potok	50	Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve te dheut ne aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore "Petar Kocic" në fshatin Bërnjak	MAPL	40,000.00	39,922.94	Komuna	39,922.94
Leposaviq	51	Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në Leposaviq	MAPL	50,000.00	49,779.00	Komuna	49,779.00
Podujevë	52	Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap	MAPL	30,000.00	43,333.73	Komuna	30,000.00
Mitrovicë e Jugut	53	Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushac	GP	60,000.00	796,796.80	Komuna	60,000.00
Prishtinë	54	Rigjenerimi urban i lagjeve të kryeqytetit	GP	50,000.00	77.777.91	Komuna	40,000.00
Skenderaj	55	Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit	GP	50,000.00	56,447.00	Komuna	50,000.00
Novobërda	56	Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energjizimi i pikës grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë), Komuna e Novobërdë	GP	46,114.00	39,440.44	Komuna	39,440.44
						<b>TOTAL</b>	<b>3,475,550.74</b>
