



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Pushtetit Lokal
Ministarstvo Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government

Departamenti për Zhvillim të Qendrueshëm Komunal
Divizioni për Zhvillim dhe Menaxhim të Projekteve

Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2020


Mars 2021

Contents

KAÇANIK.....	4
Rehabilitimi i bulevardit "Ismajl Raka" dhe "Qamil Ilazi"	4
KAÇANIK.....	5
Zgjerimi i rrugës "Avdurrakim Shehu"-Kaçanik.....	5
JUNIK.....	6
Asfaltimi i Rrugës Lokale Junik - Gjocaj.....	6
RAHOVEC	7
Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit	7
RAHOVEC	8
Trajtimi i shtretërve të përrenjve në komunën e Rahovecit	8
VUSHTRRI.....	9
Rregullimi i sheshit "Adem Jashari"	9
PEJË.....	10
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vitomiricë	10
ISTOG	11
Asfaltimi i rrugës në Llukac të Begut.....	11
FUSHË KOSOVË.....	12
Asfaltimi i rrugës Pomozotin-Fushë Kosovë	12
MALISHEVË.....	13
Zgjerimi i rrugës Malishevë-Banjë.....	13
VITI	14
Rregullimi i sheshit në qendër të Vitisë	14
VITI	15
Rregullimi i fushave sportive	15
RANILLUG	16
Ndërtimi i ujësjellësit për dy fshatra (Paçellë dhe Tomancë)	16
SHTIME	17
Rregullimi i sheshit të qytetit faza e dytë-ritenderim	17
GRAÇANICË.....	18
Ndërtimi i lagunave në fund të kolektorit fekal	18
GJILAN.....	19
Rehabilitimi i rrugës në Pograxhë	19
KLINË	20
Ndërtimi i fushës ndihmëse të futbollit - Faza e dytë.....	20
KLINË	21
Ndërtimi i kanalizimit Ujmir-Shtaricë-Siqevë-Doberdol	21
KLINË.....	22
Asfaltimi i rrugëve lokale Shtupel-Kërrnicë	22
KLINË	23
Ndërtimi i liqenit akumulues dhe hapja e puseve për ujë të pijes	23
MITROVICË E VERIUT	24
Ndërtimi i parterit të lodrave në çerdhen e fëmijëve	24
MITROVICË E VERIUT	25
Ndërtimi i ndriçimit në oborrin e SHM "M.P. Alas"	25

MITROVICË E VERIUT	26
Ndërtimi i një pjese të trotuarit me sipërfaqe gjelbëruese në rrugën “Mbreti Peter I”	26
ZVEQAN	27
Asfaltimi i rrugëve të pa kategorizuara në Komunën e Zveçanit	27
ZUBIN POTOK.....	28
Pastrimi i lumit “Ibër” në Pritvoricë	28
LEPOSAVIQ.....	29
Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të Leposaviqit.....	29
SKËNDERAJ	30
Ndriçimi publik dhe trotualet në bashkësi lokale.....	30
SKËNDERAJ	31
Poligoni sportiv	31
SKËNDERAJ	32
Rehabilitimi i Sheshit “Adem Jashari”	32

Komuna përfituese	KAÇANIK	
Titulli i projektit	Rehabilitimi i bulevardit ‘Ismajl Raka” dhe “Qamil Ilazi”	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punimet te pozicionet Punët e demolimit , punët e kanalizimit atmosferik, montimi i anësoreve dhe kubëzave dhe punët e asfaltimit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	23.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	30,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	130,424.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	23.11.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	30,000.00€	

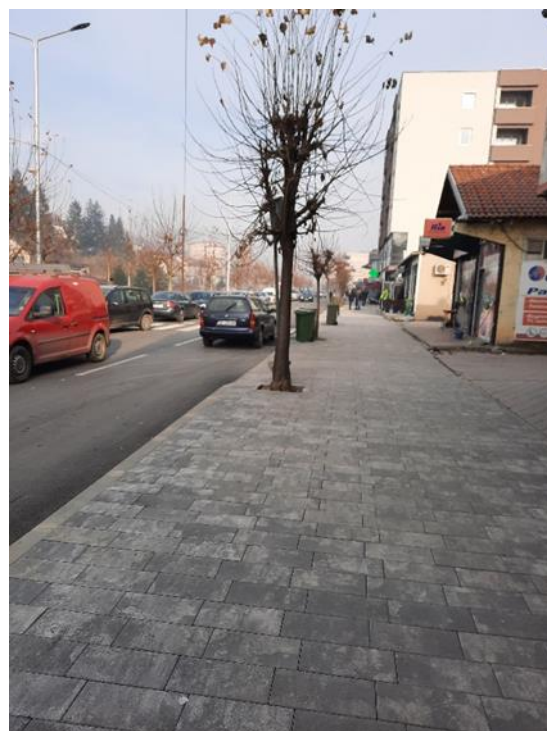

Komuna përfituese	KAÇANIK	
Titulli i projektit	Zgjerimi i rrugës “Avdurrahim Shehu”-Kaçanik	
Përshkrimi i projektit	Është bërë zgjerimi i rrugës, punimet tokësore, kanalizimit atmosferik, kanalizimit fekal, muret mbrojtëse, mbushja me zhavorr dhe asfaltimi i rrugës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	69,508.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	102,148.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	23.07.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	199,935.11€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	69,508.00€	



Komuna përfituese	JUNIK	
Titulli i projektit	Asfaltimi i Rrugës Lokale Junik - Gjocaj	
Përshkrimi i projektit	janë kryer këto punime:gërmimi, planifikimi dhe ngjeshja e trupit të rrugës, mbushja me material jo koherent, shtrimi i zhavorit 0-63 dhe 0-31.5 mm dhe ngjeshja e tyre, punimi i lëshesave dhe asfaltimi i rrugës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	187,254.00€	
Vlera e bashkë financimit për vitin 2020/ nëse ka	14,381.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	13.07.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	201,635.00€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	187,254.00 €	



Komuna përfituese	RAHOVEC	
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punimet në rrugën "Petro Marko" në Varjak, një pjesë e punimeve në rrugën pa emerë në Varjak, një pjesë e punimeve në rrugët "Beqir Morina" dhe Brahim-Miftarëve" në Ratkoc, kontrata 2 vjeqare e ndarë në 3LOT-e	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	47,865.50.€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka për vitin 2020-21	45,000.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	31.10.2019	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	875,546.65€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	47,865.50.€	



Komuna përfituese	RAHOVEC	
Titulli i projektit	Trajtimi i shtretërve të përrenjve në komunën e Rahovecit	
Përshkrimi i projektit	Në kuadër të këtij projekti MPL ka financuar rregullimin e shtratit të përroit, urës dhe lëshesave pllakore, trotuarit me kubëza betoni , rrjetin e kanalizimit fekal dhe punimeve tjera në fshatin Opterushë. Projekt dy vjeçar	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	13.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	100.000,00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka për vitin 2020-21	715,988.10€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	2.09.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	815.988,10 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	47,865.50.€	



Komuna përfituese	VUSHTRRI	
Titulli i projektit	Rregullimi i sheshit “Adem Jashari”	
Përshkrimi i projektit	Hapja, vendosja e gypave elastik të brinjëzuar, shtrimi i rërës nën dhe mbi gypa, vendosja e shiritit sinjalizues, dhe mbulimi i kanalit, punimi i pusetave ,bazamentet e ormanave dhe shtyllave, vensosja e gurëve skajor , riparimi i asfaltit, vendosja e kubëzave, vendosja e trupave ndriçues, bazamenti i shtëpizës për transformator, etj	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	23.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	335,015.05€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	31,064.60€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	24.07.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	366,079.65€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	329,405.01 €	



Komuna përfituese	PEJË	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vitomiricë	
Përshkrimi i projektit	Është bërë gjurmimi, shtruarja e shtresave të zhavorrit, ngjeshja dhe punimi i shtresës së asfaltit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020 16.09.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	10.11.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	59,920.00 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,000.00€	



Komuna përfituese	ISTOG	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës në Llukac të Begut	
Përshkrimi i projektit	Shënimi i trasesë, pastrimi i terrenit, gërmimi, planifikimi dhe ngjeshja e trupit të rrugës, mbushja me guri të thyer gëlqeror 0-150 mm, shtrimi i zhavorrit 0-63 dhe 0-31 mm dhe ngjeshja e tyre, punimi i lëshesave, asfaltimi i rrugës dhe punimi i bankinave .Projekti i përfunduar në vitin 2020 dhe pagesa do të bëhet 2021	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	01.09.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	18,519.65 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	12.11.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	68,519.65 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	Pagesa në vitin 2021€	




Komuna përfituese	FUSHË KOSOVË	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Pomozotin-Fushë Kosovë	
Përshkrimi i projektit	Është bërë germimi, punimi i shtresave të zhavorrit, ngjeshja dhe punimi i shtresës së asfaltit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	29.10.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	36,862.20 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	36,862.20 €	



Komuna përfituese	MALISHEVË	
Titulli i projektit	Zgjerimi i rrugës Malishevë-Banjë	
Përshkrimi i projektit	Është bërë germimi i rrugës, zgjerimi, shtrirja e tubave për ujërat atmosferik dhe ujërat e zeza, dislokimi i rrjetit të ujësjellësit, vendosja e nje pjese të skajoreve dhe punimi i shtresës së asfaltit ne njëren trase të rrugës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	203,147.00 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	162,654.61 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	27.08.2020	
vlera e kontratës / Aneks Kontratës	365,801.20 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	200,561.60 €	



Komuna përfituese	VITI	
Titulli i projektit	Rregullimi i sheshit në qendër të Vitisë	
Përshkrimi i projektit	Punimet: inqizimi I trasesë, demolimet e asfaltit, skajoreve, vendosja e materialit guror 0-63 dhe 0.31.5 mm , vendosja e pllakave, punimi i fontanës, punimi i ulseve she punimi i sistemit të ujitjes së parkut afer sheshit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	23.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	150,047.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	44,177.20	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	07.08.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	194,223.75€	
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL	150,047.00 €	

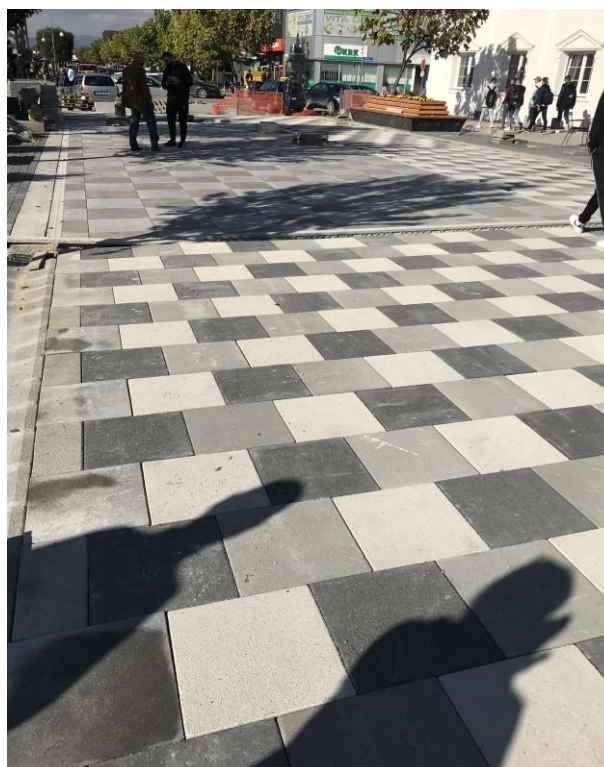


Komuna përfituese	VITI	
Titulli i projektit	Rregullimi i fushave sportive	
Përshkrimi projektit	Rregullimi fushës së futbollit në Smirë dhe një pjesë e fushës së futbollit në Radivojcë.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	75,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	07.10.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	124,538.11 €	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	50,000.00€	



Komuna përfituese	RANILLUG	
Titulli i projektit	Ndërtimi i ujësjellësit për dy fshatra (Pançellë dhe Tomancë)	
Përshkrimi i projektit	Është bërë punimi dhe ndërtimi i rezervuarit, hapja e pusit - ndërtimi i shtëpizës, shtrirja e gypave dhe shtrirja e instalimeve elektrike, instalimi i pompës etj	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	20,938.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	4,351.66 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit	26.08.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	25,289.53 €	
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL	20,770.71 €	




Komuna përfituese	SHTIME	
Titulli i projektit	Rregullimi i sheshit të qytetit faza e dytë-ritenderim	
Përshkrimi i projektit	Është bërë gjërmimi, mbushja, shtruarja e shtresës së zhavorrit, ngjeshja , vendosja e anësoreve, kaskadave, rregullimi i parkingut, instalimi i ndriçimit etj. Pagesa në vitin 2021	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	44,086.11 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	80,744.35 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit	03.11.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	124,830.46 €	
Pagesat		
Vlera e pagesës nga MAPL	44,086.11 €	

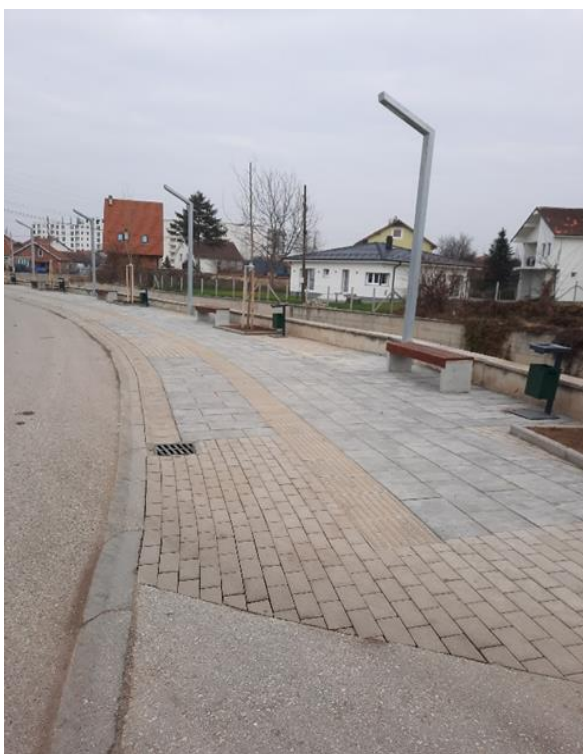

Komuna përfituese	GRAÇANICË	
Titulli i projektit	Ndërtimi i lagunave në fund të kolektorit fekal	
Përshkrimi projektit	Punimet paraprake, punimeve të dheut, dhe një sasi të punëve të zhavorit dhe ngjeshja e tyre dhe vendosja e gypave, projekti shërben për pastrimineujt të kanalizimit fekal	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	13,757.96€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	02.10.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	63,757.96 €	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	50,000.00€	



Komuna përfituese	GJILAN	
Titulli i projektit	Rehabilitimi i rrugës në Pograxhë	
Përshkrimi projektit	Punimet paraprake, punimet të dheut, dhe një sasi të punëve të zhavorit dhe ngjeshja e tyre sipas situacionit, një pjesë e kubëzave, skajoreve dhe rrjeti elektrik.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	154,207.38€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	06.11.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	204,207.38€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	50,000.00 €	

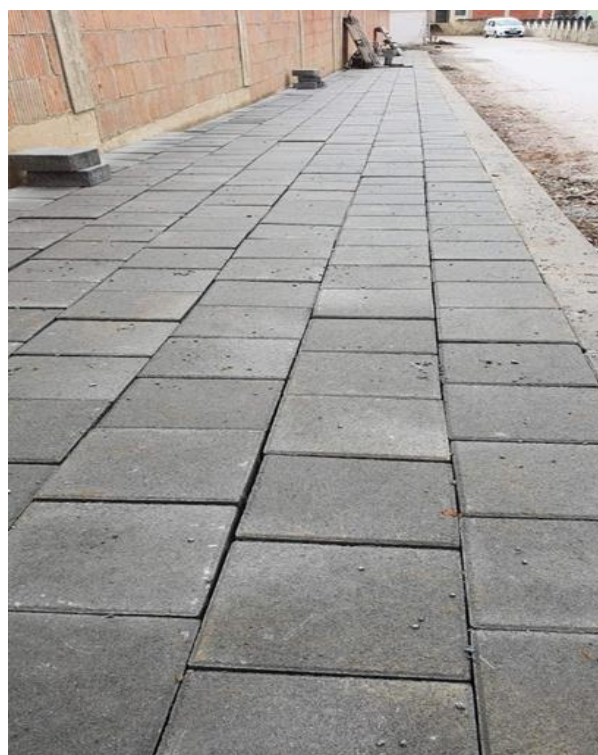

Komuna	KLINË
Titulli i projektit	Ndërtimi i fushës ndihmëse të futbollit - Faza e dytë
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt është financuar rregullimi i stadionit ndihmës të qytetit me bari artificial dhe sistemin e drenazhimit si dhe është rregulluar parku i qytetit të Klinës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	80,000.00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	44,877.50€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	22.06.2020
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	124.877,50€
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	80,000.00€



Komuna	KLINË
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalizimit Ujmir-Shtaricë-Siqevë-Doberdol
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt janë kryer punimet e parapara me kontratë për shtrirjen e rrjetit të kanalizimit fekal me gypa të PE të brinjëzuarë në fshatrat Ujmir-Shtaricë-Siqevë-Doberdol
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	40.000,00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	17.07.2020
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	87.518,32€
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	40.000,00€



Komuna përfituese	KLINË	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve lokale Shtupel-Kërrnicë	
Përshkrimi projektit	Nga pjesa e fondeve të financuara nga MPL është bërë asfaltimi i një pjese të rrjetit të rrugëve lokale (aksi 17 dhe aksi 19) në fshatin Shtupel dhe Kërrnicë komuna e Klinës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	28.976,00 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	118,789.50€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	05.08.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	147.765,50€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	28.976,00€	




Komuna	KLINË
Titulli i projektit	Ndërtimi i liqenit akumulues dhe hapja e puseve për ujë të pijes
Përshkrimi projektit	Me këto fonde është kryer një pjesë e projektit për rritjen e kapaciteteve të liqenit akumulues për përpunimin e ujit të pijes te fabrika e ujit me çka është shtuar edhe sasia e ujit të pijes për banorët e qytetit të Klinës. Projekti nuk ka përfunduar. Pagesa në vitin 2021
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	23.04.2020
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	25.000,00€
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	€
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	30.09.2020
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	44.725,00€
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	15,000.00 €



Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Ndërtimi i parterit te lodrave në çerdhen e fëmijëve	
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt është financuar rregullimi i parterit në oborrin e çerdhes së fëmijëve ku janë përfshi punimi i murit mbrojtës nga betoni, punët e bravarisë, punimet e nënstrukturës, instalimet elektrike, furnizimi me pajisje ,punët e hortikulturës dhe punime tjera.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	13.10.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	49,890.33 €	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	28,361.23€ 21,529.10 vitin 2021	



Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Ndërtimi i ndriçimit në oborrin e SHM "M.P. Alas"	
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt është financuar punimi i ndriçimit me shtylla metalike dhe drita LED si vendosjen shtrirjen e rrjetit elektrik ,montimi i ormanit komandues, trotuarit dhe punime tjera në oborrin e shkollës mesme teknike "M.P. Alas"ne Mitrovicën e Veriut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	50,000.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	13.10.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	49,969.59€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	49,969.59€ pagesa në vitin 2021	

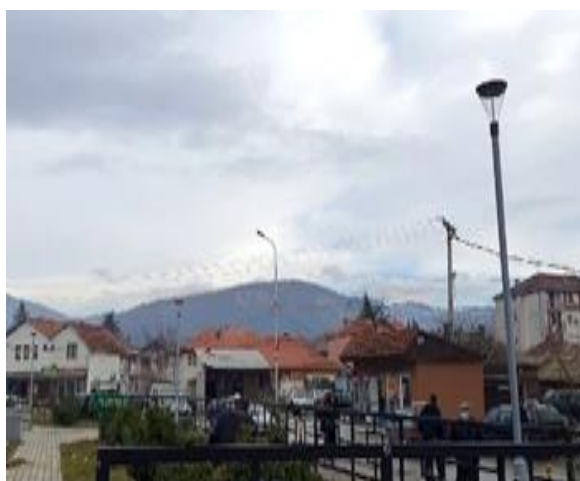

Komuna përfituese	MITROVICË E VERIUT	
Titulli i projektit	Ndërtimi i një pjese të trotuarit me sipërfaqe gjelbëruese në rrugën “Mbreti Peter I”	
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt është financuar punimi i një pjese të trotuarit me beton struktural, vendosja e ndriçimit publik me drita LED dhe shtylla dekorative metalike dhe rrjeti elektrik si dhe punime tjera te hortikulturës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	23,962.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	13.10.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	23,885.60€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	23,885.60€ pagesa në vitin 2021	





Komuna përfituese	ZVEQAN	
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve të pa kategorizuara në Komunën e Zveçanit	
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt është financuar asfaltimi i një pjese të rrugëve lokale të Zveçanit. Pagesa në vitin 2021	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	49.847,75€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	06.10.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	49.847,75€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	Pagesa në vitin 2021	



Komuna përfituese	ZUBIN POTOK	
Titulli i projektit	Pastrimi i lumit “Ibër” në Pritvoricë	
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt është bërë pastrimi dhe zgjerimi i shtratit të lumit nga vegjetacioni ,mbeturinat drunjtë etj. në dy anët e argjinaturave në gjatësi 5 km ne lokacionin e Pritvoricës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	49.500,00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	25.09.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	49.383,00€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	49.383,00€	




Komuna përfituese	LEPOSAVIQ	
Titulli i projektit	Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të Leposaviqit	
Përshkrimi projektit	Me këtë projekt është financuar ndriçimi i një pjese të rrugëve lokale të Leposaviqit me drita LED eficiente përfshiri kabllimin dhe vendosjen e shtyllave .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	27.08.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	49,500.00€	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	14.12.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	49,813.80€	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	29,557.90€ 19,825.10 € pagesë në vitin 2021	

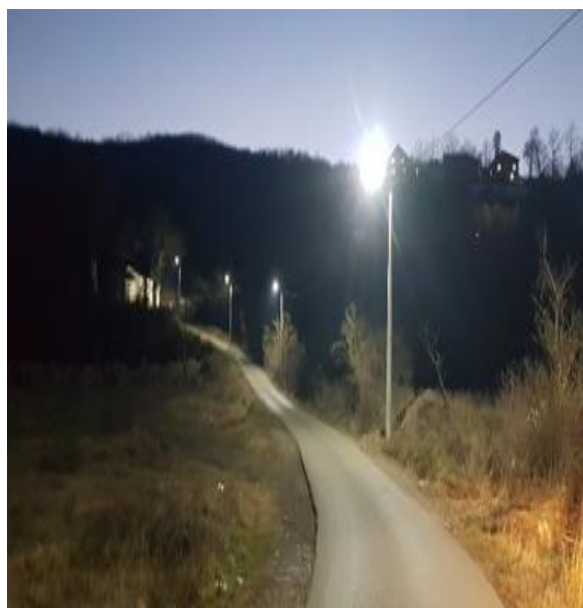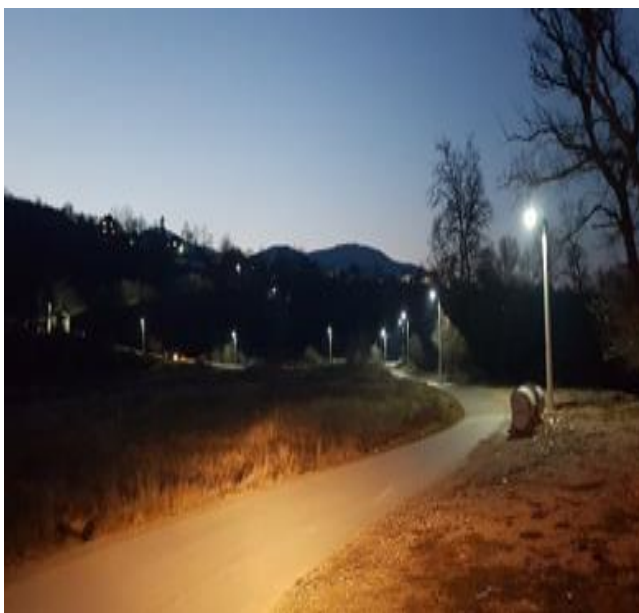

Komuna përfituese	SKËNDERAJ	
Titulli i projektit	Ndriçimi publik dhe trotuaret në bashkësi lokale	
Përshkrimi projektit	Është bërë punimi trotuareve: gërmimi i dheut, mbushja me shtresa të zhavorit, ngjeshja dhe vendosja e skajoreve dhe kubëzave të betonit në trotuare.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	115,000.00 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	44,701.20 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	30.07.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	159,701.20 €	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	115,000.00 €	



Komuna përfituese	SKËNDERAJ	
Titulli i projektit	Poligoni sportiv	
Përshkrimi projektit	Është bërë punimi i poligonit : gjurmimi i dheut, mbushja me zhavorr, ngjeshja, vendosja e skajoreve , punimi i asfaltit dhe vendosja e kubëve të betonit, punimi i rrethojës, ndriçimit dhe vendosja e elementeve sportive	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	22,000.00 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	702.61 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	15.09.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	22,702.61 €	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	22,000.00 €	

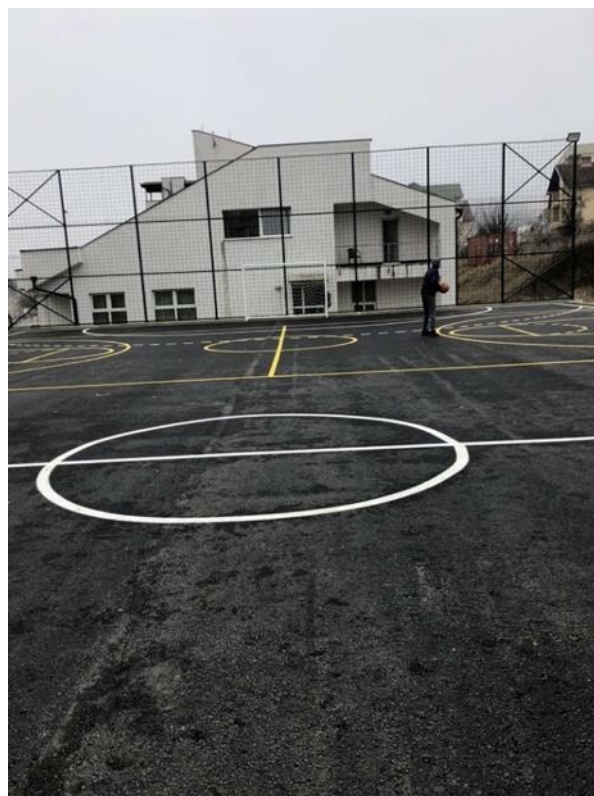

Komuna përfituese	SKËNDERAJ	
Titulli i projektit	Rehabilitimi i Sheshit “Adem Jashari”	
Përshkrimi projektit	Është bërë rivendosja e pllakave , instalimi i ndriçimit , të ujitjes, vendosja e pengesave, koritave të gjelbërimit etj.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MM	24.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL	70,315.00 €	
Vlera e bashkë financimit / nëse ka	4,639.45 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës	30.07.2020	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	74,954.45 €	
Pagesat		
Shuma e pagesave nga MAPL	70,315.00 €	





Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2020 të përfunduara finaciarsisht

Komuna	Nr I proj.	Emri i projektit	Fondi	Financimi MPL	Vlera e kontratës	Procedurat e prokurimit	Pagesat	Bashkëfinancimi nga komuna
Kaçanik	1	Rehabilitimi i bulevardit 'Ismajl Raka' dhe 'Qamil Ilazi'	GP	30,000.00	160,424.00	Komuna	30,000.00	130,424.00
Kaçanik	2	Zgjerimi i rrugës "Avdurrahim Shehu"-Kaçanik	GP	69,508.00	199,935.11	Komuna	69,508.00	130,427.11
Junik	3	Asfaltimi i Rrugës Lokale Junik - Gjocaj	GP	187,253.78	201,635.00	Komuna	187,253.78	14,381.22
Rahovec	4	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit	GP	47,865.50	875,546.65	Komuna	47,865.50	827,681.15
Rahovec	5	Trajtimi i shtretërve të përrrenjve në komunën e Rahovecit	GP	100,000.00	815,988.10	Komuna	100,000.00	715,988.10
Vushtrri	6	Rregullimi i sheshit "Adem Jashari"	GP	335,015.05	366,079.65	Komuna	329,405.01	36,674.64
Pejë	7	Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vitomiricë	MPL	50,000.00	59,920.00	Komuna	50,000.00	9,920.00
Fushë Kosovë	8	Asfaltimi i rrugës Pomozotin-Fushë Kosovë	MPL	36,862.00	36,862.00	Komuna	36,862.00	
Malishevë	9	Zgjerimi i rrugës Malishevë-Banjë	GP	200,561.60	365,801.20	Komuna	200,561.60	165,329.60
Viti	10	Rregullimi i sheshit në qendër të Vitisë	GP	150,046.55	194,223.75	Komuna	150,046.55	44,177.20
Viti	11	Rregullimi i fushave sportive	MPL	500,000.00	124,538.11	Komuna	50,000.00	75,000.00
Ranillugë	12	Ndërtimi i ujësjellësit për dy fshatra (Pançellë dhe Tomancë)	GP	20,770.71	20,770.71	Komuna	20,770.71	
Graçanicë	13	Ndërtimi i lagunave në fund të kolektorit fekal	MPL	50,000.00	63,757.96	Komuna	50,000.00	13,757.96
Gjilan	14	Rehabilitimi i rrugës në Pograxhë	MPL	50,000.00	211,643.65	Komuna	50,000.00	161,643.65

Klinë	15	Ndërtimi i fushës ndihmëse të futbollit - Faza e dytë	GP	80,000.00	124,877.50	Komuna	80,000.00	44,877.50
Klinë	16	Ndërtimi i kanalizimit në Ujmir-Shtaricë-Siqevë-Dobërdol	GP	40,000.00	87,518.32	Komuna	40,000.00	47,518.32
Klinë	17	Asfaltimi i rrugëve lokale Shtupel-Kërrnicë	GP	28,976.00	147,765.50	Komuna	28,976.00	118,789.50
Mitrovicë e Veriut	18	Ndërtimi i parterit të lodrave në qerdhën e fëmijëve	MPI	28,361.23	49,890.33	Komuna	28,361.23	
Zubin Potok	19	Pastrimi i lumit Ibër në Pritvoricë	MPL	49,383.00	49,383.00	Komuna	49,383.00	
Leposaviq	25	Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të Leposaviçit	MPL	29,557.90	49,813.80	Komuna	29,557.90	
Skenderaj	26	Rehabilitimi i sheshit Adem Jashari	GP	70,315.00	74,954.45	Komuna	70,315.00	4,639.45
Skenderaj	27	Ndërtimi i poligoni sportiv	GP	22,000.00	22,702.61	Komuna	22,000.00	702.61
Skenderaj	28	Ndriçimi publik dhe trotualet në bashkësi lokale	GP	115,000.00	159,701.20	Komuna	115,000.00	44,701.20
						TOTAL	1,835,866.28	

Raport i projekteve të cilat kanë përfunduar teknikisht por do të paguhen gjatë viti 2021

Istog	1	Asfaltimi i rrugës në Llukac të Begut	MPL	50,000.00	68,519.65	Komuna	50,000.00	18,519.65
Shtime	2	Rregullimi i sheshit të qytetit faza e dytë-ritenderim	MPL	44,086.11	124,830.46	Komuna	44,086.11	80,744.35
Mitrovicë e Veriut	3	Ndërtimi i parterit të lodrave në qerdhën e fëmijëve	MPI	21,529.10	21,529.10	Komuna	21,529.10	
Mitrovicë e Veriut	4	Ndërtimi i ndriçimit në oboorrin e SHM "M.P. Alas"	MPL	49,969.59	49,969.59	Komuna	49,969.59	
Mitrovicë e Veriut	5	Ndërtimi i një pjese të trotuarit me sipërfaqe gjelbëruese në rrugën Mbreti Peter I	MPI	23,885.60	23,885.60	Komuna	23,885.60	
Zveçan	6	Asfaltimi i rrugëve të pa kategorizuara në Komunën e Zveçanit	MPL	49,847.75	49,847.75	Komuna	49,847.75	
Leposaviq	7	Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të Leposaviçit	MPL	19,825.10	49,813.80	Komuna	19,825.10	
Klinë	8	Ndërtimi i liqenit akumulues dhe hapja e puseve për ujë të pijes	MPL	15,000.00		Komuna	15,000.00	
						totali	274,111.56	
