



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti për Zhvillim të Qëndrueshëm Komunal
Divizioni për Zhvillim dhe Menaxhim të Projekteve

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2021**

Mars 2022

Contents

OBILIQ.....	5
Ndërtimi i brezit të Gjelbërt - KOSOVA (A)	5
OBILIQ.....	6
Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit: Plemetin – Obiliq	6
JUNIK.....	7
Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik	7
JUNIK.....	8
Ndërtimi i parkut të lojërave për fëmijë	8
PEJË.....	9
Rregullimi i parkut Karagaç	9
PEJË.....	10
Ndriçimi publik në rrugët: “Adem Jashari”, Rruga e “UÇK”-së dhe “Konferenca e Bujanit”	10
PEJË.....	11
Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: Tërstenik, Lutogllavë dhe Ruhot.....	11
PEJË.....	12
Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: Vitomiricë, Dubovë dhe Ozdrim.....	12
PEJË.....	13
Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimi publik shkolla Skënderbeu - Qyshk, Katund i ri dhe Kristal	13
PEJË.....	14
Rregullimi i sheshit në Nabergjan	14
PEJË.....	15
Rregullimi i Sheshit në Gorozhdec si dhe ndriçimi publik në fshatrat Llozhan, Loxhë Poqestë dhe Vragoc.....	15
PEJË.....	16
Ndriçimi publik në fshatrat: Kliqinë, Zahaq, Llabjan, Nakull, Kosuriq dhe Lugagji	16
PEJË.....	17
Ndriçimi në lagjen e Gjinnazit	17
PEJË.....	18
Ndërtimi i hapësirave publike për rreth QKMF-së.....	18
PEJË.....	19
Asfaltimi i rrugëve të minoriteteve në qytetin e Pejës dhe fshatra	19
PEJË.....	20
Ndriçimi në lagjen “Dardania 1”-“Dardania 2”, lagjen e “Zabelit” tek rr. e “Valbonës”, lagjen “Bellopoj” „rr. “Shpëtim Bojku” , në fshatin Novosellë, fshati Ruhotë, lagjen “Zymberaj”, Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimi në fshatin Vitomericë rajoni i III-të rruga kryesore	20
KAÇANIK	21
Rehabilitimi i rrugës “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra”-Kaçanik	21
KAÇANIK	22
Rregullimi i trotuarit Bob-Doganaj.....	22
KLINË	23
“Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik”	23
KLINË	24
“Fasadimi i objekteve të vjetra”	24
KLINË	25
“Asfaltimi i rrugëve lokale në Cerovik-Qabiq”	25

KLINË	26
" Asfaltimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntoksore në Vidëjë-Jagodë, Paskalicë Kryeshevë e Madhe"	26
KLINË	27
"Ndërtimi i rrugicave në Gjurgjevik të Madh"	27
KLINË	28
" Asfaltimi i rrugëve Videjë-Jagodë-Budisalc-Berkovë dhe në Klinafë"	28
KLINË	29
"Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve"	29
KAMENICË	30
"Projekti për shpërndarjen e ujit për fshatrat Hogosht dhe Lisockë në Komunën e Kamenicës"	30
KAMENICË	31
"Rregullimi hyrjeve banesore"	31
KLLOKOT	32
Ndërtimi i ndriçimit publik në komunën e Klokotit.....	32
VITI	33
Rivitalizimi dhe zgjerimi i rrugës "Kongresi I Manastirit" në Viti	33
LIPJAN.....	34
"Rregullimi i kanalizimit në lagjen e komunitetit dhe asfaltimi i rrugicave në fshatin Gadime"	34
LIPJAN.....	35
Rehabilitimi i rrugës Lipjan Rubofc	35
LIPJAN.....	36
Rregullimi i trotuareve, hapësirave publike dhe ndriçimi publik në fshatrat: Rubofc i madh, Rubofc i Vogël dhe Kojskë	36
RAHOVEC	37
Ndërtimi i rrugëve në lagjen e komuniteteve	37
PODUJEVË.....	38
Ndërtimi i kolektorit të ujërave atmosferike	38
PODUJEVË.....	39
Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në lagjet e komuniteteve	39
MITROVICA JUGORE	40
Ndërtimi i rrugëve në lagjen "2 Korriku"	40
FUSHË KOSOVË.....	41
Rikonstruktimi i rrugës "Meshari " - FushëKosovë.....	41
FUSHËKOSOVË.....	42
"Vendosja e ndriçimit publik në fshatrat Kuzmin, Sllatinë e Madhe, Harilaq, Vragoli, Miradi e Poshtme dhe Bardh i Madh - Fushë Kosovë"	42
SKËNDERAJ	43
"Krijimi i hapësirave /infrastrukture për persona me nevojë të veçanta"	43
GJAKOVË.....	44
Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferikë në rr."Lekë Dukagjini " - Dardani- Gjakovë	44
ISTOG	45
Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe ndriçimi publik në lagjen " Arif Ademi" në Banjë dhe asfaltimi i rrugëve në komunën e Istogut	45
ISTOG	46
Asfaltimi i rrugëve në komunën e Istogut.....	46
ISTOG	47
Asfaltimi i rrugës Perëndimi në Gurrakoc	47
DEÇAN.....	48
Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit	48
LEPOSAVIC.....	49

Rindërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Pridvorica dhe ndërtimi i ndriçimit rrugor në fshatin Krnjin i poshtëm	49
PARTESH	50
“Mbushja, ngjeshja dhe rrafshimi i rrugëve bujqësore në territorin e komunës së Parteshit”	50
GRAÇANICË	51
Asfaltimi Parkingut të objektit Administrativ të komunës së Graçanicës	51
GRAÇANICË	52
Rindërtimi dhe përmisimi i ndriçimit publik në Graçanicë	52
GJILAN	53
Rregullimi i hapësirave publike-shesheve	53

Komuna përfituese	OBILIQ	
Titulli i projektit	Ndërtimi i brezit të Gjellbërt - KOSOVA (A)	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punimet: shënimi i trasesë, pastrimi i terenit, dislokimi i rrethojës, gjurmimi, planifikimi dhe ngjeshja e trupit të rrugës, mbushja me gurë të thyer gëlqeror 0 - 150mm, demolimi i pusetave ekzistuese, punimi i kanalizimit atmosferik në segmentin II dhe segmentin III.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	300,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	116,583.09€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	27.07.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	326,652.20 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	127,993.47 €	



Komuna përfituese	OBILIQ
Titulli i projektit	Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit: Plemetin – Obiliq
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punimet: shënimi i trasesë, pastrimi i terenit, zhvendosja dhe rivendosja e shtyllave, demolimi i betoneve, kubëzave dhe murit, gërmimi, planifikimi dhe ngjeshja e trupit të trotuarit, mbushja me zhavor 0 - 63, 0-31 mm dhe 4-8 mm dhe ngjeshja e tyre si dhe vendosja e kubëzave, skajoreve, shtyllave dhe trupave ndriçues.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	74,298.37 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	104,232.25 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	163,910.17 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	74,298.37 €



Komuna përfituese	JUNIK	
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik	
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt është bërë ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik në disa lagje të Junikut me ndriçimin LED. Në kuadër të projektit janë vendosur shtyllat metalike, shtrirja e kablllove bistek, ormanit, trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit si dhe pajisjet tjera përcjellëse.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	25,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	5,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	04.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	26,620.00 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	25,000.00 €	




Komuna përfituese	JUNIK
Titulli i projektit	Ndërtimi i parkut të lojërave për fëmijë
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt është bërë ndërtimi i këndeve të lodrave në disa lagje urbane në qytezën e Junikut. Në kuadër të projektit janë kryer punimet e dheut, zhavorrit dhe betonit, elemente mikro urbane si dhe janë montuar lodrat për fëmijë .
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	10,264.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	5,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	09.08.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	14,314.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	10,264.00 €



Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Rregullimi i parkut Karagaç
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë rregullime në parkun e qytetit edhe atë nga fondet e MAPL janë kryer punime kryesisht në hapjen e kanalit, shtrirjen e kablllove, vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik në kuadër të parkut.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	30,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	50,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	69,879.24 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	30,000.00 €




Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Ndriçimi publik në rrugët: “Adem Jashari”, Rruga e “UÇK”-së dhe “Konferenca e Bujanit”
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në hapjen e kanalit: shtrirjen e kablllove, vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik në këto rrugë.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	65,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	135,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	177,415.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	65,000.00 €

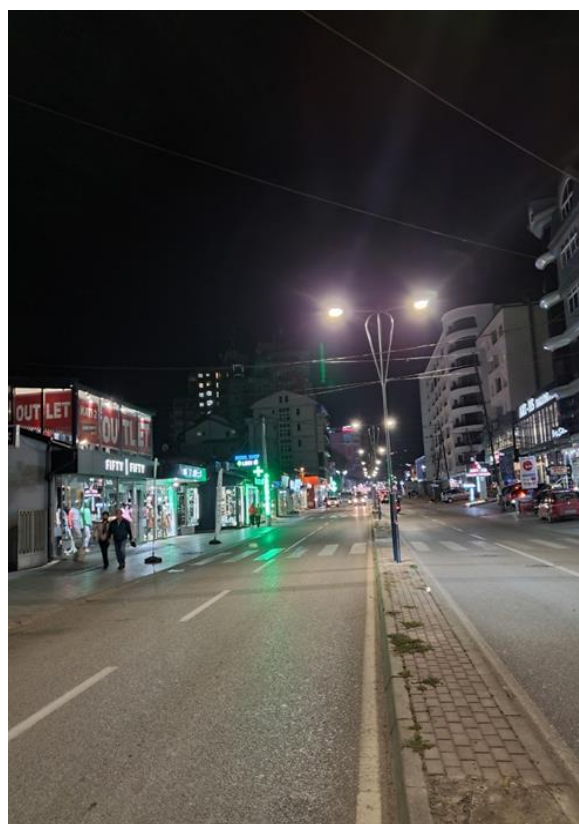

Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: Tërstenik, Lutogllavë dhe Ruhot
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në rregullimin urban: ndërtimi i trotuarit, murit rrethues si dhe pjesën e ndriçimit publik, hapjen e kanalit, shtrirjen e kablllove, vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik në këto tri fshatra.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	60,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	90,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	113,591.90 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	60,000.00 €



Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: Vitomiricë, Dubovë dhe Ozdrim
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në rregullimin urban; ndërtimi i trotuarit, gjelbërimi dhe këndi i lodrave, muri rrethues si dhe pjesën e ndriçimit publikë; hapjen e kanalit; shtrirjen e kablllove, vendosjen e shtyllave metalike , montimin e trupave ndriçues, siguresave; tokëzimit; ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik në këto tri fshatra.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	100,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	14.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	123,134.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,000.00 €

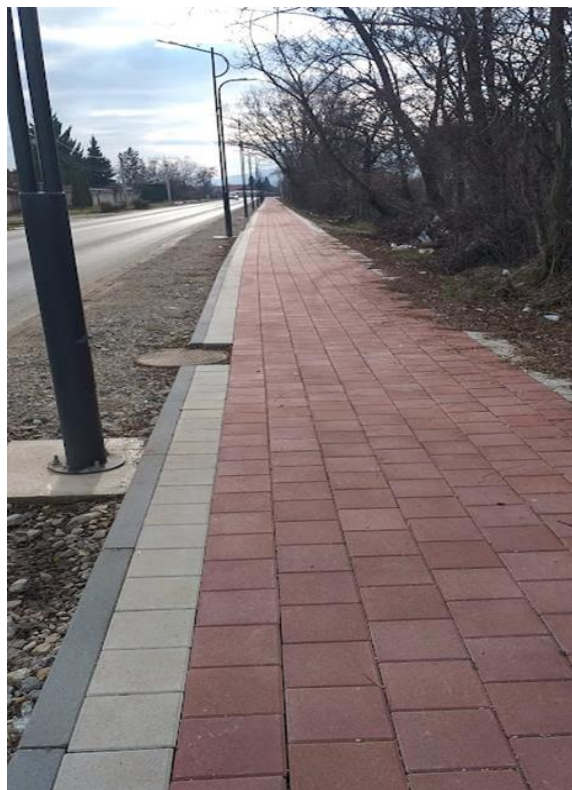


Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimi publik shkolla Skënderbeu - Qyshk, Katund i ri dhe Kristal
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në ndërtimin e trotuarit me kubëza betoni si dhe pjesën e ndriçimit publik, hapjen e kanalit, shtrirjen e kablllove, vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	60,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	16.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	61,525.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,000.00 €




Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Rregullimi i sheshit në Nabergjan
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në rregullimin e sheshit në fshatin Nabergjan; inqizimet dhe punët paraprake në teren; pastrimi i terrenit dhe punët tokësore; konstruksioni i hapësirës; punimi i fushës së volejbollit në rërë si Gjelbërimi dhe këndi i lodrave.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	10,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	10,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	15.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	19,179.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	10,000.00 €




Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Rregullimi i Sheshit në Gorozhdec si dhe ndriçimi publik në fshatrat Llozhan, Loxhë Poqestë dhe Vragoc
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në një pjesë të ndriçimit publik; hapjen e kanalit; shtrirjen e kablllove, vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave ndriçues, siguresave; tokëzimit; ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	40,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	70,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	72,053.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	11,338.00 €

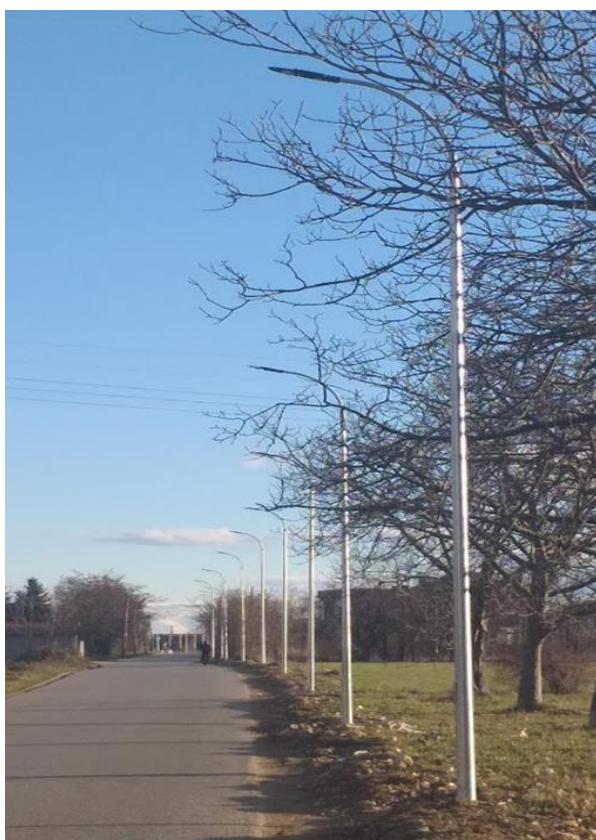


Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Ndriçimi publik në fshatrat: Kliqinë, Zahaq, Llabjan, Nakull, Kosuriq dhe Lugagji
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në një pjesë të ndriçimit publik, hapjen e kanalit, shtrirjen e kablllove, vendosjen dhe montimin e trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	40,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	60,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	14.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	61,810.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	24,594.00 €

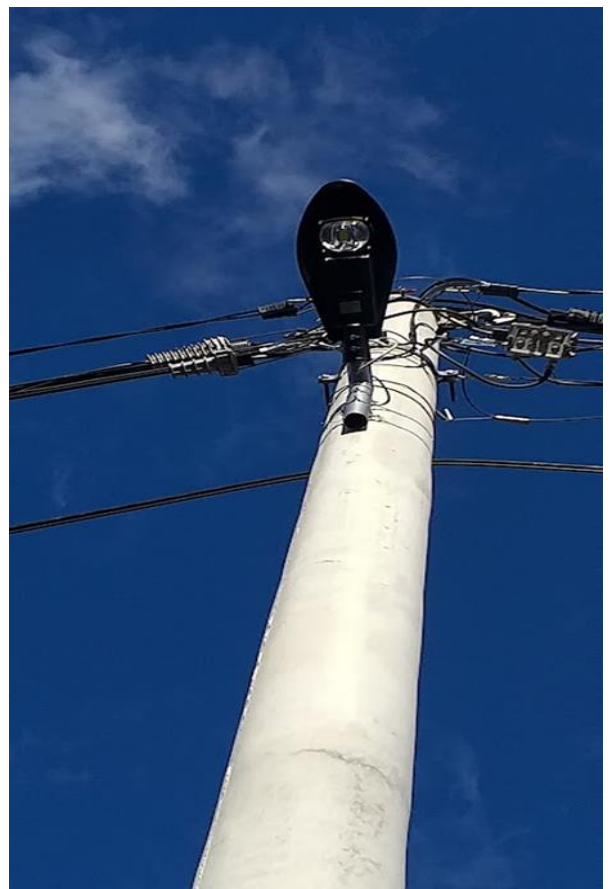

Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Ndriçimi në lagjen e Gjimnazit
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në Lagjen e Gjimnazit në ndriçimin publik, hapjen e kanalit, shtrirjen e kablove, vendosjen dhe montimin e trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	60,771.78 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	119,228.22 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	19.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	168,347.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	60,771.00 €

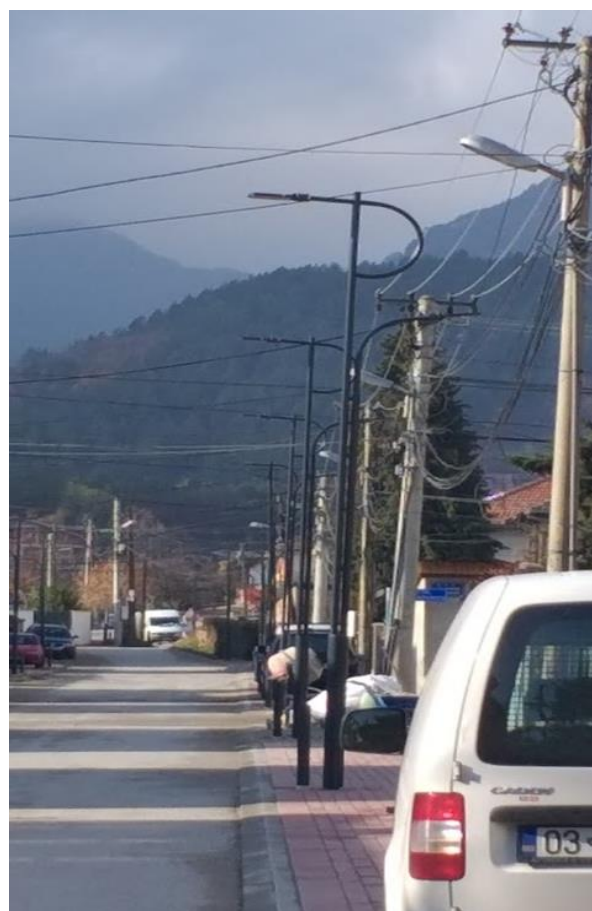


Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Ndërtimi i hapësirave publike për rreth QKMF-së
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë bërë punime në rregullimin e hapësirave publike për rreth QKMF-së; inqizimet dhe punët paraprake në teren; pastrimi i terrenit dhe punët tokësore; konstruksioni i hapësirës - kubëzimi i sipërfaqeve; gjelbërimi; ndriçimi i hapësirave publike si dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	40,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	70,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	15.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	95,365.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	40,000.00 €

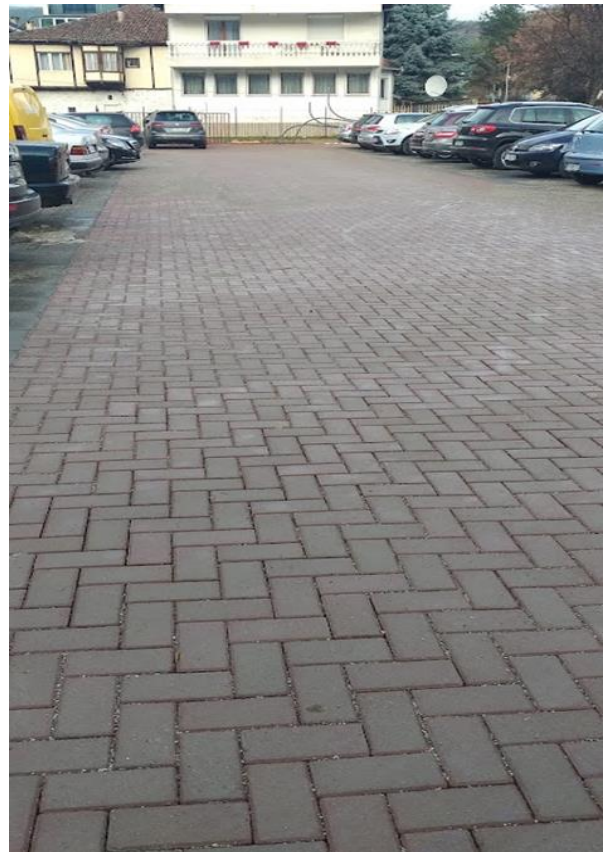

Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve të minoriteteve në qytetin e Pejës dhe fshatra
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë kryer punime në asfaltimin e rrugëve të minoriteteve në qytetin e Pejës dhe në disa fshatra të Komunës së Pejës dhe inqizimet dhe punimet paraprake në teren; punët tokësore; dhe konstruksioni i trasesë së rrugës.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	32,666.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	13.12.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	71,314.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,000.00 €



Komuna përfituese	PEJË
Titulli i projektit	Ndriçimi në lagjen "Dardania 1"- "Dardania 2", lagjen e "Zabelit" tek rr. e "Valbonës", lagjen "Bellopoj" rr. "Shpëtim Bojku", në fshatin Novosellë, fshati Ruhotë, lagjen "Zymberaj", Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimi në fshatin Vitomericë rajoni i III-të rruga kryesore
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë kryer punimet në ndërtimin e trotuarit dhe ndriçimit publik në disa lokacione në Komunën e Pejës edhe atë: Ndërtimi i trotuarit me kubëza betoni në fshatin Vitomericë si dhe ndërtimi i ndriçimit publik me LED në: Vitomericë, "Dardania II", Bellopoj dhe "Shpëtim Bojku".
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	80,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	76,932.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	17.11.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	144,421.50 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	60,727.00 €

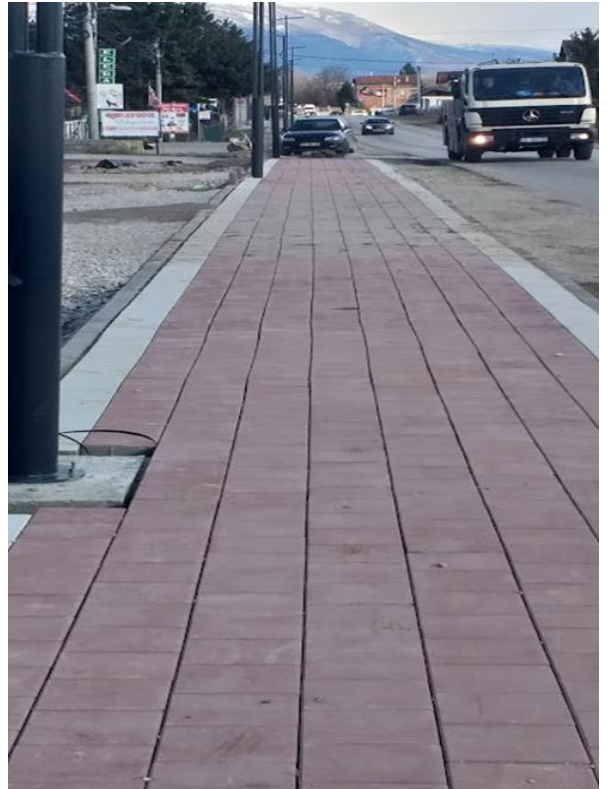

Komuna përfituese	KAÇANIK	
Titulli i projektit	Rehabilitmi i rrugës “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra-Kaçanik	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: shënimi i trasesë, kanalizimi fekal L=220 m, kolektori i kanalizimit atmosferik L=757.5 m, grryrja dhe asfaltimi i rrugës “ Sali Bajra” S=1,533m2, vendosja e gypave të PEB për vendosjen e instalimeve elektrike nëntokësore dhe një sasi e skajoreve, gërmimit dhe mbushjes me zhavorr.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	95,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	243,498.33 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	06.07.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	259,937.12	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	95,000.00 €	




Komuna përfituese	KAÇANIK	
Titulli i projektit	Rregullimi i trotuarit Bob-Doganaj	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: pastrimi i trasesë, gjërmimi dhe ngjeshja e trupit të trotuarit, mbushja me zhavor 0-63 mm dhe 0-31 mm dhe ngjeshja e tyre, vendosja e skajoreve 18/24/100 cm dhe 08/20/100 cm, vendosja e kubëzave të betonit në sipërfaqe 2,349.0 m2 si dhe muret mbajtëse të tobinës.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,266.54 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	136,249.07 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	08.09.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	134,334.34 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,266.54 €	



Komuna përfituese	KLINË
Titulli i projektit	“Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik”
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët e gërmimit, vendosja e shtyllave të betonit, kabllit vetëmbajtës, trupave ndriçues dhe llambave për ndriçim.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	45,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	35,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.08.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	93,760.44 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	45,000.00 €



Komuna përfituese	KLINË	
Titulli i projektit	“Fasadimi i objekteve të vjetra”	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punimet e latuesve, punimet e mbulesës dhe punimet e llamarinës.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	30,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	20,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	10.09.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	74,824.90 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	30,000.00 €	

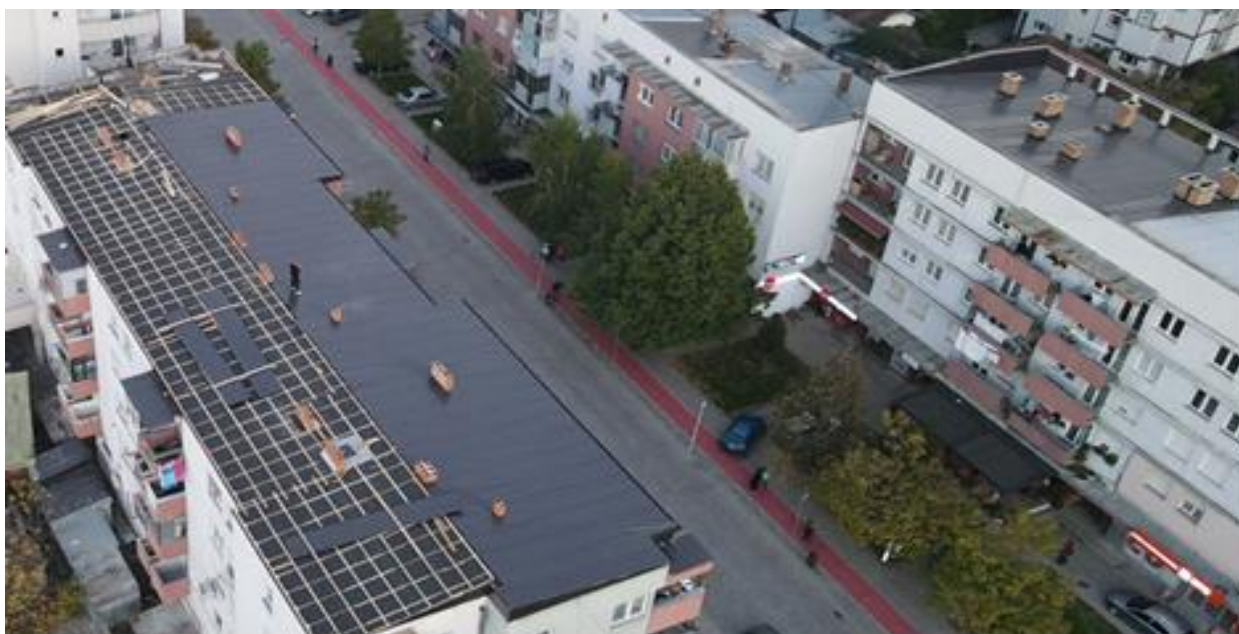


Komuna përfituese	KLINË
Titulli i projektit	“Asfaltimi i rrugëve lokale në Cerovik-Qabiq”
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët e demolimit të terenit, tokësore, të mbushjes, të lëshesave e kanaleve të hapura dhe punët e ndërtimit të kanalizimit.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	24,007.28 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	30,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	10.09.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	88,215.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	24,007.28 €



Komuna përfituese	KLINË
Titulli i projektit	“Asfaltimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore në Videjë-Jagodë, Paskalicë Kryeshevë e Madhe”
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët e demolimit të terrenit, tokësore, të mbushjes, të lëshesave e kanaleve të hapura dhe punët te mbi struktura e asfalt betonit.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	55,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	50,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.07.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	97,873.80 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	55,000.00 €



Komuna përfituese	KLINË
Titulli i projektit	“Ndërtimi i rrugicave në Gjurgjevik të Madh”
Përshkrimi i projektit	Punët e kryera në pozicione si : punët e demolimit të terenit, tokësore, mbushjes , lëshesave dhe punët te mbi struktura e asfalt betonit.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	10,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	10,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	02.08.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	24,999.99 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	10,000.00 €

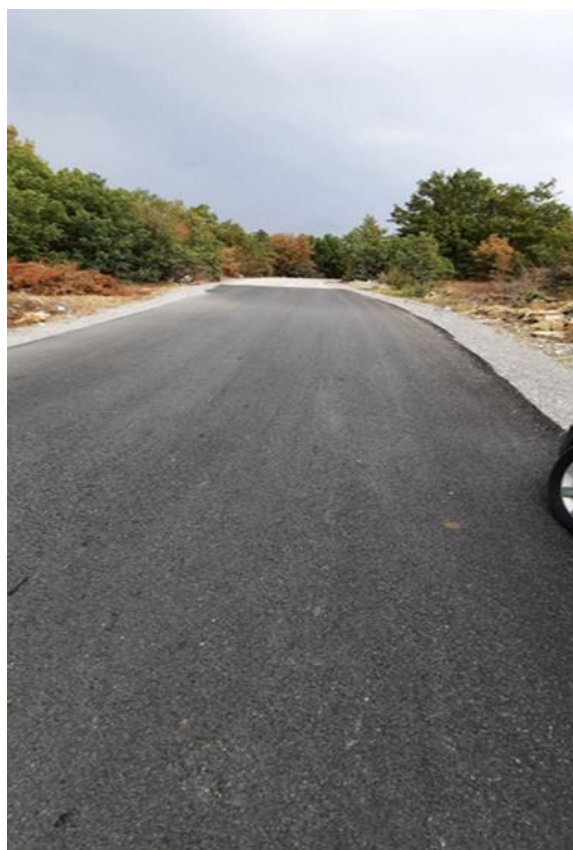

Komuna përfituese	KLINË
Titulli i projektit	“Asfaltimi i rrugëve Videjë-Jagodë-Budisalc-Berkovë dhe në Klinafç”
Përshkrimi i projektit	Përfundimi i punimeve në pozicione si: punët e demolimit të terenit, tokësore, mbushjes , lëshesave dhe punët të mbi struktura e asfalt betonit.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	47,873.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	04.10.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	49,964.08 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	49,964.08 €



Komuna përfituese	KLINË
Titulli i projektit	“Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve”
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët përgatitore, punët në pastrimin e terrenit të lumit, punët e dheut në rregullimin e shtratit të lumit dhe punët e mvëshjes me gur të brigjeve të lumit.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	80,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	40,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	09.11.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	74,700.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	60,284.51 €



Komuna përfituese	KAMENICË	
Titulli i projektit	“Projekti për shpërndarjen e ujit për fshatrat Hogosht dhe Lisockë në Komunën e Kamenicës”	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët përgatitore, punët e dheut, punët montuese, punët fazonike në fshatin Hogosht.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	157,436.93 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	92,563.07 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	26.10.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	321,184.17 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	120,362.74 €	



Komuna përfituese	KAMENICË	
Titulli i projektit	“Rregullimi hyrjeve banesore”	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët përgatitore, punët e demolimit, punët e grillave të shkallëve, punët e kulmit të zdruthktarisë dhe punët e lokalit.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	42,822.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	22,178.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	26.10.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	68,352.95€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	22,110.00 €	



Komuna përfituese	KLLOKOT	
Titulli i projektit	Ndërtimi i ndriçimit publik në komunën e Kllokotit	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: gërmimi dhe mbyllja e kanalit 200 m', demolimi dhe kthimi i kubëzave të betonit 500m' shtrirja e gypit fleksibil dy shtresor 500 m', shtrirja e shiritit për tokëzim 60 m', shtrirja e kablllos 500 m', montimi i kuadrit elektrik shpërndarës, montimi i 20 shtyllave dhe 40 llampa elektrike LED.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	18.05.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	15,358.99 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	31,537.01 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	23.09.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	45,658.00€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	15,358.99 €	



Komuna përfituese	VITI
Titulli i projektit	Rivitalizimi dhe zgjerimi i rrugës "Kongresi i Manastirit" në Viti
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: demolimi i trotuarit ekzistues, punimet përgaditore për segmentin e parë, për segmentin e dytë pjesërisht , mbushja me zhavor, punimi i kanalit atmosferik të mbyllur -segmenti I dhe segmenti II, ndriçimi pjesërisht (shpërndarje e kabllave).
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	23.04.2020
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	156,788.07 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	53,211.93 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.08.2020
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	199,982.40 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	148,488.85 €



Komuna përfituese	LIPJAN
Titulli i projektit	“Rregullimi i kanalizimit në lagjen e komunitetit dhe asfaltimi i rrugicave në fshatin Gadime”
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: Asfaltimi i plotë i 9 akseve rrugore, ngritja e pusetave, punimi i kanalizimit atmosferik me gypa Ø 400 mm.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	40,000.00€
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	10,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.10.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	47,576.74€
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	40,000.00 €



Komuna përfituese	LIPJAN	
Titulli i projektit	Rehabilitimi i rrugës Lipjan Rubofc	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: shënimi i trasesë, gërmimi, rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, prerja dhe grryerja e një pjese të asfaltit ekzistues, punimi i lëshesave me gypa PVCØ 1000 mm dhe Ø 400 mm dhe asfaltimi i rrugës në sipërfaqe prej 6,817.50m2 .	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	120,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	08.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	157,332.26 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	48,587.49 €	



Komuna përfituese	LIPJAN
Titulli i projektit	Rregullimi i trotuareve, hapësirave publike dhe ndriçimi publik në fshatrat: Rubovc i madh, Rubovc i Vogël dhe Kojskë
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: trotuari Rubovc deri në Kojskë në gjatësi prej 1,690.00 m ² , ndriçimi publik në Kojskë 80%, ndriçimi në Rubovc të madh 50% dhe në Rubovc të Vogël 85%.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	80,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	10,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	29.10.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	88,998.40€
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	52,897.32 €



Komuna përfituese	RAHOVEC	
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugëve në lagjen e komuniteteve	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: është bërë rregullimi me kubëza betoni rruga " Boraqka" me gjatësi prej 430 m', rruga Boraqka" krahu 1 me gjatësi 100m', rruga “Boraqka" krahu 2 me gjatësi 80m' dhe shtruarja me zhavor i rrugës " Bejtullah Haxhiu" në gjatësi prej 315m'.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	48,000.00.€	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	12,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	22.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	62,505.50€	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	48,000.00 €	



Komuna përfituese	PODUJEVË	
Titulli i projektit	Ndërtimi i kolektorit të ujërave atmosferike	
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë kryer një pjesë e punimeve në rregullimin e kolektorit për shkarkimin e ujërave atmosferike edhe atë: inqizimet dhe punët paraprake në teren; pastrimi i terrenit dhe punët tokësore; betonimi dhe armimi i kolektorit.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	48,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	100,766.50 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	15.07.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	97,022.10 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	22,257.83€	



Komuna përfituese	PODUJEVË	
Titulli i projektit	Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në lagjet e komuniteteve	
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë kryer punimet në ndërtimin e kanalizimit fekal në lagjet e komunitetit si dhe ndërtimi i rrugëve me kubëza në lagjen e komunitetit në disa lagje të komunës së Podujevës.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	70,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	25.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	71,681.76 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	60.327,54 €	



Komuna përfituese	MITROVICA JUGORE	
Titulli i projektit	Ndërtimi i rrugëve në lagjen “ 2 Korriku”	
Përshkrimi i projektit	Është bërë: gërmimi, matjet, mbushja me zhavor 0-63 mm dhe 0-31.5 mm, vendosja e skajoreve si dhe vendosja e kubëzave të betonit në 2 akse dhe asfaltimi i 2 akseve të rrugës.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	40,178.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	10,044.50 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	17.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	22,772.51 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	22,016.38 €	



Komuna përfituese	FUSHË KOSOVË	
Titulli i projektit	Rikonstruktimi i rrugës “Meshari” - FushëKosovë	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: shënimi dhe pastrimi i trasesë, gjurmimi, rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, shtruarja dhe ngjeshja me zhavor 0-60 mm dhe 0-31.5 mm, ngritja e pusetave dhe asfaltimi i rrugëve.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	41,287.50 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	26.10.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	39,979.40 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	39,979.40 €	



Komuna përfituese	FUSHË KOSOVË
Titulli i projektit	Vendosja e ndriçimit publik në fshatrat Kuzmin, Sllatinë e Madhe, Harilaq, Vragoli, Miradi e Poshtme dhe Bardh i Madh - Fushë Kosovë
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime si: punët tokësore, vendosja e ndriçimit me shtylla të betonit dhe të hekurit, shtrirja e kabllit dhe vendosja e trupave ndriçues me drita.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	80,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	10,240.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	08.11.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	77,905.10 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	59,400.60 €



Komuna përfituese	SKËNDERAJ	
Titulli i projektit	Krijimi i hapësirave /infrastrukturore për persona me nevoja të veçanta	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët tokësore, demolimit, konstruksionit.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	41,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	11,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	17.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	40,785.21 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	14,529.49 €	



Komuna përfituese	GJAKOVË
Titulli i projektit	Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferikë në rr."Lekë Dukagjini "- Dardani- Gjakovë
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: inqizimi gjeodezik, shtruarja e materialit guror, gërmimi i kanalit, planifikimi i kanalit, dhe vendosja e 250 m' gypa Ø 800 mm.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	80,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	11,957.32 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.12.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	76,166.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	24,737.73 €



Komuna përfituese	ISTOG
Titulli i projektit	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe ndriçimi publik në lagjen “Arif Ademi “ në Banjë dhe asfaltimi i rrugëve në komunën e Istogut
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: shënimi dhe pastrimi i trasesë, gërmimi, rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, shtruarja dhe ngjeshja me zhavor 0-63 mm dhe 0-32 mm dhe asfaltimi i rrugëve në Shushiqë të Ulët, Shalanovicë, Drejë si dhe shtruarja me zhavor 0-63 mm dhe 0-32 mm në Tomoc dhe Kashicë.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	14.07.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	40,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.10.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	102,987.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,000.00 €



Komuna përfituese	ISTOG
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugëve në komunën e Istogut
Përshkrimi i projektit	Janë kryer si : asfaltimi i rrugës në Kaliqan - e përfunduar, në Gusturant - Istog e përfunduar, në Lagjet e reja e përfunduar në Zallq , janë përfunduar punimet tjera dhe asfaltimi i 1,275m2 dhe në Dubovë të vogël janë asfaltuar 1,443m2.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	80,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	6,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	2.12.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	69,916.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	51,772.00 €




Komuna përfituese	ISTOG
Titulli i projektit	Asfaltimi i rrugës Perëndimi në Gurrakoc
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: shënimi dhe pastrimi i trasesë, gjurmimi, rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, shtruarja dhe ngjeshja me zhavor 0-63 mm dhe 0-32 mm dhe asfaltimi i rrugës.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	31,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	2,902.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	02.12.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	33,150.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	31,000.00 €



Komuna përfituese	DEÇAN	
Titulli i projektit	Rehabilitimi i rrjetit të ujës­jellë­sit	
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë një pjesë e paraparë e punimeve për rehabilitimin e rrjetit të ujës­jellë­sit në Deçan dhe: Punët e gërmimit; Punimet e rrethojave; Punimi i shuarësve të energjisë; Ndërtimi i shtëpizës si dhe Montimi i klorinatorit.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	22.07.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	150,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	28.09.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	145,706.40 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	42,811.11 €	



Komuna përfituese	LEPOSAVIC	
Titulli i projektit	Rindërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Pridvorica dhe ndërtimi i ndriçimit rrugor në fshatin Krnjin i poshtëm	
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë kryer punimet e parapara me kontratë në: 1.Rekonstruimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Pridvoricë në gjatësinë L=1,05 km si dhe punimi i ndriçimit publik me LED teknologji në gjatësi L=350m në fshatin Krnjin i poshtëm.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	99,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM		
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	03.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	98,736.20 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	98,736.20 €	

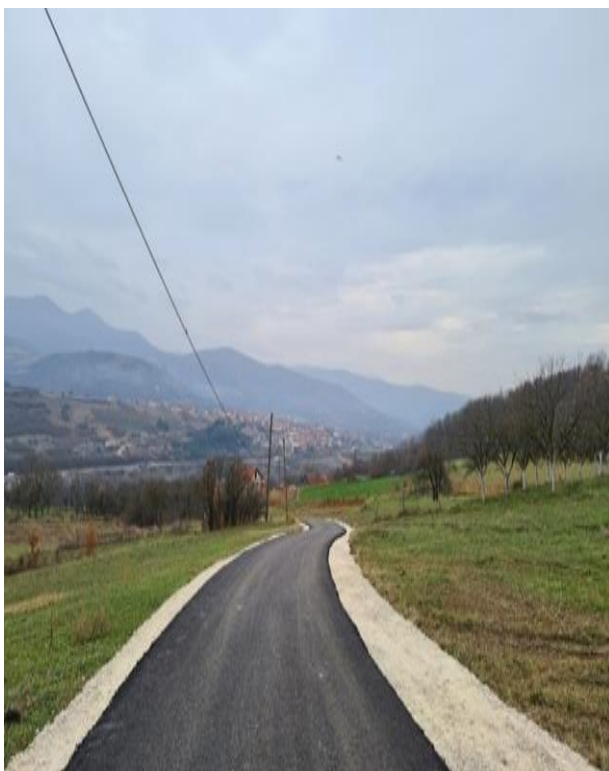

Komuna përfituese	PARTESH	
Titulli i projektit	“Mbushja, ngjeshja dhe rrafshimi i rrugëve bujqësore në territorin e komunës së Parteshit”	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer punime në pozicione si: punët paraprake, e gërmimeve dhe zhavorrit dhe ngjeshjes.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	50,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	13,246.76 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	09.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	58,946.87 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	50,000.00 €	



Komuna përfituese	GRAÇANICË	
Titulli i projektit	Asfaltimi parkingut të objektit administrativ të komunës së Graçanicës	
Përshkrimi i projektit	Janë kryer këto punime: përgatitja e terenit, gërmimi, vendosja e gjeotekstilit, mbushja me zhavor 0-63 mm, 0-31.5 mm dhe asfaltimi i 520 m ² të parkingut.	
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021	
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	40,000.00 €	
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	10,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit të kontratës	04.11.2021	
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	37,988.61 €	
Pagesat		
Vlerat e pagesës nga MAPL	15,105.32 €	



Komuna përfituese	GRAÇANICË
Titulli i projektit	Rindërtimi dhe përmirësimi i ndriçimit publik në Graçanicë
Përshkrimi i projektit	Është bërë rindërtimi dhe përmirësimi i rrjetit të ndriçimit publik në Graçanicë “ Vendbanimi i Romëve” ku janë vendosur shtyllat e betonit, rrjeti i kablllove dhe trupat ndriçues.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	30,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	6,715.58 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	11.11.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	15,909.00 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	15,909.00 €



Komuna përfituese	GJILAN
Titulli i projektit	Rregullimi i hapësirave publike-shesheve
Përshkrimi i projektit	Me këtë projekt janë kryer punimet në Rregullimin e hapësirave publike-shesheve edhe atë: hapësirat publike të biblioteka regjionale "Fan S. Noli" dhe hapësira të QKMF "Nagip Rexhepi" si dhe Sheshi "Xhavit Ahmeti" te kampusi i shkollave të mesme në qytetin e Gjilanit.
Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM)	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/ Aneks MeM	01.09.2021
Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM	80,000.00 €
Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM	30,000.00 €
Kontrata	
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	08.10.2021
Vlera e kontratës / Aneks Kontratës	93,219.07 €
Pagesat	
Vlerat e pagesës nga MAPL	80,000.00 €



TABELA 1 RAPORT I PROJEKTEVE TË CILAT KANË PËRFUNDUAR NË VITIN 2020 POR JANË PAGUAR NË VITIN 2021

Komuna	Nr i projekteve	Emri i projektit	Burimi i financimit	Obligimi nga viti i kaluar	Pagesat
Shtime	1	Rregullimi i sheshit të qytetit faza e dytë-ritenderim	MAPL	44,086.11 €	44,086.11 €
Klina	2	Ndërtimi i liqenit akumulues dhe hapja e puseve për ujë të pijes	MAPL	15,000.00 €	15,000.00 €
Zveqan	3	Asfaltimi i rrugëve të pa kategorizuara në Komunën e Zveçanit	MAPL	49,847.75 €	49,847.75 €
Leposaviq	4	Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të Leposaviçit	MAPL	19,825.10 €	19,825.10 €
Mitrovicë e Veriut	5	Ndërtimi i parterit të lodrave në qerdhën e fëmijëve	MAPL	21,529.10 €	21,529.10 €
Mitrovicë e Veriut	6	Ndërtimi i ndriçimit në oborrin e SHM "M.P. Alas"	MAPL	49,937.90 €	49,937.90 €
Mitrovicë e Veriut	7	Ndërtimi i një pjese të trotuarit me sipërfaqe gjelbëruese në rrugën Mbreti Peter I	MAPL	23,885.60 €	23,885.60 €
Istog	8	Asfaltimi i rrugës në Llukovc	MAPL	50,000.00 €	50,000.00 €
Totali i pagesave nga MAPL - Tabela 1					274,111.56 €

TABELA 2

RAPORT I PROJEKTEVE TË REALIZUARA NË VITIN 2021

Komuna	Nr i projekteve	Emri i projektit	Burimi i financimit	Procedura e prokurimit	Vlera e kontratës	Financimi/ bashkfinancim nga MAPL sipas MeM	Vlera për Bashkfinancim nga komuna sipas kontratës	Pagesat nga MAPL
Obiliq	1	Ndërtimi i brezit të Gjellbërt - KOSOVA (A)	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	326,652.20 €	300,000.00 €	26,652.20 €	127,993.47 €
Obiliq	2	Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit: Plemetin – Obiliq	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	163,910.17 €	74,298.37 €	89,611.80 €	74,298.37 €
Junik	3	Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	26,620.00 €	25,000.00 €	1,620.00 €	25,000.00 €
Junik	4	Ndërtimi i parkut të lojërave për fëmijë.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	14,314.00 €	10,264.00 €	4,050.00 €	10,264.00 €
Pejë	5	Rregullimi i parkut Karagaç.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	69,879.24 €	30,000.00 €	39,879.24 €	30,000.00 €
Pejë	6	Ndriçimi publik në rrugët: “Adem Jashari”, Rruga e “UÇK-së” dhe “Konferenca e Bujanit”.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	177,415.00 €	65,000.00 €	112,415.00 €	65,000.00 €
Pejë	7	Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: Terstenik, Lutogllavë dhe Ruhot.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	113,591.90 €	60,000.00 €	53,591.90 €	60,000.00 €

Pejë	8	Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: Vitomiricë, Dubovë dhe Ozdrim.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	123,134.00 €	50,000.00 €	73,134.00 €	50,000.00 €
Pejë	9	Trotuari dhe ndriçimi publik Shkolla" Skënderbeu"- Qyshk, Katundi i Ri dhe Kristal.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	61,525.00 €	50,000.00 €	11,525.00 €	50,000.00 €
Pejë	10	Rregullimi i sheshit në Nabergjan	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	19,179.00 €	10,000.00 €	9,179.00 €	10,000.00 €
Pejë	11	Rregullimi i Sheshit në Gorozhdevc si dhe ndriçimi publik në fshatrat Llozhan, Loxhë Poqestë dhe Vragoc.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	72,053.00 €	40,000.00 €	32,053.00 €	11,338.00 €
Pejë	12	Ndriçimi publik në fshatrat: Kliqinë, Zahaq, Llabjan, Nakull, Kosuriq dhe Lugagji.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	61,810.00 €	40,000.00 €	21,810.00 €	24,594.00 €
Pejë	13	Ndriçimi në lagjen e Gjimnazit	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	168,347.00 €	60,771.78 €	107,575.22 €	60,771.00 €
Pejë	14	Ndërtimi i hapësirave publike për rreth QKMF-së	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	95,365.00 €	40,000.00 €	55,365.00 €	40,000.00 €
Pejë	15	Asfaltimi i rrugëve të minoriteteve në qytetin e Pejës dhe fshatra	Infrastrukturë	Komuna	71,314.00 €	50,000.00 €	21,314.00 €	50,000.00 €

Pejë	16	Ndriçimi në lagjen “Dardania 1”- “Dardania 2”, lagjen e Zabelit tek rr. E “Valbonës”, lagjen Bellopoj,, rr. “Shpëtim Bojku” , në fshatin Novosellë, fshati Ruhotë, lagjja "Zymberaj", Ndërtimi i trotuarit dhe Nendriçimi në fshatin Vitomericë rajoni i III-të rruga kryesore	Infrastrukturë	Komuna	144,421.50 €	80,000.00 €	64,421.50 €	60,727.00 €
Kaçanik	17	Rehabilitimi i rrugës “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra-Kaçanik	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	259,937.12 €	95,000.00 €	164,937.12 €	95,000.00 €
Kaçanik	18	Rregullimi i trotuarit Bob- Doganaj	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	134,334.34 €	50,266.54 €	84,067.80 €	50,266.54 €
Klinë	19	Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik.	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	93,760.44 €	45,000.00 €	48,760.44 €	45,000.00 €
Klinë	20	Fasadimi i objekteve të vjetra	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	74,824.90 €	30,000.00 €	44,824.90 €	30,000.00 €
Klinë	21	Asfaltimi i rrugëve lokale në Cerovik-Qabiq	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	88,215.00 €	24,007.28 €	64,207.72 €	24,007.28 €
Klinë	22	Asfaltimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore në Videjë-Jagodë, Paskalicë Kryeshevë e Madhe	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	97,873.80 €	55,000.00 €	42,873.80 €	55,000.00 €
Klinë	23	Ndërtimi i rrugicave në Gjurgjevik të Madh	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	24,999.99 €	10,000.00 €	14,999.99 €	10,000.00 €

Klinë	24	Asfaltimi i rrugëve Videjë-Jagodë-Budisalc-Berkovë dhe në Klinafç	Infrastrukturë	Komuna	49,964.08 €	50,000.00 €	0.00	49,964.08 €
Klinë	25	Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve	Infrastrukturë	Komuna	74,700.00 €	80,000.00 €	0.00	60,284.51 €
Kamenicë	26	Projekti për shpërndarjen e ujit për fshatrat Hogosht dhe Lisockë në Komunën e Kamenicës	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	321,184.17 €	157,436.93 €	163,747.24 €	120,362.74 €
Kamenicë	27	Rregullimi hyrjeve banesore	Infrastrukturë	Komuna	68,352.95 €	42,822.00 €	25,530.95 €	22,110.00 €
Klllokot	28	Ndërtimi i ndriçimit publik në komunën e Klllokotit	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	45,658.00 €	15,358.99 €	30,299.01 €	15,358.99 €
Viti	29	Rivitalizimi dhe zgjerimi i rrugës "Kongresi i Manastirit" në Viti	Granti i performancës/ MAPL	Komuna	199,982.40€	156,788.07 €	43,194.33 €	148,488.85 €
Lipjan	30	Rregullimi i kanalizimit në lagjen e komunitetit dhe asfaltimi i rrugicave në fshatin Gadime.	Infrastrukturë	Komuna	47,576.74 €	40,000.00€	7,576.74 €	40,000.00 €
Lipjan	31	Rehabilitimi i rrugës Lipjan-Rubofç	Infrastrukturë	Komuna	157,332.26 €	50,000.00 €	107,332.26 €	48,587.32 €
Lipjan	32	Rregullimi i trotuareve, hapësirave publike dhe ndriqim publik në fshatrat: Rubofç i madh, Rubofç i vogël dhe Kojskë	Infrastrukturë	Komuna	88,998.40 €	80,000.00 €	8,998.40 €	52,897.32 €
Rahovec	33	Ndërtimi i rrugëve në lagjen e komuniteteve	Infrastrukturë	Komuna	62,505.50€	48,000.00 €	14,505.50 €	48,000.00 €

Podujevë	34	Ndërtimi i kolektorit të ujërave atmosferike	Infrastrukturë	Komuna	97,022.10 €	48,000.00 €	49,022.10 €	22,257.83 €
Podujevë	35	Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në lagjet e komuniteteve	Infrastrukturë	Komuna	71,681.76 €	70,000.00 €	1,681.76 €	60.327,54 €
Mitrovicë Jugore	36	Ndërtimi i rrugëve në lagjen “ 2 Korriku”	Infrastrukturë	Komuna	22,772.51 €	40,178.00 €	0.00	22,016.38 €
Fushë Kosovë	37	Rikonstruktimi i rrugës “Meshari” – Fushë Kosovë	Infrastrukturë	Komuna	39,979.40 €	50,000.00 €	0.00	39,979.40 €
Fushë Kosovë	38	Vendosja e ndriçimit publik në fshatrat Kuzmin, Sllatinë e Madhe, Harilaq, Vragoli, Miradi e Poshtme dhe Bardh i Madh - Fushë Kosovë.	Infrastrukturë	Komuna	77,905.10 €	80,000.00 €	0.00	59,400.60 €
Skenderaj	39	Krijimi i hapësirave /infrastrukture për persona me nevoja të veçanta.	Infrastrukturë	Komuna	40,785.21 €	41,000.00 €	0.00	14,529.49 €
Gjakovë	40	Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferikë në rr. "Lekë Dukagjini" - Dardani- Gjakovë	Infrastrukturë	Komuna	76,166.00 €	80,000.00 €	0.00	24,737.73 €
Istog	41	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe ndriçimi publik në lagjen Arif Ademi në Banjë dhe asfaltimi i rrugëve në komunën e Istogut	Infrastrukturë	Komuna	102,987.00 €	50,000.00 €	52,987.00 €	50,000.00 €

Istog	42	Asfaltimi i rrugëve në komunën e Istogut	Infrastrukturë	Komuna	69,916.00 €	80,000.00 €	0.00	51,772.00 €
Istog	43	Asfaltimi i rrugës Perëndimi në Gurrakoc	Infrastrukturë	Komuna	33,150.00 €	31,000.00 €	2,150.00 €	31,000.00 €
Deçan	44	Rehabilitimi i rrjetit të ujës-jellës	Infrastrukturë	Komuna	145,706.40 €	150,000.00 €	0.00	42,811.11 €
Leposaviq	45	Rindërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Pridvorica dhe ndërtimi i ndriçimit rrugor në fshatin Donji Krnjin	Infrastrukturë	Komuna	98,736.20 €	99,000.00 €	0.00	98,736.20 €
Partesh	46	Mbushja, ngjeshja dhe rrafshimi i rrugëve bujqësore në territorin e komunës së Parteshit	Infrastrukturë	Komuna	58,946.87 €	50,000.00 €	8,946.87 €	50,000.00 €
Graçanicë	47	Asfaltimi i Parkingut të objektit Administrativ të komunës së Graçanicës	Infrastrukturë	Komuna	37,988.61 €	40,000.00 €	0.00	15,105.32 €
Graçanicë	48	Rindërtimi dhe përmisimi i Ndriçimit publik në Graçanicë	Infrastrukturë	Komuna	15,909.00 €	30,000.00 €	0.00	15,909.00 €
Gjilan	49	Rregullimi i hapësirave publike-shesheve	Infrastrukturë	Komuna	93,219.07 €	80,000.00 €	13,219.07 €	80,000.00 €
Total i pagesave nga MAPL - Tabela 2								2,343,896.24 €

Totali i pagesave nga MAPL për vitin 2021- Tabela 1	274,111.56 €
Total i pagesave nga MAPL për vitin 2021 - Tabela 2	2,343,896.24 €
TOTAL	2,618,007.80 €

