



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti për Zhvillim të Qëndrueshëm Komunal
Divizioni për Zhvillim dhe Menaxhim të Projekteve

Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2023

Mars 2024

PËRMBAJTJA

Lista e shkurtesave	6
I. Hyrje	7
II. PLANIFIKIMI I PROGRAMEVE BAZUAR NË NDARJET BUXHETORE PËR VITIN 2023	7
III. Metodologjia	9
IV. MONITORIMI DHE ZBATIMI I PROJEKTEVE	9
<i>Komuna përfituese: OBILIQ</i>	11
<i>Projekti: Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësorë</i>	11
.....	11
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	11
.....	12
<i>Komuna përfituese: OBILIQ</i>	12
<i>Projekti: Ndërtimi i parkingut në Obiliq në objektet e banesave sociale -banesa Hade</i>	12
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	12
<i>Komuna përfituese: LIPJAN</i>	13
<i>Projekti: Ndërtimi i sallës së sporteve në shkollën "Ismajl Luma" Lipjan</i>	13
.....	13
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	13
<i>Komuna përfituese: LIPJAN</i>	14
<i>Projekti: Ndërtimi i shtratit të lumit dhe asfaltimi i rrugës së lumit në fshatin Gadime e Ulët</i>	14
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	14
<i>Komuna përfituese: LIPJAN</i>	15
<i>Projekti: Ndërtimi i shtratit të Lumit në fshatin Smallushë Faza-II "Ismajl Luma" Lipjan</i>	15
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	15
<i>Komuna përfituese: LIPJAN</i>	16
<i>Projekti: Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Medvec</i>	16
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	16
.....	16
<i>Komuna përfituese: VITIA</i>	17
<i>Projekti: Rregullimi i rrugës dhe trotuarit me kalldërm rreth lumit "Moravë" Viti</i>	17
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	17
<i>Komuna përfituese: VITIA</i>	18
<i>Projekti: Rivitalizimi i rrugës "Hoxhë Jonuzi" dhe "Muhamet Muharremi"</i>	18
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	18
<i>Komuna përfituese: VITIA</i>	19
<i>Projekti: Rivitalizimi i hapësirave gjelbëruese rreth lumit "Morava" në Viti</i>	19

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	19
.....	19
<i>Komuna përfituese:</i> KLINA.....	20
<i>Projekti:</i> Asfaltimi i rrugës "Afrim Haliti", Jashanicë.....	20
.....	20
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	20
<i>Komuna përfituese:</i> KLINA.....	21
<i>Projekti:</i> Rregullimi i shtratit të lumit "Klina".....	21
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	21
<i>Komuna përfituese:</i> KLINA.....	22
<i>Projekti:</i> Ndërtimi fundërruesit për sistemin e filtrimit të ujit të pijes në Klinë	22
.....	22
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	22
<i>Komuna përfituese:</i> KLINA.....	23
<i>Projekti:</i> Ndërtimi i trotuarit me ndriçim në fshatin Shtupel dhe ndërtimi i rrugëve në fshatin Budisalc"	23
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	23
<i>Komuna përfituese:</i> DRENAS	24
<i>Projekti:</i> Ndërtimi dhe zgjerimi sheshit "Fehmi dhe Xhevë Lladrovci" Drenas	24
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	24
<i>Komuna përfituese:</i> GJAKOVA	25
<i>Projekti:</i> Renovimi dhe paisja e Qendrës së Komuniteteve (parashkollor) në Ali Ibra-Gjakovë	25
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	25
<i>Komuna përfituese:</i> GJAKOVA	26
<i>Projekti:</i> Ndërtimi i hapësirave publike në qendër të qytetit	26
Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale.....	26
<i>Komuna përfituese:</i> MALISHEVA	27
<i>Projekti:</i> Rregullimi i oborrit të shkollës fillore në fshatin Llazic	27
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	27
<i>Komuna përfituese:</i> KAMENICA.....	28
<i>Projekti:</i> Parkingu i gjelbërt në qendër të qytetit të Kamenicës	28
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	28
<i>Komuna përfituese:</i> SUHAREKA.....	29
<i>Projekti:</i> Ripërtirja e qëndrueshme urbane- në lagjen e vjetër të qytetit- Lagja Slllogja.....	29
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	29
<i>Komuna përfituese:</i> PODUJEVA	30
<i>Projekti:</i> Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap dhe Dumnica me mure mbrojtëse (Gabionët) L=860 m.....	30

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	30
<i>Komuna përfituese:</i> RAHOVECI.....	31
<i>Projekti:</i> Ndërtimi i parqeve në Opertush, Retijë, Denjë dhe kolektorit për ujërat e zeza në Ratkoc dhe Rahovec.....	31
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	31
<i>Komuna përfituese:</i> DEQANI.....	32
<i>Projekti:</i> Asfaltimi dhe sistemimi i rrugës "Arben Qerimaj" në komunitetin ashkali në Baballoq dhe "Veteranët e UQK" në komunitetin boshnjak në Prapaqan	32
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	32
<i>Komuna përfituese:</i> DEQANI.....	33
<i>Projekti:</i> Ndërtimi i 4 urave në rrugën që të qon bë Roshkodol dhe parkut në Isniq	33
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	33
<i>Komuna përfituese:</i> GJILANI	34
<i>Projekti:</i> Rigjenerimi i ish parkingut duke integruar xhepat e gjelbërt- "Parku Urban" në komunën e Gjilanit	34
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	34
<i>Komuna përfituese:</i> FUSHËKOSOVË	35
<i>Projekti:</i> Rikonstruimi i rrugës " Meshari- faza e dytë" Fushë Kosovë	35
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	35
<i>Komuna përfituese:</i> SHTIME	36
<i>Projekti:</i> Zgjerimi i rrugës dhe trotuari me ndriçim në rrugën "Shabani" në Vojnoc	36
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	36
<i>Komuna përfituese:</i> PEJA.....	37
<i>Projekti:</i> Kubëzimi i trotuareve dhe rregullimi i hapësirave në Treboviq, Katundi i ri dhe Pavlan.....	37
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	37
<i>Komuna përfituese:</i> PEJA.....	38
<i>Projekti:</i> Asfaltimi, ndriçimi dhe ndërtimi i trotuarit në rrugën "Mustafë Hasanaxhekaj-Mic Nimani" (Vitomiricë-Treboviq) në komunën e Pejës	38
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	38
<i>Komuna përfituese:</i> PEJA.....	39
<i>Projekti:</i> Turizmi i aventurës - Vlera për zhvillim të qëndrueshëm të Pejës	39
Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal	39
<i>Komuna përfituese:</i> ISTOQU	40
<i>Projekti:</i> Ndërtimi i kanalizimit në Muzhevine si dhe Ndërtimi i rrugës "Arif Pepaj" dhe "Sejdi Zenuni" në Lubozhdë, Istog "Bekim Fehmiu" dhe "Smajl Bicaj" Studenicë "Brigada 133" dhe Dobrushë "Shkolla e komunitetit Boshnjak"	40
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	40
<i>Komuna përfituese:</i> NOVQBËRDA	41
<i>Projekti:</i> Ndërtimi i ndriçimit në fshatrat Makresh-Draganc si dhe Labjan-Koznic	41

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	41
<i>Komuna përfituese: FERIZAJ</i>	42
<i>Projekti: Asfaltimi i rrugës në lagjet "Sallahane" dhe "Halit Ibishi"</i>	42
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	42
<i>Komuna përfituese: MAMUSHA</i>	43
<i>Projekti: Pastrimi i shtratit të lumit "Toplluha"</i>	43
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	43
<i>Komuna përfituese: GRAÇANICA</i>	44
<i>Projekti: Rregullimi i parkut për fëmijë fshatin Shushicë, rruga "Hasan Prishtina"</i>	44
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS.....	44
<i>Komuna përfituese: GRAÇANICA</i>	45
<i>Projekti: Rregullimi i hapësirës publike në Kishnicë rruga " Ibrahim Rugova" Komuna Graçanicë</i>	45
Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS	45
Tabela e projekteve të financuara në komuna nga MAPL për vitin 2023.....	46
V.Rekomandimet	51
VI.Shtojcat.....	51

LISTA E SHKURTESAVE

MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

DZHQK - Departamenti për Zhvillim të Qëndrueshëm Komunal

DEMOS - Projekti për Decentralizim dhe përkrahja komunave (DEMOS) është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), bashkëfinancuar nga Suedia dhe Norvegjia, implementuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.

SDC - Zyrën Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim

SIDA - Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim

NORAD - Agjencia Norvegjeze për Bashkëpunim Zhvillimor

BE - Bashkimi Evropiano

GPK - Granti i Përformancës Komunale

BNK - Bashkëpunim Ndërkomunal

MeM - Marrëveshjet për mbështetje financiare

ZKA - Zyra Kombëtare e Auditimit

I. HYRJE

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal bazuar në mandatin e saj për avancimin e qeverisjes lokale, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar shërbime efektive në raport me qytetarët, si çdo vit buxhetor edhe në vitin 2023, ka përkrahur shumicën e Komunave të Republikës së Kosovës me mjete buxhetore për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim Avancimin e Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

Komunat e Republikës së Kosovës në vazhdimësi kanë nevojë për investime të reja në infrastrukturën publike andaj ne si MAPL kemi hapur thirrjet për vitin 2023.

Në vitin 2023 janë realizuar 35 projekte në 21 komuna sipas fushave apo sektorëve të investimit: 10 në ambient, 19 në infrastrukturë, 1 në sport dhe në arsim, 1 në ujësjellës, 1 në ndriqim publik, 1 në rekreacion dhe ambient dhe 2 në arsim.

II. PLANIFIKIMI I PROGRAMEVE BAZUAR NË NDARJET BUXHETORE PËR VITIN 2023

MAPL për vitin 2023 ka realizuar 35 projekte nga programet si në vijim:

1. Nga programi “Bashkëfinancimi me donatorë për skemën e granteve të bazuar në performancën komunale” janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 3,500,000.00 €, ndërsa është shpenzuar vlera prej 2,455,369.09 € ose 70.15%, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
 - Vlerësimi i performancës së vitit 2021 për grantin e performancës komunale për vitin fiskal 2023¹,
 - Marrëveshjet për mbështetje financiare janë nënshkruar për komunat përfituese nga Granti i performancës me datën 14.03.2023,
 - Zotimi i mjeteve është bërë me datën 04.05.2023 për shkak të zbatimit të ligjit me Nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 konkretisht neni 14 - Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat.

¹ https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2022/05/GPK_Raporti-i-vleresimit-2022_ALB.pdf

- Marrëveshja për mbështetje financiare përcaktojnë obligimet e palëve nënshkruese sipas nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi.²
- 2. Nga programi “Programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër-komunal” janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 900,000.00 €, ndërsa është shpenzuar vlera prej 704,311.56 € ose 78.26%, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
 - Thirrjen për aplikim ka qenë e hapur nga 25 prill 2023 deri 12 maj 2023,
 - Marrëveshjet e për mbështetje financiare janë nënshkruar më 05.07.2023,
 - Zotimi i mjeteve është bërë më 18.08.2023, për shkak të zbatimit të ligjit me Nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 konkretisht neni 14 - Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat,
 - Marrëveshja për mbështetje financiare ka përcaktuar obligimet e palëve nënshkruese sipas Nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi³.
- 3. Nga programi “Mbështetja për projektet infrastrukturore për komunitete në Komunitet e Republikës së Kosovës” janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 800,000.00 € ndërsa është shpenzuar vlera prej 450,905.98 € ose 56.36%, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
 - Thirrja për aplikime 25.04.2023 e hapur deri me 12.05.2023,
 - Marrëveshjet për mbështetje financiare janë nënshkruar 29.06.2023, 03.07.2023 dhe 13.07.2023,
 - Zotimi i mjeteve është bërë me datën 14.07.2023,
 - Marrëveshja për mbështetje financiare ka përcaktuar obligimet e palëve nënshkruese, sipas nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi.⁴

². [Ligji nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës](#)

³ **Ligji nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës**

⁴ **Ligji nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës**

III. METODOLOGJIA

Hartimi i këtij raporti është bërë bazuar në procesin e implementimit të projekteve gjatë vitit 2023 si: Ndarjet buxhetore për investime kapitale bazuar në ligjin 08/L-193 e buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2023; Hartimi i kriterëve për ndarje; Lansimi i fondeve për financim; Pranimi i aplikacioneve nga komunat; Procesi i vlerësimit të aplikacioneve nga komisioni vlerësues; Njoftimi i komunave përfituese; Nënshkrimi i MeM dhe Zotimi i mjeteve; Procedurat e tenderimit nga komuna bazuar në MeM dhe Monitorimi i zbatimit të projekteve.

Në vitin 2023 nga të tri thirrjet e programve kanë qenë 72 aplikacione,

- për programin “Bashkëfinancimi me donatorë për skemën e granteve të bazuar në performancën komunale” gjithësej 14 aplikacione,
- për programin “Programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër-komunal” gjithësej 32 aplikacione dhe
- për programin “Mbështetja për projektet infrastrukturore për komunitete në Komunitat e Republikës së Kosovës” gjithësej 26 aplikacione.

Nga të gjitha aplikacionet janë financuar 45 projekte sipas Marrëveshjeve dhe programeve, prej tyre janë realizuar 35 projekte në 21 komuna, ndërsa 10 projekte kanë dështuar si pasojë e procedurave të prokurimit nga ana e komunave.

IV. MONITORIMI DHE ZBATIMI I PROJEKTEVE

Bazuar në planin e punës për vitin 2023 dhe MeM për bashkëfinancime me komuna, nga të cilat dalin obligimet për realizimin të aktiviteteve të përbashkëta me komuna janë monitoruar dhe zbatuar 35 projekte në 21 komuna përfituese për tri programet, si:

- Takime teknike me komuna për projektet e kontraktura,
- Vizitat në terren për verifikimin e progresit të punimeve,
- Realizimin i pagesave,
- Bartja e pasurisë në pronësi të komunave, aty ku projekti ka përfunduar.

Të gjitha këto projekte janë monitoruar nga monitoruesit - inxhinierët e Divizionit për Zhvillim dhe Monitorim të Zbatimit të Projekteve në kuadër të DZHQB-MAPL.

Raporti përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2023

Mars 2024

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	250,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	179,347.95 €

KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	19.07.2023
Vlera e kontratës	429,347.95 €
Vlera e pagesës nga MAPL	220,044.97 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	88.02 %

Komuna përfituese: **Obiliq**

Projekti: Ndërtimi i parkingut në Obiliq në objektet
e banesave sociale -banesa Hade

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	60,992.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	6,901.93 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	25.08.2023
Vlera e kontratës	67,894.05 €
Vlera e pagesës nga MAPL	60,992.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **LIPJAN**

Projekti: Ndërtimi i sallës së sporteve në shkollën
“Ismajl Luma”

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	235,374.00 €
Vlera e bashk-financimit nga komuna	12,852.45 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.07.2023
Vlera e kontratës	248,226.45 €
Vlera e pagesës nga MAPL	66,951.57 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	28.44 %

Komuna përfituese: **LIPJAN**

Projekti: Ndërtimi i shtratit të lumit dhe asfaltimi
i rrugës së lumit në fshatin Gadime e Ulët

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	270,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	17,162.50 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.07.2023
Vlera e kontratës	287,162.50 €
Vlera e pagesës nga MAPL	247,160.76 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	91.54 %

Komuna përfituese: **LIPJAN**

Projekti: Ndërtimi i shtratit të Lumit në fshatin
Smallushë Faza-II Lipjan

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	200,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	24,007.04 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.07.2023
Vlera e kontratës	224,007.04 €
Vlera e pagesës nga MAPL	107,371.08 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	53.69 %

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe
bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	27,988.88 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	29.11.2023
Vlera e kontratës	77,988.88 €
Vlera e pagesës nga MAPL	48,797.88 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	97,60 %

Komuna përfituese: **VITIA**

Projekti: Rregullimi i rrugës dhe trotuarit me kalldërm rreth lumit "Moravë" Viti

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	120,000.0 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	157,777.50 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	28.09.2023
Vlera e kontratës	277,777.50 €
Vlera e pagesës nga MAPL	72,693.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	60.58 %

Komuna përfituese: **VITIA**

Projekti: Rivitalizimi i rrugës "Hoxhë Jonuzi" dhe
"Muhamet Muharremi"

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	160,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	224,220.62 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	03.10.2023
Vlera e kontratës	384,220.62 €
Vlera e pagesës nga MAPL	159,190.53 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.49 %

Komuna përfituese: **VITIA**

Projekti: Rivitalizimi i hapësirave gjelbëruese rreth
lumit "Morava" në Viti

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	76,237.60 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	110,398.5 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	03.10.2023
Vlera e kontratës	186,363.10 €
Vlera e pagesës nga MAPL	58,405.10 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	76.61 %

Komuna përfituese: **KLINA**

Projekti: Asfaltimi i rrugës "Afrim Haliti", Jashanicë

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	49,663.60 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	85,336.37 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.07.2023
Vlera e kontratës	135,000.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	49,663.60 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **KLINA**

Projekti: Rregullimi i shtratit të lumit "Klina"

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	646,046.00 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	25.07.2023
Vlera e kontratës	746,046.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	100,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **KLINA**

Projekti: Ndërtimi fundërruesit për sistemin e
filtrimit të ujit të pijes në Klinë

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	200,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	649,921.63 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.10.2023
Vlera e kontratës	849,921.63 €
Vlera e pagesës nga MAPL	30,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	15.00 %

Komuna përfituese: **KLINA**

Projekti: Ndërtimi i trotuarit me ndriçim në fshatin Shtupel dhe ndërtimi i rrugëve në fshatin Budisalc"

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	29.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	37,699.99 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	15.09.2023
Vlera e kontratës	97,699.99 €
Vlera e pagesës nga MAPL	60,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **DRENAS**

Projekti: Ndërtimi dhe zgjerimi sheshit "Fehmi dhe Xhevë Lladrovci" Drenas

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	916,388.80 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	3,471,789.38 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	11.10.2023
Vlera e kontratës	4,388,178.38 €
Vlera e pagesës nga MAPL	546,552.63€
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	59.64 %

Komuna përfituese: **GJAKOVA**

Projekti: **Renovimi dhe paisja e Qendrës së Komuniteteve (parashkollor) në Ali Ibra-Gjakovë**

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	40,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	6,194.40 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.10.2023
Vlera e kontratës	46,194.40 €
Vlera e pagesës nga MAPL	39,999.40 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **GJAKOVA**

Projekti: Ndërtimi i hapësirave publike në qendër të qytetit

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	14.03.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	736,343.82 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	450,867.90 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	24.08.2023
Vlera e kontratës	1,187,211.72 €
Vlera e pagesës nga MAPL	736,343.82 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **MALISHEVA**

Projekti: Rregullimi i oborrit të shkollës fillore në
fshatin Llazic

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe
bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	30,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	19,877.40 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.11.2023
Vlera e kontratës	49,877.40 €
Vlera e pagesës nga MAPL	30,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	89,981.60 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	25.10.2023
Vlera e kontratës	149,981.60 €
Vlera e pagesës nga MAPL	29,998.90 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	50 %

Komuna përfituese: **SUHAREKA**

Projekti: Ripërtrirja e qëndrueshme urbane- në lagjen e vjetër të qytetit- Lagja Sllogja

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	148,750.00 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.12.2023
Vlera e kontratës	198,750.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100%

Komuna përfituese: **PODUJEVA**

Projekti: Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap dhe
Dumnica me mure mbrojtëse (Gabionët) L=860 m

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim
ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	85,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	64,612.20 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	24.11.2023
Vlera e kontratës	149,612.20 €
Vlera e pagesës nga MAPL	49,057.30 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	57.71%

Komuna përfituese: **RAHOVECI**

Projekti: Ndërtimi i parqeve në Opertush, Retijë, Denjë dhe kolektorit për ujërat e zeza në Ratkoc dhe Rahovec

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	84,959.00 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.10.2023
Vlera e kontratës	134,959.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **DEQANI**

Projekti: Asfaltimi dhe sistemimi i rrugës "Arben Qerimaj" në komunitetin ashkali në Baballoq dhe "Veteranët e UQK" në komunitetin boshnjak në Prapaqan

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	29.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	111,010.23 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.08.2023
Vlera e kontratës	171.010.23 €
Vlera e pagesës nga MAPL	60,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **DEQANI**

Projekti: Ndërtimi i 4 urave në rrugën që të qon bë
Roshkodol dhe parkut në Isniq

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe
bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	85,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	87,206.32 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.11.2023
Vlera e kontratës	172,206.32 €
Vlera e pagesës nga MAPL	20,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	23.53 %

Komuna përfituese: **GJILANI**

Projekti: Rigjenerimi i ish parkingut duke integruar
xhepat e gjelbërt- "Parku Urban" në
komunën e Gjilanit

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe
bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	04.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	90,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	53,578.78 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.11.2023
Vlera e kontratës	143,578.78 €
Vlera e pagesës nga MAPL	61,675.08 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	68.53 %

Komuna përfituese: **FUSHËKOSOVË**

Projekti: Rikonstruimi i rrugës " Meshari- faza e dytë" Fushë Kosovë

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	70,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	57,008.92 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	25.10.2023
Vlera e kontratës	127,008.92 €
Vlera e pagesës nga MAPL	70,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **SHTIME**

Projekti: Zgjerimi i rrugës dhe trotuari me ndriçim
në rrugën "Shabani" në Vojnoc

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	95,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	0 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	18.09.2023
Vlera e kontratës	93,614.27 €
Vlera e pagesës nga MAPL	89,783.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	94.51%

Komuna përfituese: **PEJA**

Projekti: Kubëzimi i trotuareve dhe rregullimi i hapësirave në Treboviq, Katundi i ri dhe Pavlan

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	03.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	140,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	216,974.76 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	09.10.2023
Vlera e kontratës	356,974.76 €
Vlera e pagesës nga MAPL	80,985.80 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	57.85%

Komuna përfituese: PEJA

**Projekti: Asfaltimi, ndriçimi dhe ndërtimi i trotuarit
në rrugën "Mustafë Hasanxhekaj-Mic Nimani"
(Vitomiricë-Treboviq) në komunën e Pejës**

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS




MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	29.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	494,378.50 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	26.09.2023
Vlera e kontratës	544,378.50 €
Vlera e pagesës nga MAPL	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: PEJA

Projekti: Turizmi i aventurës - Vlera për zhvillim të qëndrueshëm të Pejës

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal

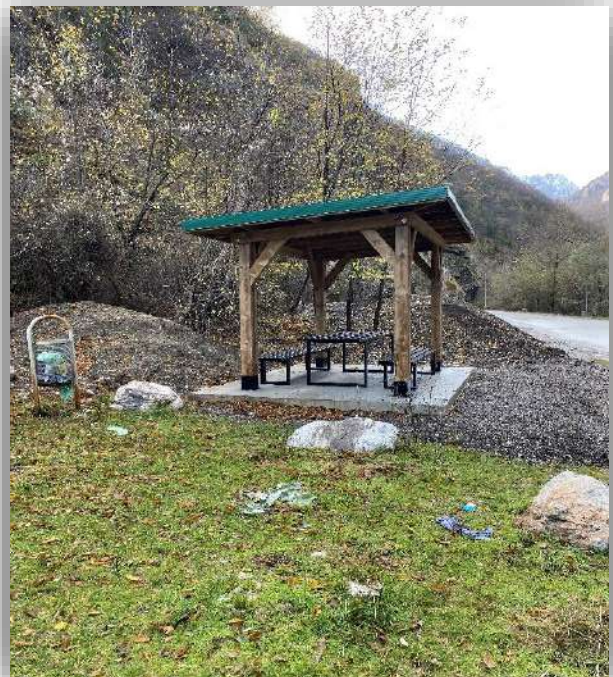

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	05.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	165,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	97,210.00 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	29.09.2023
Vlera e kontratës	262,210.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	165,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Projekti: Ndërtimi i kanalizimit në Muzhevine si dhe Ndërtimi i rrugës "Arif Pepaj" dhe "Sejdi Zenuni" në Lubozhdë, Istog "Bekim Fehmiu" dhe "Smajl Bicaj" Studenicë "Brigada 133" dhe Dobrushë "Shkolla e komunitetit Boshnjak"

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	13.07.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	123,174.50 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	14.11.2023
Vlera e kontratës	173,174.50 €
Vlera e pagesës nga MAPL	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **NOVOBËRDA**

Projekti: Ndërtimi i ndriçimit në fshatrat Makresh-
Draganc si dhe Labjan-Koznic

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	29.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	30,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	4,217.85 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	15.09.2023
Vlera e kontratës	34,217.85 €
Vlera e pagesës nga MAPL	29,999.70 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **FERIZAJ**

Projekti: Asfaltimi i rrugës në lagjet "Sallahane"
dhe "Halit Ibishi"

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	29.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	31,091.00 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	26.10.2023
Vlera e kontratës	91,091.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	44,412.48 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	74.02 %

Komuna përfituese: **MAMUSHA**

Projekti: Pastrimi i shtratit të lumit "Toplluha"

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	30.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	9,820.00 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	17.11.2023
Vlera e kontratës	59,820.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **GRAÇANICA**

Projekti: Rregullimi i parkut për fëmijë fshatin
Shushicë, rruga "Hasan Prishtina"

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	29.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	10,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	2,900.00 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.11.2023
Vlera e kontratës	12,900.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	10,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Komuna përfituese: **GRAÇANICA**

Projekti: Rregullimi i hapësirës publike në Kishnicë
rruga " Ibrahim Rugova" Komuna Graçanicë

Programi mbështetja për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS



MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	29.06.2023
Zotimi i mjeteve nga MAPL	20,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	0 €
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	26.10.2023
Vlera e kontratës	16,398.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL	15,508.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	77.54 %

TABELA E PROJEKTEVE TË FINANCUARA NË KOMUNA NGA MAPL PËR VITIN 2023

Komuna	Nr i pr oj	Emri i projektit	Burimi i financimit	Procedurat e prokurimit	Vlera e kontratës	Financim i/bashkëfinancim nga MAPL sipas MeM	Vlera për Bashkëfinancim nga komuna sipas kontratës	Pagesat nga MAPL
Obiliq	1	Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësorë	Performancë	Komuna	429,347.95	250,000.00	179,347.95	220,044.97
Obiliq	2	Ndërtimi i parkingut në Obiliq në objektet e banesave sociale -Banesa Hade	Performancë	Komuna	67,894.05	60,992.12	6,901.93	60,992.00
Lipjan	3	Ndërtimi i sallës së sporteve në shkollën "Ismajl Luma" Lipjan	Performancë	Komuna	248,226.45	235,374.00	12,852.45	66,951.57
Lipjan	4	Ndërtimi i shtratit të lumit dhe asfaltimi i rrugës së lumit në fshatin Gadime e Ulët	Performancë	Komuna	287,162.50	270,000.00	17,162.50	247,160.76
Lipjan	5	Ndërtimi i shtratit të Lumit në fshatin Smallushë Faza-II	Performancë	Komuna	224,007.04	200,000.00	24,007.04	107,371.08
Lipjan	6	Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Medvec	Infrastruktura socio-ekonomike	Komuna	77,988.88	50,000.00	27,988.88	48,797.88
Vitia	7	Rregullimi i rrugës dhe trotuarit me kalldërm rreth lumi "Moravë" Viti	Performancë	Komuna	277,777.50	120,000.00	157,777.50	72,693.00
Vitia	8	Rivitalizimi i rrugës "Hoxhë Jonuzi" dhe "Muhamet Muharremi"	Performancë	Komuna	384,220.62	160,000.00	224,220.62	159,190.53

Vitia	9	Rivitalizimi i hapësirave gjelbëruese rreth lumit "Morava" në Viti	Performancë	Komuna	186,636.10	76,237.6	110,398.50	58,405.10
Klina	10	Asfaltimi i rrugës "Afrim Haliti", Jashanicë	Performancë	Komuna	135,000.00	49,663.6	85,336.37	49,663.63
Klina	11	Rregullimi i shtratit të lumit "Klina"	Performancë	Komuna	746,046.00	100,000.00	646,046.00	100,000.00
Klina	12	Ndërtimi fundërruesit për sistemin e filtrimit të ujit të pijes në Klinë	Performancë	Komuna	849,921.63	200,000.00	649,921.63	30,000.00
Klina	13	Ndërtimi i trotuarit me ndriçim në fshatin Shtupel dhe ndërtimi i rrugëve në fshatin Budisalc	Infrastruktura për komunitete	Komuna	97,699.99	60,000.00	37,699.99	60,000.00
Drenasi	14	Ndërtimi dhe zgjerimi sheshit "Fehmi dhe Xhevë Lladrovci" Drenas	Performancë	Komuna	4,388,178.58	916,388.80	3,471,789.58	546,552.63
Gjakova	15	Renovimi dhe paisja e Qendrës së Komuniteteve (parashkollor) në Ali Ibra- Gjakovë	Infrastruktura socio-ekonomike	Komuna	46,194.40	40,000.00	6,194.40	39,999.40
Gjakova	16	Ndërtimi i hapësirave publike në qendër të qytetit	Performancë	Komuna	1,187,211.72	736,343.82	450,867.90	736,343.82
Malisheva	17	Rregullimi i oborrit të shkollës fillore në fshatin Llazic	Infrastruktura socio-ekonomike	Komuna	49,877.40	30,000.00	19,877.40	30,000.00

Kamenica	18	Parkingu i gjelbërt në qendër të qytetit të Kamenicës	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	149,981.60	60,000.00	89,981.60	29,998.90
Suhareka	19	Ripërtrirja e qëndrueshme urbane- në lagjen e vjetër të qytetit- Lagja Sllogja	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	198,705.00	50,000.00	148,750.00	50,000.00
Podujeva	20	Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap dhe Dumnica me mure mbrojtëse (Gabionët) L=860 m	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	149,612.20	85,000.00	64,612.20	49,057.30
Rahoveci	21	Ndërtimi i parqeve në Opertush, Retijë, Denjë dhe kolektorit për ujërat e zeza në Ratkoc dhe Rahovec	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	134,959.00	50,000.00	84,959.00	50,000.00
Deçani	22	Asfaltimi dhe sistemimi i rrugës "Arben Qerimaj" në komunitetin ashkali në Baballoq dhe " Veteranët e UQK" në komunitetin boshnjak në Prapaqan	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	171,010.23	60,000.00	111,010.23	60,000.00
Deçani	23	Ndërtimi i 4 urave në rrugën që të qon bë Roshkodol dhe parkut në Isniq	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	172,206.32	85,000.00	87,206.32	20,000.00
Gjilani	24	Rigjenerimi i ish parkingut duke integruar xhepat e gjelbërt- "Parku Urban" në komunën e Gjilanit	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	143,578.78	90,000.00	53,578.78	61,675.08
FushëKosova	25	Rikonstruimi i rrugës " Meshari- faza e dytë" Fushë Kosovë	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	127,008.92	70,000.00	57,008.92	70,000.00

Shtime	26	Zgjerimi i rrugës dhe trotuari me ndriçim në rrugën "Shabani" në Vojnoc	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	93,614.27	95,000.00	-	89,783.00
Peja	27	Kubëzimi i trotuareve dhe rregullimi i hapësirave në Treboviq, Katundi i ri dhe Pavlan	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	356,974.76	140,000.00	216,974.76	80,985.80
Peja	28	Asfaltimi, ndriçimi dhe ndërtimi i trotuarit në rrugën "Mustafë Hasanzheka-Mic Nimani" (Vitomiricë-Treboviq) në komunën e Pejës	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	544,378.50	50,000.00	494,378.50	50,000.00
Peja	29	Turizmi i aventurës - Vlera për zhvillim të qëndrueshëm të Pejës	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	262,210.00	165,000.00	97,210.00	165,000.00
Istogu	30	Ndërtimi i kanalizimit në Muzhevine si dhe Ndërtimi i rrugës "Arif Pepaj" dhe "Sejdi Zenuni" në Lubozhdë, Istog "Bekim Fehmiu" dhe "Smajl Bicaj" Studenicë "Brigada 133" dhe Dobrushë "Shkolla e komunitetit Boshnjak"	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	173,174.50	50,000.00	123,174.50	50,000.00
Novobërda	31	Ndërtimi i ndriçimit në fshatrat Makresh-Draganc si dhe Labjan-Koznic	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	34,217.85	30,000.00	4,217.85	29,999.70
Ferizaj	32	Asfaltimi i rrugës në lagjet "Sallahane" dhe "Halit Ibishi"	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	91,091.00	60,000.00	31,091.00	44,412.48
Mamusha	33	Pastrimi i shtratit të lumit "Toplluha"	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	59,820.00	50,000.00	9,820.00	50,000.00

Graçanica	34	Rregullimi i parkut për fëmijë fshatin Shushicë, rruga "Hasan Prishtina"	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	12,900.00	10,000.00	2,900.00	10,000.00
Graçanica	35	Rregullimi i hapësirës publike në Kishnicë rruga " Ibrahim Rugova" Komuna Graçanicë	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	16,398.00	20,000.00	0	15,508.00
Total i pagesave nga MAPL								3,610,586.63 €

V.REKOMANDIMET

- Komunat të përgatisin projekte detale para se të fillojnë procedurat e prokurimit për projektet e përfituara,
- Komunat të fokusohen në projekte në sektorët si: rregullimi i hapësirave publike, parqe, hapësira të gjelbra, parkingje, përmirësimi i infrastrukturës në hapësirat shkollore, kënde të lodrave për fëmijë; trotuar, kanalizim, ujësjellës, ndriçim dhe fusha të tjera që i përkasin kompetencës së nivelit komunal,
- Komunat gjatë përgatitjes së projekteve detale të krijojnë mundësi të përfshirjes së qytetarëve në identifikim të nevojave për projekte dhe projektet të hartohen bazuar në gjendjen reale në teren,
- Projektet e komunave të jenë në kuadër të dokumenteve strategjike të komunave (KASH, PZHK,SZHEL si dhe kërkesat e drejtpërdrejta nga qytetarët),
- Komunat të adresojnë rekomandimet e ZKA lidhur me implementimin e projekteve,
- MAPL do të filloj procedurat për thirrje në fillim të vitit fiskal në mënyrë që projektet të implementohet me nje plan dinamik më të qendrueshem.

VI.SHTOJCAT

1. Raportit i performancës komunale <https://mapl.rks-gov.net/performanca-komunale/>
2. <https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2023/04/THIRRJE-PER-APLIKIM-PER-KOMUNAT-LIDHUR-ME-FINANCIMIN-E-PROJEKTEVE-KAPITALE-PER-VITIN-2023-PROGRAMI-PER-ZHVILLIM-TE-INFRASTRUKTURES-SOCIO-EKONOMIKE-DHE-BASHKEPUNIM-NDERKOMUNAL.doc>
3. <https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2023/04/THIRRJE-PER-APLIKIM-PER-KOMUNAT-LIDHUR-ME-FINANCIMIN-E-PROJEKTEVE-KAPITALE-PER-VITIN-2023-PROGRAMI-PER-MBESHTETJE-PER-2-.-PROJEKTET-INFRASTRUKTUREORE-PER-KOMUNITETE-NE-KOMUNAT-E-REPUBLIKES-SE-KOSOVES.doc>
