

MAPL

*Ministria e
Administrimit të
Pushtetit Lokal*

Republika
e Kosovës

RAPORT PËRMBLEDHËS
I PROJEKTEVE TË REALIZUARA NGA
MAPL NË
BASHKËPUNIM ME KOMUNA GJATË
VITIT 2025



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik Lokal

Divizioni për Mbikqyrjen dhe Zbatimin e Projekteve në Nivel Lokal

MARS 2026

PËRMBAJTJA

LISTA E SHKURTESAVE.....	5
I. HYRJE.....	6
II. PLANIFIKIMI I PROGRAMEVE BAZUAR NË NDARJET BUXHETORE PËR VITIN 2025.....	6
III. METODOLOGJIA	7
IV. MONITORIMI DHE ZBATIMI I PROJEKTEVE.....	8
RAPORTI PËRMBLEDHËS I PROJEKTEVE TË REALIZUARA NGA	9
PROGRAMET E MAPL-SË NË.....	9
BASHKËPUNIM ME KOMUNAT PËRFITUESE GJATË VITIT 2025.....	9
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	10
<i>KOMUNA PËRFITUESE: KAÇANIK.....</i>	<i>10</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	11
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PRIZREN</i>	<i>11</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	12
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PRIZREN.....</i>	<i>12</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	13
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PRIZREN</i>	<i>13</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	14
<i>KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË</i>	<i>14</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	15
<i>KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË</i>	<i>15</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	16
<i>KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË</i>	<i>16</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	17
<i>KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË</i>	<i>17</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	18
<i>KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË</i>	<i>18</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	19
<i>KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË</i>	<i>19</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	20
<i>KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË</i>	<i>20</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	21
<i>KOMUNA PËRFITUESE: LIPJAN.....</i>	<i>21</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	22
<i>KOMUNA PËRFITUESE: LIPJAN.....</i>	<i>22</i>

PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	23
<i>KOMUNA PËRFITUESE: LIPJAN</i>	<i>23</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	24
<i>KOMUNA PËRFITUESE: KLINË</i>	<i>24</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	25
<i>KOMUNA PËRFITUESE: KLINË</i>	<i>25</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	26
<i>KOMUNA PËRFITUESE: KLINË</i>	<i>26</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	27
<i>KOMUNA PËRFITUESE: KLINË</i>	<i>27</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	28
<i>KOMUNA PËRFITUESE: DRAGASH</i>	<i>28</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	29
<i>KOMUNA PËRFITUESE: DRAGASH</i>	<i>29</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	30
<i>KOMUNA PËRFITUESE: DRAGASH</i>	<i>30</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	31
<i>KOMUNA PËRFITUESE: DRENAS</i>	<i>31</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	32
<i>KOMUNA PËRFITUESE: MITROVICË E JUGUT</i>	<i>32</i>
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	33
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PARTESH</i>	<i>33</i>
PROGRAMI PËR MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	34
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	<i>34</i>
PROGRAMI KOMUNAL PËR ZHVILLIM TË INFRASTRUKTURËS SOCIO-EKONOMIKE DHE BASHKËPUNIM NDËR KOMUNAL	35
TABELA E PROJEKTEVE TË FINANCUARA NË KOMUNA NGA MAPL PËR VITIN 2025	36
V.REKOMANDIMET	39

LISTA E SHKURTESAVE

MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

DPZHEL - Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik Lokal

DMZPNL - Divizioni për Mbikqyrjen dhe Zbatimin e Projekteve në Nivel Lokal

DEMOS - Projekti për Decentralizim dhe përkrahja komunave (DEMOS) është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), bashkëfinancuar nga Suedia dhe Norvegjia, implementuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.

SDC - Zyrën Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim

SIDA - Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim

NORAD - Agjencia Norvegjeze për Bashkëpunim Zhvillimor

BE - Bashkimi Evropian

GPK - Granti i Përformancës Komunale

BNK - Bashkëpunim Ndërkomunal

MeM - Marrëveshjet për mbështetje financiare

ZKA - Zyra Kombëtare e Auditimit

I. HYRJE

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal bazuar në mandatin e saj për avancimin e qeverisjes lokale, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar shërbime efektive në raport me qytetarët, si çdo vit buxhetor edhe në vitin 2025, ka përkrahur Komunitat e Republikës së Kosovës me mjete buxhetore për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në misionin e saj në raport me komunitat ka për qëllim Avancimin e Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

Komunitat e Republikës së Kosovës në vazhdimësi kanë nevojë për investime të reja në infrastrukturën publike andaj ne si MAPL kemi hapur thirrjet për vitin 2025.

Në vitin 2025 janë realizuar 26 projekte në (komuna sipas fushave apo sektorëve të investimit: 3 në ambient, 18 në infrastrukturë, 1 në kanalizim, 1 në arsim, 1 në kulturë, 2 në ndriçim.

II. PLANIFIKIMI I PROGRAMEVE BAZUAR NË NDARJET BUXHETORE PËR VITIN 2025

MAPL për vitin 2025 ka realizuar 26 projekte nga programet si në vijim:

1. Nga programi "Bashkëfinancimi me donatorë për skemën e granteve të bazuar në performancën komunale", janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 4,500,000.00 €, ndërsa është shpenzuar vlera prej 3,448,845.25 € ose 77 %, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
 - Vlerësimi i performancës së vitit 2023 për grantin e performancës komunale për vitin fiskal 2025,
 - Marrëveshjet e mirëkuptimit janë nënshkruar për komunitat përfituese nga Granti i performancës me datën 18.03.2025,
 - Zotimi i mjeteve është bërë me datën 11.06-19.06.2025 për shkak të zbatimit të ligjit me Nr. 08/L-332 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025 konkretisht neni 14 - Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat.

- Marrëveshja e Mirëkuptimit përcakton obligimet e palëve nënshkruese sipas nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi.
2. Nga programi “Programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër-komunal”, janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 50,000.00 €, ndërsa është shpenzuar vlera prej 50,000.00 € ose 100%, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
- Thirrjen për aplikim ka qenë e hapur nga 24 janar 2025 deri më 31 janar 2025,
 - Marrëveshjet e Mirëkuptimit janë nënshkruar më 24.02.2025,
 - Zotimi i mjeteve është bërë më 04.07.2025, për shkak të zbatimit të ligjit me Nr. 08/L-332 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025 konkretisht neni 14 - Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat,
 - Marrëveshja e Mirëkuptimit ka përcaktuar obligimet e palëve nënshkruese sipas Nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi.
3. Nga programi “Mbështetja për projektet infrastrukturore për komunitete në Komunitet e Republikës së Kosovës”, janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 100,000.00 € ndërsa është shpenzuar vlera prej 100,000.00 € ose 100 %, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
- Thirrjen për aplikim ka qenë e hapur nga 24 janar 2025 deri më 31 janar 2025,
 - Marrëveshjet e Mirëkuptimit janë nënshkruar më 24.02.2025.
 - Zotimi i mjeteve është bërë me datën 10.03.2025
 - Marrëveshja e Mirëkuptimit ka përcaktuar obligimet e palëve nënshkruese, sipas nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi.

III. METODOLOGJIA

Hartimi i këtij raporti është bërë bazuar në procesin e implementimit të projekteve gjatë vitit 2025 si: Ndarjet buxhetore për investime kapitale bazuar në ligjin 08/L-332 e buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025; Hartimi i kritereve; Lansimi i fondeve për financim; Pranimi i aplikacioneve nga komunat; Procesi i vlerësimit të aplikacioneve nga komisioni vlerësues; Njoftimi i komunave përfituese; Nënshkrimi i Marrëveshjeve të Mirëkuptimit për financim; Përgatitja e PIP-it, Pranimi i vendimit të qeverisë për rialokim të mjeteve dhe Zotimi i mjeteve; Procedurat e tenderimit nga komuna bazuar në Marrëveshjeve të Mirëkuptimit për

financim; Zbatimi i projekteve nga komunat dhe Monitorimi i zbatimit të projekteve nga MAPL.

Në vitin 2025 nga të tri thirrjet e programve kanë qenë 47 aplikacione me propozim projekte sipas programeve:

- për programin “Bashkëfinancimi me donatorë për skemën e granteve të bazuar në performancën komunale” gjithësej 43 aplikacione, prej tyre 25 janë financuar nga fondet e MAPL dhe 18 nga fondet e donatorëve të cilat implementohen drejtpërdrejt nga komunat pas transferimit të mjeteve nga donatorët;
- për programin “Programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër-komunal” gjithësej 2 aplikacione;
- për programin “Mbështetja për projektet infrastrukturore për komunitete në Komunat e Republikës së Kosovës” gjithësej 2 aplikacione;

Pas aplikimit janë ndarë mjete financiare për 27 projekte dhe janë nënshkruar Marrëveshjet e Mirëkuptimit për financim, prej tyre janë realizuar 26 projekte në 10 komuna, ndërsa 1 projekt ka dështuar si pasojë e procedurave të prokurimit nga ana e komunës.

IV. MONITORIMI DHE ZBATIMI I PROJEKTEVE

Bazuar në planin e punës për vitin 2025 dhe Marrëveshjeve të Mirëkuptimit për bashkëfinancime me komuna, dalin obligimet për realizimin të aktiviteteve të përbashkëta me komuna si:

- Takime teknike me komuna për projektet e kontraktura,
- Vizitat në terren për verifikimin e progresit të punimeve,
- Realizimin i pagesave,
- Bartja e pasurisë në pronësi të komunave, aty ku projekti ka përfunduar.

Të gjitha këto projekte janë monitoruar nga inxhinierët - monitoruesit e Divizionit për Mbikqyrjen dhe Zbatimin e Projekteve në Nivel Lokal në kuadër të DPZHEL- MAPL.

**Raporti përmbledhës i projekteve të realizuara nga
programet e MAPL-së në
bashkëpunim me komunat përfituese gjatë vitit 2025**

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: KAÇANIK

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi dhe rregullimi i hapësirave publike në lokacionet: Kaçanik, Begracë dhe Kovaçec	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		155,883.90 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		85,227.21 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.09.2025
Vlera e kontratës	241,111.11 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	155,883.90 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: PRIZREN

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHMU "Gani Saramati"	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		400,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		375,000.62 €





KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		04.07.2025
Vlera e kontratës		775,000.62 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		383,500.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		95.88 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: PRIZREN

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i tregut të gjelbërt dhe parkingut nëntokësor në Prizren	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		452,332.71 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		815,207.32 €

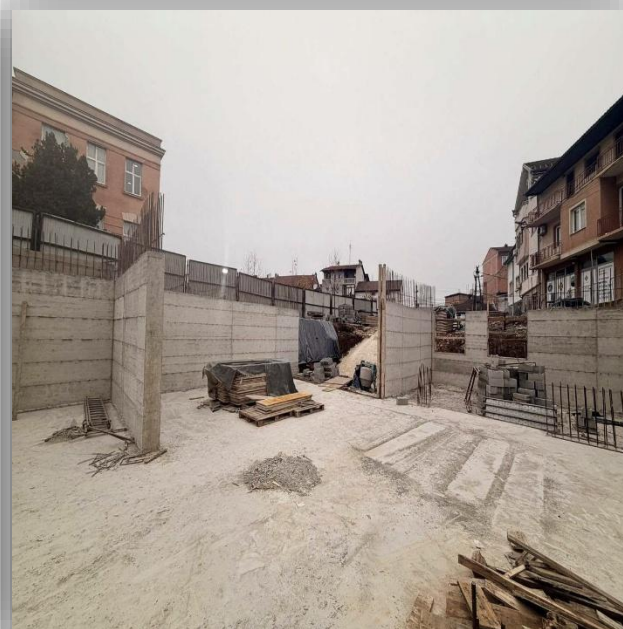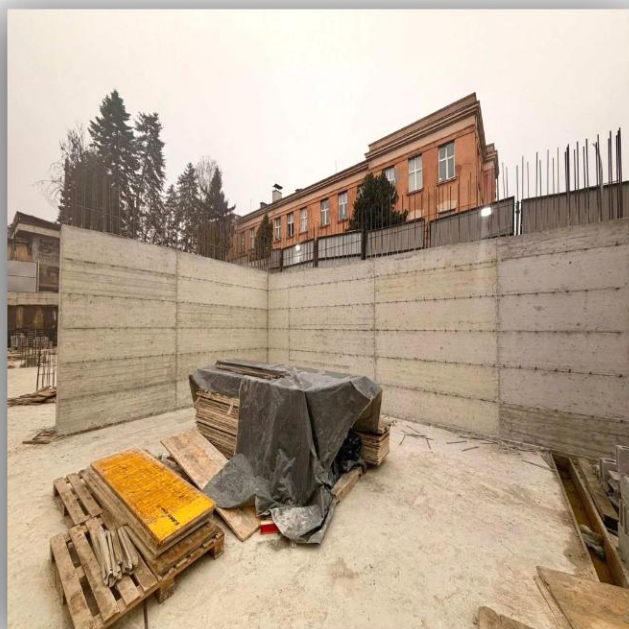


KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		18.08.2025
Vlera e kontratës		1,267,540.03 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		416,043.38 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		91.98 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: PRIZREN

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Vërmicë	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		333,036.63 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		37,102.26 €

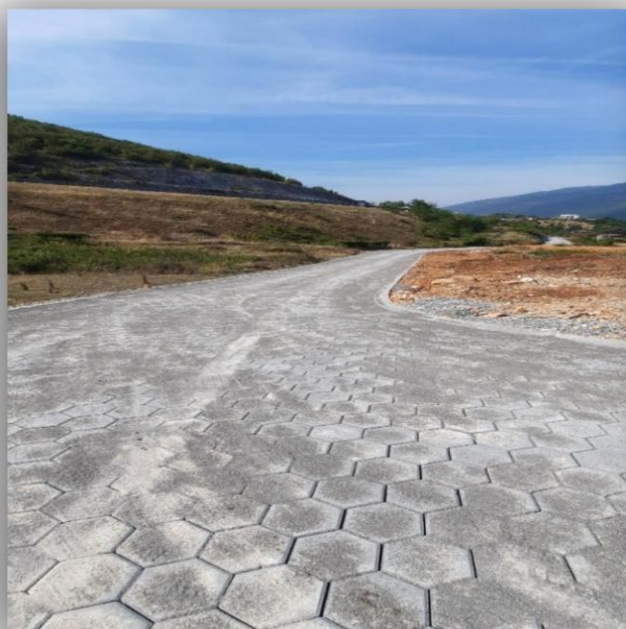

KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		11.06.2025
Vlera e kontratës		370,138.89 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		333,036.63 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: SUHAREKË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i rrugës që lidhë fshatrat Dubravë-Savrovë	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		85,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		19,595.30 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		17.07.2025
Vlera e kontratës		104,595.30 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		85,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SUHAREKË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i rrugës që lidhë fshatrat Shirokë-Sopijë-Topliqan	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		24,443.00 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		30.10.2025
Vlera e kontratës		124,443.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		49,658.40 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		49.66 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: SUHAREKË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i rrugës Shkupi që lidhë fshatrat Tërrnje dhe Njëpërbisht	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		112,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		16,128.00 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		02.07.2025
Vlera e kontratës		128,128.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		112,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: SUHAREKË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i rrugës që lidhë fshatrat Samadraxhë-Dobërdelan	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		40,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		13,755.40 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		07.07.2025
Vlera e kontratës		53,755.40 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		40,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: SUHAREKË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i rrugës Luigj Nikolla-segment në Suharekë	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		17,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		6,764.00 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		07.07.2025
Vlera e kontratës		23,764.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		17,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: SUHAREKË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Asfaltimi i rrugës tek QMF dhe nënstacioni policisë zjarrfikësve në fshatin Studençan	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		27,381.23 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		1,724.27 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.07.2025
Vlera e kontratës	29,105.50 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	27,381.23 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: SUHAREKË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Asfaltimi i rrugëve "Garibaldi, Adem Kuqi, Milit Kryeziu, Fadil Elshani, Vudro Vilson dhe Migjeni" në Suharekë	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		170,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		68,479.00 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		12.08.2025
Vlera e kontratës		238,479.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		170,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: LIPJAN

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i shtëpisë muze të veteraneve të UCK-së Krojmir	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		82,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		39,555.55 €




KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		17.07.2025
Vlera e kontratës		121,555.55 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		51,304.58 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		62.57 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: LIPJAN

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Rikonstruktimi i rrugës Ajet Kozhani Poturofc dhe Ribar i Madh	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		285,999.78 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		0 €

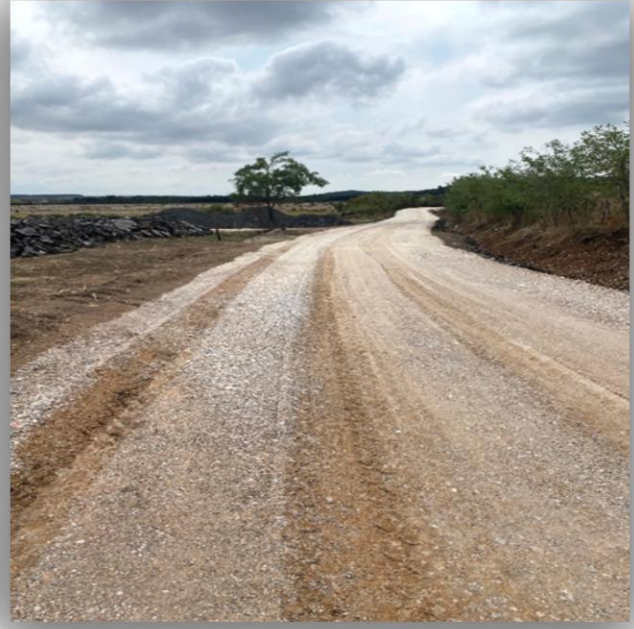

KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		18.07.2025
Vlera e kontratës		266,715.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		257,708.22 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		90.11 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: LIPJAN

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Rikonstruktimi i rrugës Dobratinë-Sllovi	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		235,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		32,381.95 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	09.07.2025
Vlera e kontratës	267,381.95 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	235,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: KLINË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Zgjerimi rrjetit të ndriçimit publik në Dollc-Dresnik, Jashanic, Drenovc, Shtupel, Klinë, Leskoc, Gremnik, Qupevë e Ulët, Siqevë, Resnik, Gj.Madhe, Dush etj.	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		159,832.50 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		22.05.2025
Vlera e kontratës		219,832.50 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		60,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: KLINË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kerrnicë-Binxhë-Grabçë-Faza e dytë	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		49,384.21 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		79,615.79 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	24.06.2025
Vlera e kontratës	129,000.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	49,384.21 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: KLINË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i rrethojave të varrezave në Gj.Madh, Volljak, Sferkë, Jashanicë, Siqevë, Gremnik, Zajm, K.e Vogël, Shtupel etj.	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		152,355.00 €




KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.07.2025
Vlera e kontratës	202,355.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: KLINË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore Gllarevë-Rixhevë-Stapanicë-Zabergjë-Faza e dytë	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		60,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		127,000.00 €

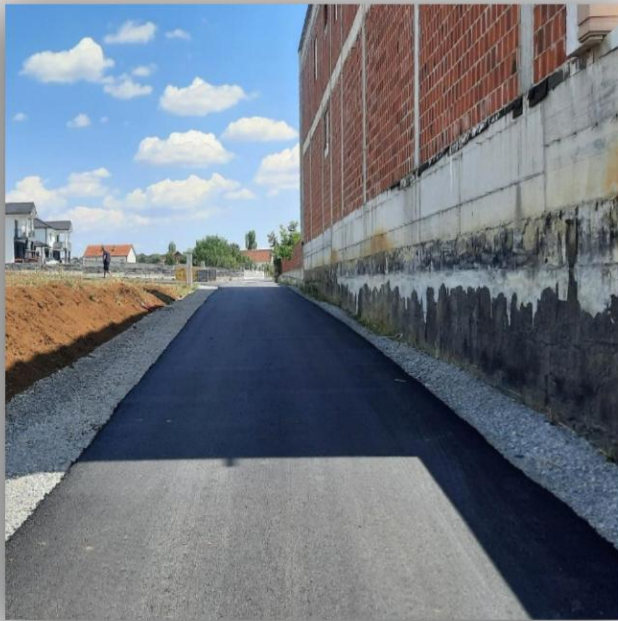

KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		20.06.2025
Vlera e kontratës		187,000.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		60,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: DRAGASH

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i trotuarit Brodosanë-Zaplluzhe dhe Brrut-Bellobrad	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		77,441.41 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		2,858.41 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		03.07.2025
Vlera e kontratës		80,299.82 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		57,268.66 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		73.95 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: DRAGASH

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Kubëzimi i rrugëve në regjionin e Opojës	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		1,994.69 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		03.07.2025
Vlera e kontratës		101,994.69 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		96,292.92 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		96.29 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: DRAGASH

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i trotuarit Dragash-Ura e fshatit Shajne, Ndërtimi i trotuarit Dragash-fshati Kukajan, Ndërtimi i murit mbajtës të varrezat e qytetit, si dhe ndërtimi i ndriçimit në rrugën unazore në Dragash	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		133,384.46 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		1,944.82 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		30.07.2025
Vlera e kontratës		135,329.28 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		74,797.32 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		56.08 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: DRENAS

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Asfaltimi i rrugës Llapushnik-Berishë - Faza e dytë	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		18.03.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		473,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		24,724.00 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		19.08.2025
Vlera e kontratës		497,724.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		447,951.60 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		94.70 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: MITROVICË E JUGUT

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i rrugës Cen Stantërgu	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		07.04.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		500,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		962,921.90 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		09.10.2025
Vlera e kontratës		1,462,921.90 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		218,479.20 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		43.70 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale
Komuna përfituese: PARTESH

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Rrethimi dhe rregullimi i parkut në fshatin Partesh Komuna e Parteshit	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		10.04.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		1,155.67 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		9,479.33 €



KONTRATA


Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		23.10.2025
Vlera e kontratës		10,635.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		1,155.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		99.94 %

Programi për mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: PEJË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Qasja Multifunksionale për Komunitete Aktive në Shtegun e Shëndetit të Komunës së Pejës	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		24.02.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		19,375.00 €

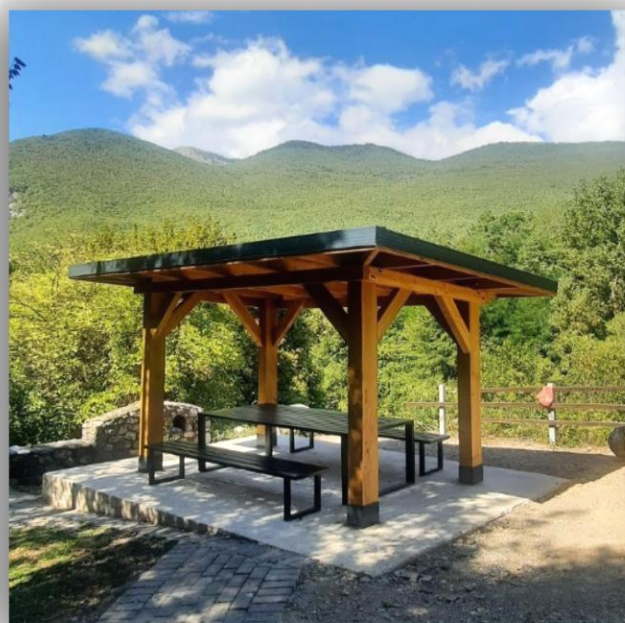

KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		22.05.2025
Vlera e kontratës		119,375.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së		100,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër komunal

Komuna përfituese: PEJË

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Projekti:	Ndërtimi i Ndriçimit Publik në Fshatin Nakell dhe Fshatin Gorazhdec të Komunës së Pejës	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare		24.02.2025
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së		50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna		44,835.00 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit		Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës		17.07.2025
Vlera e kontratës		94,835.00€
Vlera e pagesës nga MAPL-së		50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së		100 %

TABELA E PROJEKTEVE TË FINANCUARA NË KOMUNA NGA MAPL PËR VITIN 2025

Komuna	N r i p r o j	Emri i projektit	Burimi i financimit	Procedurat e prokurimit	Vlera e kontratës	Financimi/ bashkëfinancim nga MAPL sipas MeM	Vlera për Bashkëfinancim nga komuna sipas kontratës	Pagesat nga MAPL
KAÇANIK	1	Ndërtimi dhe rregullimi i hapësirave publike në lokacionet: Kaçanik, Begracë dhe Kovaçec	Performancë	Komuna	241,111.11 €	155,883.90 €	85,227.21 €	155,883.90 €
PRIZREN	2	Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHMU "Gani Saramati"	Performancë	Komuna	775,000.62 €	400,000.00 €	375,000.62 €	383,500.00 €
PRIZREN	3	Ndërtimi i tregut të gjelbërt dhe parkingut nëntokësor në Prizren	Performancë	Komuna	1,267,540.03 €	452,332.71 €	815,207.32 €	416,043.38 €
PRIZREN	4	Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Vermicë	Performancë	Komuna	370,138.89 €	333,036.63 €	37,102.26 €	333,036.63 €
SUHAREKË	5	Ndërtimi i rrugës që lidhë fshatrat Dubravë-Savrovë	Performancë	Komuna	104,595.30 €	85,000.00 €	19,595.30 €	85,000.00 €
SUHAREKË	6	Ndërtimi i rrugës që lidhë fshatrat Shirokë-Sopijë-Topliqan	Performancë	Komuna	124,443.00 €	100,000.00 €	24,443.00 €	49,658.40 €
SUHAREKË	7	Ndërtimi i rrugës Shkupi që lidhë fshatrat Tërnje dhe Njëpërbisht	Performancë	Komuna	128,128.00 €	112,000.00 €	16,128.00 €	112,000.00 €
SUHAREKË	8	Ndërtimi i rrugës që lidhë fshatrat Samadraxhë-Dobërdelan	Performancë	Komuna	53,755.40 €	40,000.00 €	13,755.40 €	40,000.00 €

SUHAREKË	9	Ndërtimi i rrugës Luigj Nikolla-segment në Suharekë	Performancë	Komuna	23,764.00 €	17,000.00 €	6,764.00 €	17,000.00 €
SUHAREKË	10	Asfaltimi i rrugës tek QMF dhe nënstationi policisë zjarrfiksëve në fshatin Studençan	Performancë	Komuna	29,105.50 €	27,381.23 €	1,724.27 €	27,381.23 €
SUHAREKË	11	Asfaltimi i rrugëve "Garibaldi, Adem Kuqi, Milit Kryeziu, Fadil Elshani, Vudro Vilson dhe Migjeni" në Suharekë	Performancë	Komuna	238,479.00 €	170,000.00 €	68,479.00 €	170,000.00 €
LIPJAN	12	Ndërtimi i shtëpisë muze të veteraneve të UCK-së Krojmir	Performancë	Komuna	121,555.55 €	82000.00 €	39,555.55 €	51,304.58 €
LIPJAN	13	Rikonstruktimi i rrugës Ajet Kozhani Poturofc dhe Ribar i Madh	Performancë	Komuna	266,715.00 €	285,999.78 €	-	257,708.22 €
LIPJAN	14	Rikonstruktimi i rrugës Dobratinë-Sllovi	Performancë	Komuna	267,381.95 €	235,000.00 €	32,381.95 €	235,000.00 €
KLINË	15	Zgjerimi rrjetit të ndriqimit publik në Dollc-Dresnik, Jashanic, Drenovc, Shtupel, Klinë, Leskoc, Gremnik, Qupevë e Ulët, Siqevë, Resnik, Gj.Madhe, Dush etj.	Performancë	Komuna	219,832.50 €	60,000.00 €	159,832.50 €	60,000.00 €
KLINË	16	Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kerrnicë-Binxhë-Grabçë-Faza e dytë	Performancë	Komuna	129,000.00 €	49,384.21 €	79,615.79 €	49,384.21 €

KLINË	17	Ndërtimi i rrethojave të varrezave në Gj.Madh, Volljak, Sferkë, Jashanicë, Siqevë, Gremnik, Zajm, K.e Vogël, Shtupel etj.	Performancë	Komuna	202,355.00 €	50,000.00 €	152,355.00 €	50,000.00 €
KLINË	18	Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore Gllarevë-Rixhevë-Stapanicë-Zabergjë-Faza e dytë	Performancë	Komuna	187,000.00 €	60,000.00 €	127,000.00 €	60,000.00 €
DRAGASH	19	Ndërtimi i trotuarit Brodosanë-Zaplluzhe dhe Brrut-Bellobrad	Performancë	Komuna	80,299.82 €	77,441.41 €	2,858.41 €	57,268.66 €
DRAGASH	20	Kubezimi i rrugëve në regjionin e Opojës	Performancë	Komuna	101,994.69 €	100,000.00 €	1,994.69 €	96,292.92 €
DRAGASH	21	Ndërtimi i trotuarit Dragash-Ura e fshatit Shajne, Ndërtimi i trotuarit Dragash-fshati Kukajan, Ndërtimi i murit mbajtës të varrezat e qytetit, si dhe ndërtimi i ndriqimit në rrugën unazore në Dragash	Performancë	Komuna	135,329.28 €	133,384.46 €	1,944.82 €	74,797.32 €
DRENAS	22	Asfaltimi i rrugës Llapushnik-Berishë - Faza e dytë	Performancë	Komuna	497,724.00 €	473,000.00 €	24,724.00 €	447,951.60 €
MITROVICË E JUGUT	23	Ndërtimi i rrugës Cen Stantërgu	Performancë	Komuna	1,462,921.90 €	500,000.00 €	962,921.90 €	218,479.20 €
PARTESH	24	Rrethimi dhe rregullimi i parkut në fshatin Partesh Komuna e Parteshit	Performancë	Komuna	10,635.00 €	1,155.67 €	9,479.33 €	1,155.00 €

PEJË	25	Qasja Multifunktionale për Komunitete Aktive në Shtegun e Shëndetit të Komunës së Pejës	Infrastruktura për komunitete	Komuna	119,375.00 €	100,000.00 €	19,375.00 €	100,000.00 €
PEJË	26	Ndërtimi i Ndriçimit Publik në Fshatin Nakell dhe Fshatin Gorazhdec të Komunës së Pejës	Infrastruktura socio-ekonomike	Komuna	94,835.00 €	50,000.00 €	44,835.00 €	50,000.00 €
TOTAL I PAGESAVE NGA FINANCIMI I MAPL-së								3,598,845.25 €

V.REKOMANDIMET

- Komunitet të përgatisin projekte detale para se të fillojnë procedurat e prokurimit për projektet e përfituara,
- Komunitet të fokusohen në projekte në sektorët si: rregullimi i hapësirave publike, parqe, hapësira të gjelbra, parkingje, përmirësimi i infrastrukturës në hapësirat shkollore, kënde të lodrave për fëmijë; trotuar, kanalizim, ujësjellës, ndriçim dhe fusha të tjera që i përkasin kompetencës së nivelit komunal,
- Komunitet gjatë përgatitjes së projekteve detale të krijojnë mundësi të përfshirjes së qytetarëve në identifikim të nevojave për projekte dhe projektet të hartohen bazuar në gjendjen reale në teren,
- Projektet e komunave të jenë në kuadër të dokumenteve strategjike të komunave (KASH, PZHK, SZHEL si dhe kërkesat e drejtpërdrejta nga qytetarët),
- Komunitet të adresojnë rekomandimet e ZKA lidhur me implementimin e projekteve,
- MAPL do të fillojë procedurat për thirrje në fillim të vitit fiskal në mënyrë që projektet të implementohet me një plan dinamik më të qëndrueshëm.
